




ŘEZ – FÁZE 1

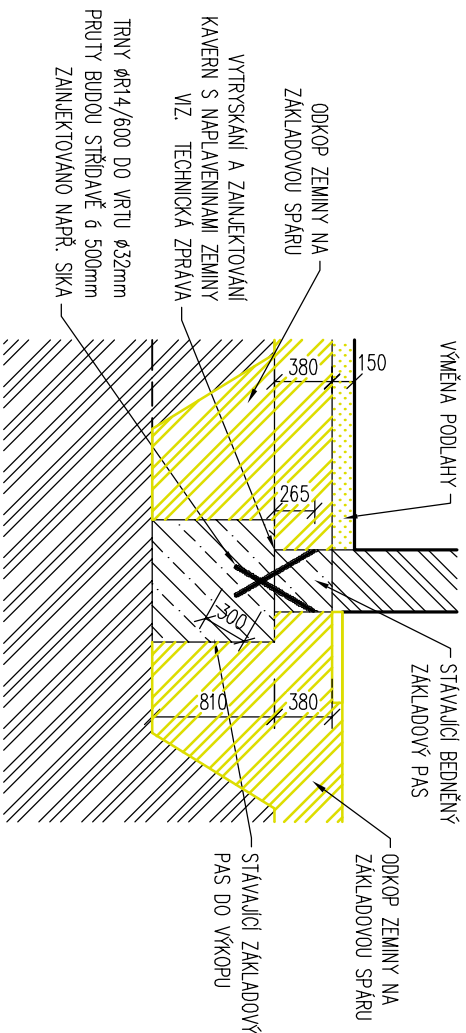

ŘEZ – FÁZE 3

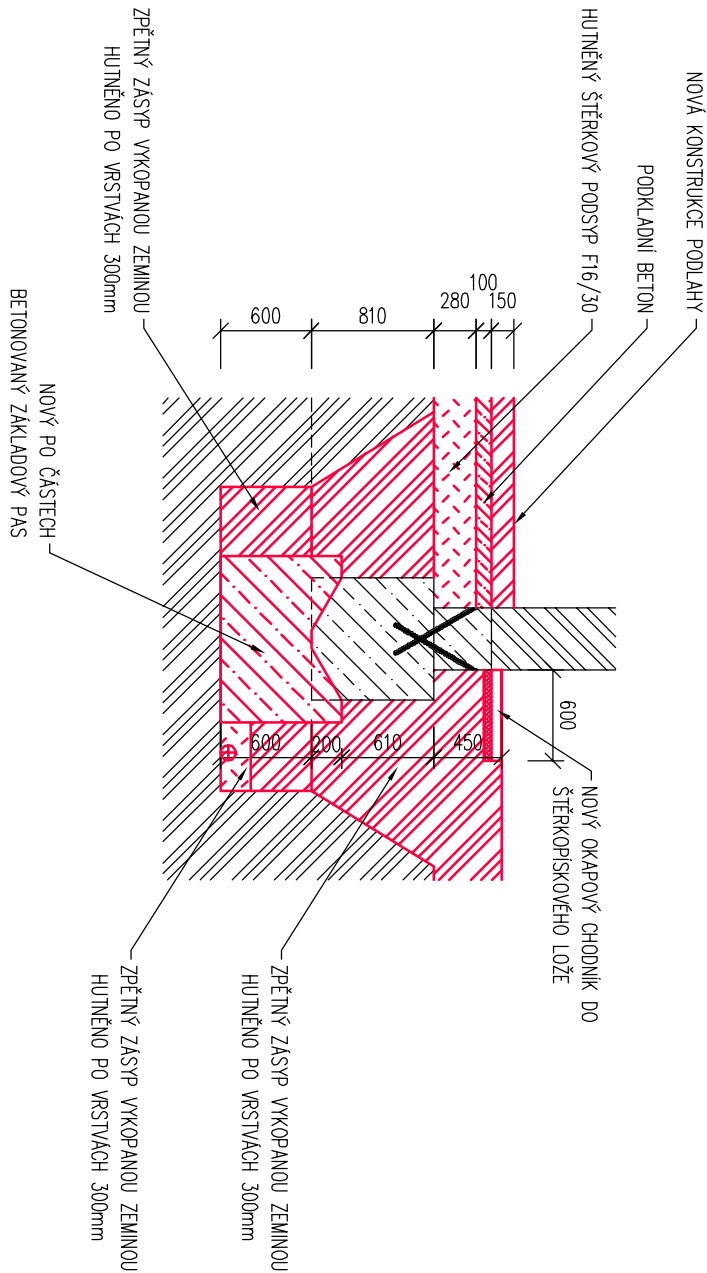

ŘEZ – FÁZE 2

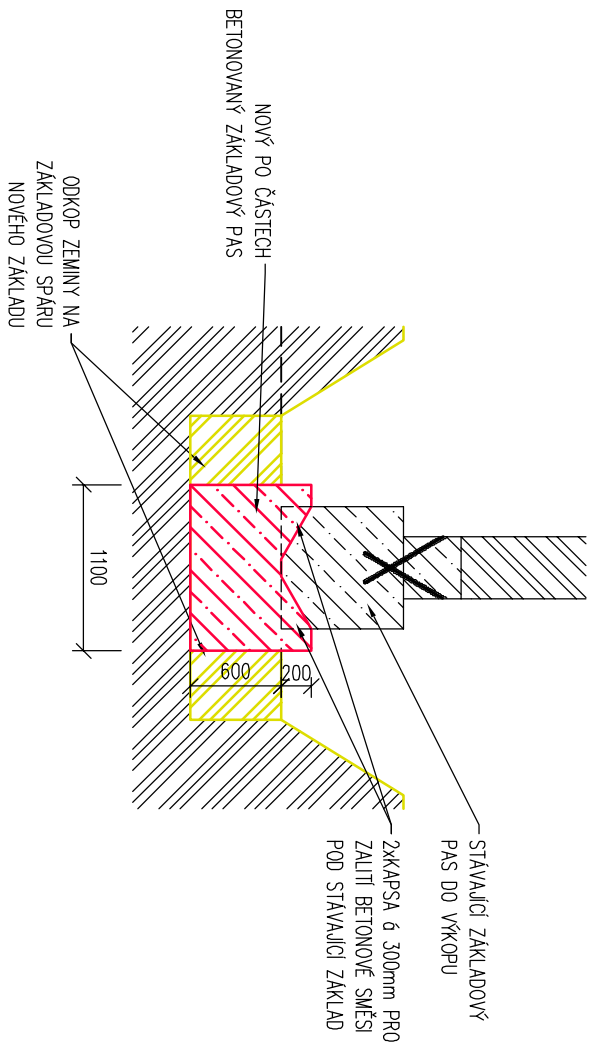

POSTUP PRACÍ:

- V PRVNÍ FÁZI SANACE ZÁKLADŮ BUDE PROVEDEN ODKOP ZEMINY A ZÁSPRNÝCH VRSTEV NA STÁVAJÍCÍ ZÁKLADOVOU SPÁRU.
- NÁSLEDNĚ BUDOU VYČIŠTĚNY A ZAINJEKTOVANY KAVERNY SE ZEMINOU. POTÉ BUDOU PROVEDENY VRTY DO ZÁKLADŮ, OSAZENÍ TRNŮ A INJEKTÁŽ.
- DRUHÁ FÁZE SANACE BUDE PROBÍHAT VE ČTYŘECH ETAPÁCH URČENÝCH V PŮDORYSU ZÁKLADŮ. JEDNOTLIVÉ ETAPY BUDOU MÍT ŠÍŘKU ZABĚRU CCA 1m. BUDE PROVEDEN VÝKOP DO HLUBKY PLÁNOVANÉ ZÁKLADOVÉ SPÁRY. NÁSLEDNĚ BUDE SUCHOU CESTOU (NAPŘ. KARTÁČEM) OČIŠTĚN SPODNÍ LÍČ STÁVAJÍCÍCH ZÁKLADOVÝCH PASECH BUDOU Z KAŽDÉ STRANY VYSEKANY Dvě KAPSY PŘI SPODNÍ HRANĚ, KTERÉ UMOŽNÍ ZATEČENÍ BETONOVÉ SMĚSI POD ZÁKLAD. TÍMTO SE OMEZÍ RIZIKO VZNIKU KAVERN. NOVÝ ZÁKLADOVÝ PAS BUDE VYBETONOVAN AŽ DO HORNÍ ÚROVNĚ KAPES. DRUHÁ(SOUSEDNÍ) ETAPA BUDE MOCI BÝT ZAPOČATA AŽ PO 3 DENNÍ PŘESTÁVCE OD PŘÍLEHLÉ BETONAŽE.
- VE TŘETÍ FÁZI BUDOU PROVEDENY ZPĚTNĚ HUTNĚNÉ ZÁSPRY, DRENÁŽ, HRUBÁ PODLAHA, NAVÁZÁNÍ HYDROIZOLACE, OKAPOVÝ CHODNÍK VNĚ OBJEKTU A ČISTÉ PODLAHY UVNITŘ OBJEKTU.

BETON C25/30 – XC2

STABIL s. r. o., 603 00 BRNO, HLINKY 142 c				PARÉ:
INVESTOR: ZUŠ Pozořice, U Školy 386, 664 07	ÚŘAD: Mokrý-Horčíkov	ZAK. ČÍSLO:	13177	
VYPRACOVAL: Václav Rotrekl	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Petr Daniel	ÚČEL:	DPS	
ZUŠ Mokrý, č.p. 86, Statické zajištění objektu		DATUM:	11/2013	
D.2 – Stavebně konstrukční řešení		FORMÁT:	2x44	
ŘEZY, TECHNOLOGICKÝ POSTUP		MĚŘÍTKO:	1:50	VÝKRES Č. 2.
