



## LEGENDA KONSTRUKCÍ

OZNAČENÍ	NÁZEV
	KONSTRUKCE A PRVKY PŮVODNÍ - NEMĚNNÉ
	V PŘÍPADĚ POTŘEBY DOČASNĚ DEMONTOVANÉ NEBO SANOVANÉ
	KONSTRUKCE A PRVKY PŮVODNÍ BOURANÉ

## POZNÁMKA

- PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ BUDE NUTNÉ ODPOJIT OBJEKT OD INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ. JELIKOŽ JE OBJEKT NAPOJEN POUZE NA EL. ENERGII BUDE PROVEDENO ODPOJENÍ EL. NADZEMNÍHO VEDENÍ.
- BOURACÍ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY RUČNĚ A TO POSTUPNÝM MECHANICKÝCH ROZEBÍRÁNÍM NOSNÝCH VODOROVNÝCH A SVISLÝCH KONTRUKCÍ OD STŘECHY OBJEKTU SMĚREM K ZÁKLADOVÝM KONSTRUKCÍM.
- V 1. FÁZI BUDE OBJEKT KOMPLETNĚ VYKLIZEN
- VE 2. FÁZI SE DEMONTUJÍ VEŠKERÉ VÝPLNĚ OTVORŮ, T.J. OKNA, DVEŘE, VRATA VČ. JEJICH RAMŮ. DEMONTUJÍ SE VEŠKERÉ DOCHOVANÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY, VIDITELNÉ ROZVODY, SVÍTIDLA. DÁLE BUDOU DEMONTOVÁNY VEŠKERÉ KLEMPÍRSKÉ PRVKY NA STŘEŠE A FASÁDĚ, POSTUPNĚ BUDE DEMONTOVÁNA STŘEŠNÍ KRYTINA.
- VE 3. FÁZI BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH NOSNÝCH PRVKŮ KROVU, DÁLE DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉ STROPNÍ KONSTRUKCE VČ. ZÁKLOPU A PODBITÍ. POSTUPNĚ SE ZBOURÁ ŠTÍTOVÉ ZDIVO A NADEZDÍVKA DO VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ DLE PD. NÁSLEDNĚ BUDE ZBOURÁNO VEŠKERÉ VNITRNÍ ZDIVO DLE PD. BUDE ODSTRANĚNO VNITRNÍ ZDĚNÉ SCHODIŠTĚ DO 1S. VYBOURÁ SE BETONOVÁ PODLAHA VČETNĚ ODTĚŽENÍ STÁVAJÍCÍ PODLOŽÍ DO ÚROVNĚ DLE PD. VEŠKERÉ VNITRNÍ A VNĚJŠÍ OMÍTKY BUDOU ODSTRANĚNY.

## SCHÉMA 1: 500

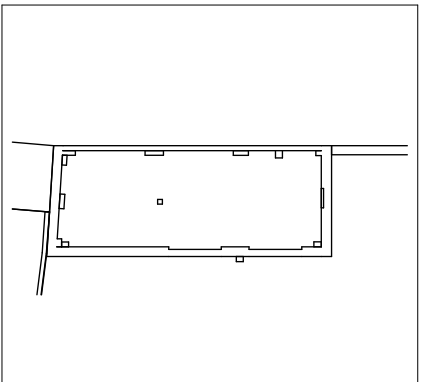

±0,000 = cca +283,60

HLAVNÍ PROJEKTANT Ing. JIŘÍ ŠTĚPÁN	MÍSTO STAVBY K.Ú. BLANSKO - P.Č. ST. 35/6, 31/1 BLANSKO, ZÁMEK 1, OKRES BLANSKO	ING. JIŘÍ ŠTĚPÁN PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST KONTAKT m: +420 602 376 048, e: jst@stmb@gmail.com		
VYPRACOVAL Ing. JIŘÍ ŠTĚPÁN	STAVEBNÍK/INVESTOR MĚSTO BLANSKO A MUZEUM BLANENSKA	DATUM 14.04.2025	STUPEŇ DPS	FORMÁT 5x A4
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. JIŘÍ ŠTĚPÁN-ČKAIT 1007064	ZÁSTUPCE INVESTORA Ing. JIŘÍ CRHA - STAROSTA	ZAKÁZKOVÉ Č. 2503	DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ARCHICAD 28	
NÁZEV DÍLA SO 02 - DEPOZITÁŘ MĚŘICÍ TECHNIKY	PÁŘE		MĚŘITKO 1:50	ČÍSLO VÝKRESU D.1.1.3.2.2
NÁZEV VÝKRESU D.1.1.3.2. VÝKRESOVÁ ČÁST (BOURANÉ K-CE) PŮDORYS 1NP (BOURANÉ K-CE)				
