

**„Dodatek č. 1“**  
**ke Smlouvě o dílo - Dodávka expozice vč. instalace Moravian Science**  
**Centre Brno“**  
(ag. č. 024081/14/ARR)

uzavřené dne 29.4.2014 mezi uvedenými smluvními stranami podle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

**Jihomoravský kraj**

IČO: 70888337  
Se sídlem: Brno, Žerotínovo nám. 3/5, PSČ 601 82  
Jednající: Mgr. Václavem Božkem, CSc., náměstkem hejtmana jihomoravského kraje, na základě svěření Zastupitelstvem Jihomoravského kraje ze dne 21.6.2012, usnesením č. 1962/12/Z30  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno-město  
Číslo účtu: 27-7503190207/0100

(dále jen „Objednatel“ nebo „Zadavatel“)

a

**Sun Drive, s.r.o.**

IČO: 26273896 ✓  
Se sídlem: Chudčice 28, 664 71 ✓  
Zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 41326  
Jednající: Ing. Petrem Petkovským, jednatelem ✓  
Bankovní spojení: Československá obchodní banka  
Číslo účtu: 175075960/0300 ✓

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „Uchazeč“)

**I. Účel dodatku**

Účelem Dodatku č. 1 je sjednání rozsahu nových prací nezbytných k realizaci expozice projektu Moravian Science Centre Brno, jejichž potřeba vyvstala v souvislosti s napojením expozice projektu Moravian Science Centre Brno na stavbu Moravian Science Centre Brno, přičemž tyto nemohou být technicky odděleny od dodávky expozice projektu Moravian Science Centre.

Rozsah nových prací je dán obsahem změnových listů, které jsou nedílnou součástí Dodatku č. 1.

**II. Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 29. 4. 2014:

II.1 Článek I. **Předmět smlouvy** se doplňuje o nový odst. 1.5, který zní:

„1.5 Předmětem této smlouvy jsou dále tyto dodávky:

- dodání silnoproudé rozvody,
- dodání rozvaděče k exponátům,

- dodání zdvih pro imobilní občany,
- doplnění přípojných míst pro rack,
- dodání napájení pro exponáty,
- doplnění a změny v části NN a SLB v souvislosti se změnami instalací určených pro expozice.“

II.2 Článek III. **Cena díla** odst. 3.1, který zní:

„3.1 Cena Díla dle této Smlouvy je smluvními stranami stanovena dohodou jako maximální a nepřekročitelná ve výši

**107 075 000,- Kč**

**(slovy: sto sedm milionů sedmdesát pět tisíc korun českých)**

bez daně z přidané hodnoty s tím, že zákonná daň z přidané hodnoty bude účtována k ceně za dílo podle právních předpisů platných k okamžiku poskytnutí zdanitelného plnění.“

se nahrazuje textem

„3.1 Cena Díla dle této Smlouvy je smluvními stranami stanovena dohodou jako maximální a nepřekročitelná ve výši

**109 073 490,- Kč**

**(slovy: sto devět milionů sedmdesáttři tisíc čtyřistadevadesát korun českých)**

bez daně z přidané hodnoty s tím, že zákonná daň z přidané hodnoty bude účtována k ceně za dílo podle právních předpisů platných k okamžiku poskytnutí zdanitelného plnění.“

### **III. Závěrečná ujednání**

III.1 Ostatní ustanovení smlouva o dílo Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.

III.2 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

III.3 Nedílnou součástí Dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:

*Příloha č. 1 – Změnový list č. 1*

*Příloha č. 2 – Změnový list č. 2*

*Příloha č. 3 – Změnový list č. 3*

*Příloha č. 4 – Změnový list č. 4*

*Příloha č. 5 – Změnový list č. 5*

*Příloha č. 6 – Změnový list č. 6*

*Příloha č. 7 – Změnový list č. 7*

*Příloha č. 8 – Změnový list č. 8*

*Příloha č. 9 – Změnový list č. 9*

*Příloha č. 10 – Změnový list č. 10*

*Příloha č. 11 – Změnový list č. 11*

III.4 Dodatek č. 1 nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

III.5 Smluvní strany se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a souhlasí s ním.

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Dodatek č. 1 byl schválen Radou Jihomoravského kraje dne 11.11.2014 na 78 schůzi usnesením č. 0207/14/R 78.

V Brně dne 18.11.2014

V Brně dne 11.11.2014




Jihomoravský kraj  
Mgr. Václav Božek, CSc.  
náměstek hejtmána

**Jihomoravský kraj**  
Žerotínovo nám. 3/5  
601 82 Brno  
-23-



Sun Drive s.r.o.  
Ing. Petr Petkovský  
jednatel

	Sun Drive s.r.o. Chudčice 28, CZ - 664 71 IČO 26273896 DIČ CZ26273896 ev.č. 4
---	---

### MSCB ZMĚNOVÉ LISTY

### Změnová koordinační dokumentace slaboproudých a silnoproudých rozvodů - projekt Moravian Science Centre Brno

Název změny	číslo změny	Předáno dne	Náklady v Kč bez DPH
1 Změna tras v mezipodlaže expozice, navýšení počtu zásuvek 230V IP65 a kabelů 400V	Kell 01		264 476 Kč
2 Změna tras v mezipodlaže expozice, navýšené délky tras SK	Kell 02		208 675 Kč
3 Rozváděč RE00.04 - změna jističů pro zásuvky 400V a doplnění proudových chráničů	Kell 03		21 495 Kč
4 Doplnění přípojných míst pro rack	Kell 04		12 680 Kč
5 Rozváděč RE04.01 - změna jističů pro zásuvky instalované na konzole stropního nosníku a doplnění kabelu 400V	Kell 05		12 077 Kč
6 Doplnění a změny v části NN v souvislosti se změnami instalací určených pro expozice	Kell 06		712 787 Kč
7 DT u zdvihu pro imobilní z prostoru expozice a z Divadla vědy	Kell 07		27 153 Kč
8 Napájecí vedení pro MRAK	Kell 08		22 149 Kč
9 Doplnění zásuvky do podhledu recepcce	Kell 09		3 506 Kč
10 Doplnění zásuvky pro exponát dětská sušička	Kell 10		6 626 Kč
11 Doplnění a změny v části SLB v souvislosti se změnami instalací určených pro expozice a doplnění RMS v hlavní serverovně	Kell 11		706 866 Kč
<b>SOUČET CELKOVÝCH NÁKLADŮ BEZ DPH</b>			<b>1 998 490 Kč</b>



www.kell.cz  
info@kell.cz

# MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO

Projekt registrační číslo: CZ.1.05/3.2.00/09.0163

## Technický list změny č. Kell 01



# Technický list změny (TLZ) č.:

Kel/01

Datum předložení TLZ:

30.7.2014

SoD č.:

Ze dne:

24.7.2014

Projekt registrační číslo:

CZ.1.05/3.2.00/09/0163

Stavba:

MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO

Objekt:

Technický projekt pro provedení expozice - elektroinstalace

Název změny:

Změna tras v mezipodlaží expozice, navýšení počtu zásuvek 230V IP65 a kabelů

## Důvod změny (vyjádření projektanta realizační dokumentace):

V rámci koordinace profesí při kladení zdvojené podlahy byly položeny žlaby pro vedení kabeláží novým způsobem na základě technického návrhu rozmístění exponátů na ploše. Z technického řešení vyplynula nutnost doplnění 76 ks zásuvek 230V IP 65 a dále kabeláž pro obvody 400V a schází kabely pro obvody 230V.

## Popis změny:

Žlaby na podlaží pavilonu byly položeny způsobem zakresleným v příloze. Navíc bude v prostoru pavilonu instalováno 76 ks zásuvek 230V IP 65, dále 340m kabelu CXKH J 5x6 mm<sup>2</sup> (pro zásuvkové obvody 400V 32A) a 18 m kabelu CXKH J 5x10 mm<sup>2</sup> (pro zásuvkový obvod 400V 63A). Dále ve výkazu výměr schází 1430 m kabelu CHXH J 3x2,5

## Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

## Změna má vliv do následujících profesí:

Elektro

## Přílohy:

VERZE 1.0

Položkový rozpočet, dodatek k projektové dokumentaci.

Změna má vliv na dokumentaci pro provádění stavy : ANO



Změna řešena : ANO/NE	Dodatek č.	01
	Stavební objekt	EXPOZICE m.č. 1.21
	Část PD :	1NP
	Název :	Půdorys 1NP
	Výkres (číslo) :	E.1.02 k1

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu

Cenový dopad:	Odpočet:	
	Přípočet:	264 476 Kč
	Celkem: Bez DPH	264 476,00 Kč
	Celkem: vč. DPH 21%	320 015,96 Kč

Detailní výkaz výměr je součástí položkového rozpočtu

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele (IR):	Ing. Miloš Pydych			
Za zhotovitele:	SunDrive - Petr Petkovský			

VERZE 1.0



KELL s.r.o.  
Mlýnská 326/13, 602 00 Brno  
info@kell.cz

AKCE:  
**MSC B rno**

**Změna tras v mezipodlaze expozice, navýšení počtu zásuvek 230V IP65 a kabelů**

ZÁKAZNÍK:  
**Jihomoravský kraj**

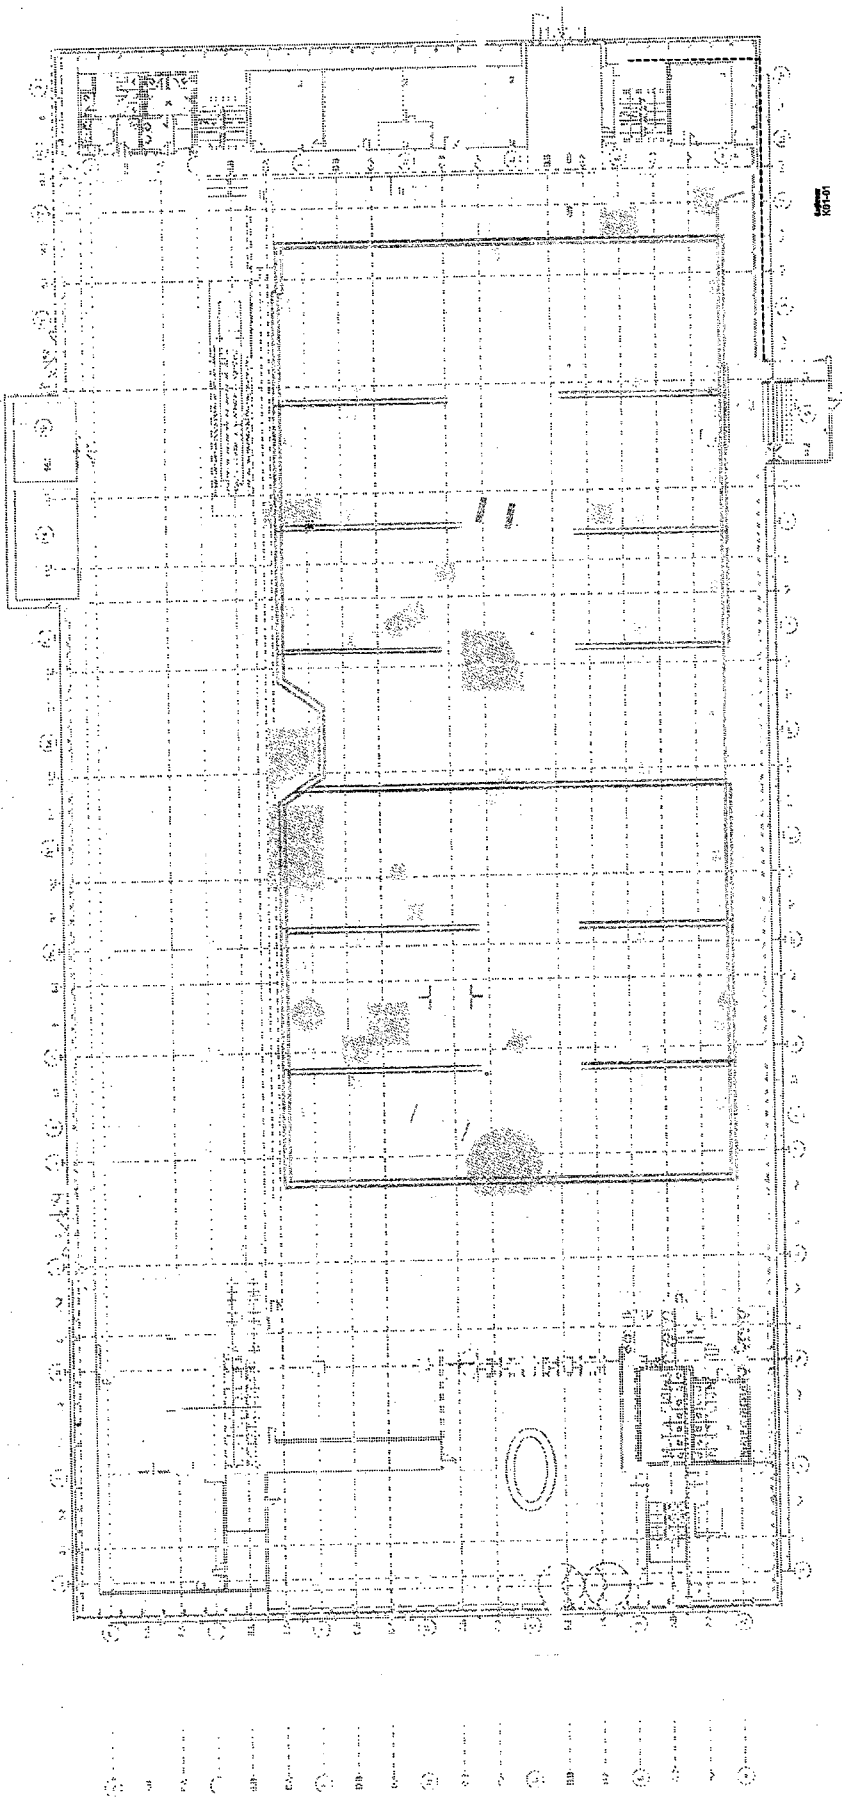
Dodávky		množství	cena	
			za položku	celkem
Zásuvka 230V, IP 65,	m	76	492 Kč	37 378 Kč
Kabel CXKH J 3x2,5 mm <sup>2</sup>	m	1430	42 Kč	60 460 Kč
Kabel CXKH J 5x6 mm <sup>2</sup>	m	340	107 Kč	36 244 Kč
Kabel CXKH J 5x10 mm <sup>2</sup>	m	18	171 Kč	3 070 Kč
Cena celkem				137 152 Kč

Montážní práce		množství	cena	
			za položku	celkem
Zásuvka 230V, IP 65,	m	76	104 Kč	7 892 Kč
Kabel CXKH J 3x2,5 mm <sup>2</sup>	m	1430	12 Kč	16 874 Kč
Kabel CXKH J 5x6 mm <sup>2</sup>	m	340	24 Kč	8 177 Kč
Kabel CXKH J 5x10 mm <sup>2</sup>	m	18	26 Kč	468 Kč
Cena celkem				33 411 Kč

Ostatní náklady		množství	cena	
			za položku	celkem
Pomocný mat.		5%	137 152 Kč	6 858 Kč
Vnitrostaveništní doprava		3%	33 411 Kč	1 002 Kč
PPV		6%	170 563 Kč	10 234 Kč
Úprava stávajících tras	kpl	1	60 000 Kč	60 000 Kč
Ukončení vodičů	kpl	1	820 Kč	820 Kč
Revizní práce	kpl	1	15 000 Kč	15 000 Kč
Ostatní náklady				93 914 Kč

Cena celkem bez DPH			244 476 Kč
---------------------	--	--	------------





# MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO

Projekt registrační číslo: CZ.1.05/3.2.00/09.0163

## Technický list změny č. Kell 02



















































































































