

OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,  
vzduch a přírodu



## DODATEK Č. 1. KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník dne 25.10.2011 mezi těmito  
dle vlastního prohlášení k právním úkonům způsobilými smluvními stranami:

### **Střední odborná škola, Strážnice, Skácelova 890**

sídlem: Skácelova 890, 696 62 Strážnice

IČ: 61742830

bankovní spojení: č.ú.: 1911250267/0100

jednající Mgr. Josefem Gazdíkem, ředitelem

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

### **SKR stav, s.r.o.**

se sídlem: Nováčkova 18, Brno, PSČ: 614 00

IČ: 269 61 474

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně v oddíle c, vložce 48 480

bankovní spojení: č.ú.: 35 - 4361980217/0100

jednající ve věcech smluvních: Ing. Ivo Skřivánek, jednatel

jednající ve věcech technických: Ing. Marian Pala

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

## **Článek I.**


Účelem tohoto dodatku je upřesnění práv a povinností stanovených smlouvou o dílo, která byla uzavřena mezi objednatelem a zhotovitelem dne 25.10.2011, a jejímž předmětem je zhotovení stavby s názvem: **„Regenerace – zateplení Střední odborné školy ve Strážnici“**.

## **Článek II.**


Smluvní strany se dohodly na rozpočtové rezervě ve výši 4,9% ceny díla, což tvoří

- 821.120,- Kč bez DPH
- 985.344,- Kč vč. DPH.



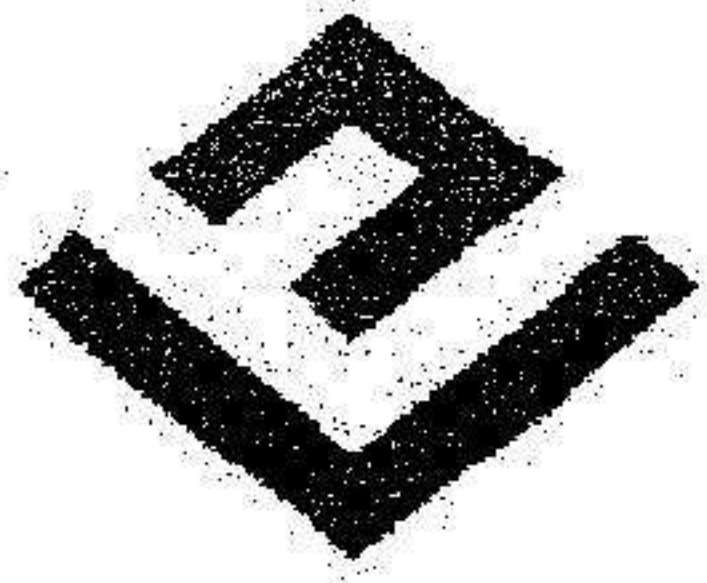

OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

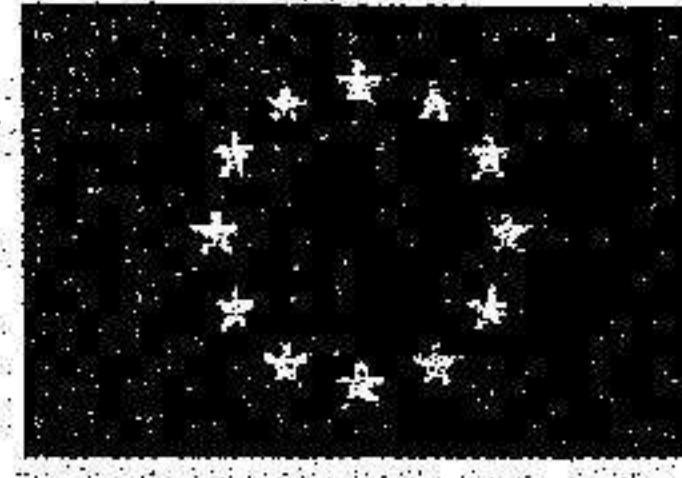

EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

### Článek III.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je vyjádřením jejich svobodně a vážně vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Objednatel:



.....  
*Y. A. K.*

Zhotovitel:


.....  
*[Handwritten signature]*

**Střední odborná škola,  
Strážnice, Skácelova 890**  
IČO: 61742830 DIČ: CZ61742830  
2



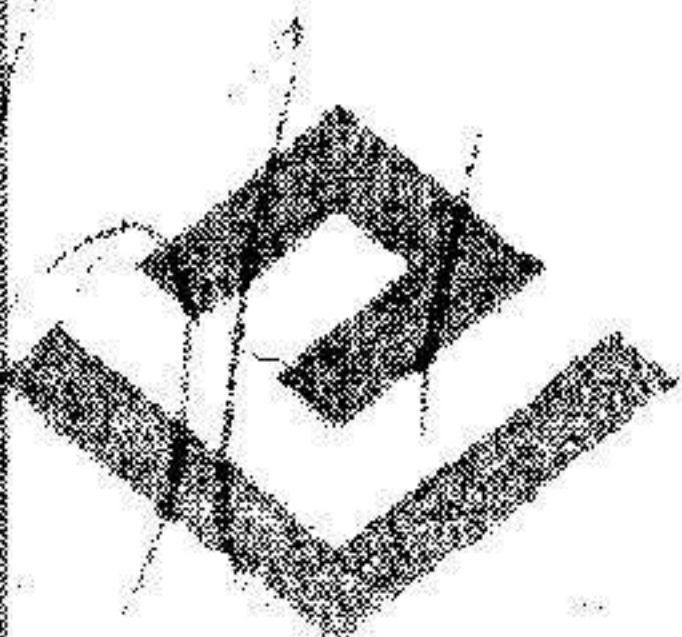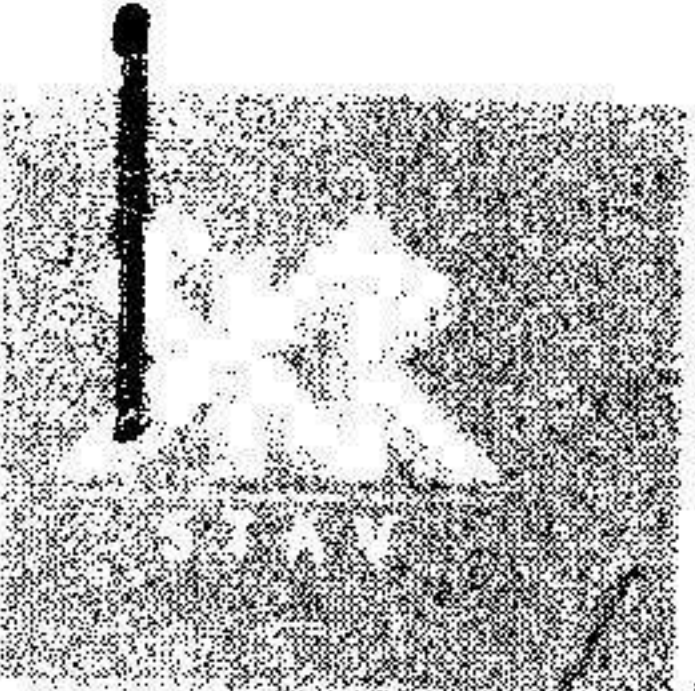

OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

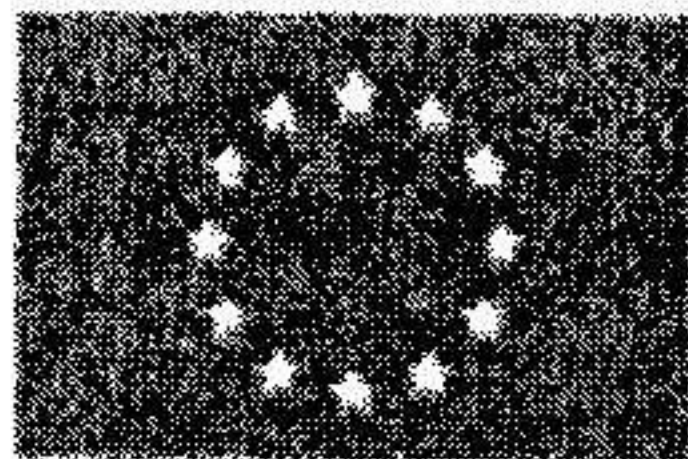

EVROPSKÝ FOND  
Regionální rozvoje  
Evropský fond pro regionální rozvoj



---

## DODATEK č.2 KE SMLouvĚ O DíLO č. 11/130

---

**Střední odborná škola, Strážnice, Skácelova 890**  
sídlem: Skácelova 890, 696 62 Strážnice  
IČ: 61742830  
bankovní spojení: č.ú.: 1911250267/0100  
jednající Mgr. Josefem Gazdíkem, ředitelem

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

**SKR stav, s.r.o.**  
se sídlem: Nováčkova 18, PSČ: 614 00  
IČ: 269 61 474  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložce 48480  
bankovní spojení: č.ú.: 35-4361980217/0100  
jednající ve věcech smluvních: Ing. Ivo Skřivánek, jednatel společnosti  
jednající ve věcech technických: Ing. Marian Pala, hlavní stavbyvedoucí

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

**Obě smluvní strany se z důvodů na straně objednatele dohodly na následující změně smlouvy o dílo č.11/130 ze dne 25.10.2011.**



## I. Předmět smlouvy

### čl.I Předmět smlouvy – doplňuje se o bod 1.3.

- 1.3. Zhotovitel se tímto dodatkem zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku II. tohoto dodatku a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v tomto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č.11/130.

## II. Specifikace díla

### čl.II. Specifikace díla – doplňuje se o bod 2.9.

- 2.9. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v nabídce vě. výkazu výměr, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

## III. Cena za dílo, platební podmínky

### čl.III. Cena za dílo, platební podmínky – se doplňuje v bodě 5.1. následovně:

#### **Původní text bodu 5.1. dle SoD č.11/130:**

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo :  
Cena bez DPH 16 757 545 Kč (slovy: šestnáct milionů sedmsetpadesát sedm tisíc pětsetčtyřicetpět korun českých)  
DPH ve výši 3 651 509 Kč (slovy: tři miliony šestsetpadesát jeden tisíc pětsetdevět korun českých)  
Cena včetně DPH ve výši 20 409 054 Kč ( slovy : dvacet milionů čtyřistadevět tisíc padesátčtyři korun českých)  
(dále též „Cena za provedení díla“)  
Tato cena, vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení, tak, jak je sjednáno v době uzavření smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů, ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou.

#### **Nový text bodu 5.1. dle dodatku č.1 k SoD č.11/130:**

- 5.1. **Původní cena dle SoD č.11/130** 16.757.545,- Kč bez DPH  
(slovy: šestnáct milionů sedmsetpadesát sedm tisíc pětsetčtyřicetpět korun českých)  
**Navýšení ceny dle dodatku č.1:** 900.209,16 Kč bez DPH  
(slovy: devěset tisíc dvěstědevět korun českých a šestnáct haléřů)  
**Nová cena celkem dle dodatku č.1:** 17.657.754,16 Kč bez DPH  
(slovy: sedmnáct milionů šestsetpadesát sedm tisíc sedmsetpadesátčtyři korun českých 16 haléřů)  
**DPH 20% ve výši:** 3.531.550,8 Kč  
(slovy: tři miliony pětsettricetjedna tisíc pětsetpadesát korun českých 8 haléřů )  
**Nová cena celkem dle dodatku č.1 včetně DPH:** 21.189.304,96 Kč včetně DPH  
(slovy: dvacetjedna milionů stoosmdesátdevět tisíc třistačtyři korun českých devadesátšest haléřů)  
Tato cena, vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení, tak, jak je sjednáno v době uzavření smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů, ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou.



Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č.11/130 ze dne 25.10.2011 nedotčené tímto dodatkem zůstávají v plném znění.


Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo č.11/130 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.


Přílohy:

Příč.1: Cenová nabídka – „Regenerace – zateplení SOŠ ve Strážnici – dodatečné plnění“



Ve Strážnici dne

Střední odborná škola,  
Strážnice, Skácelova 890  
IČO: 61742830 DIČ: CZ61742830  
2


  
Mgr. Josef Gazdik  
ředitel školy

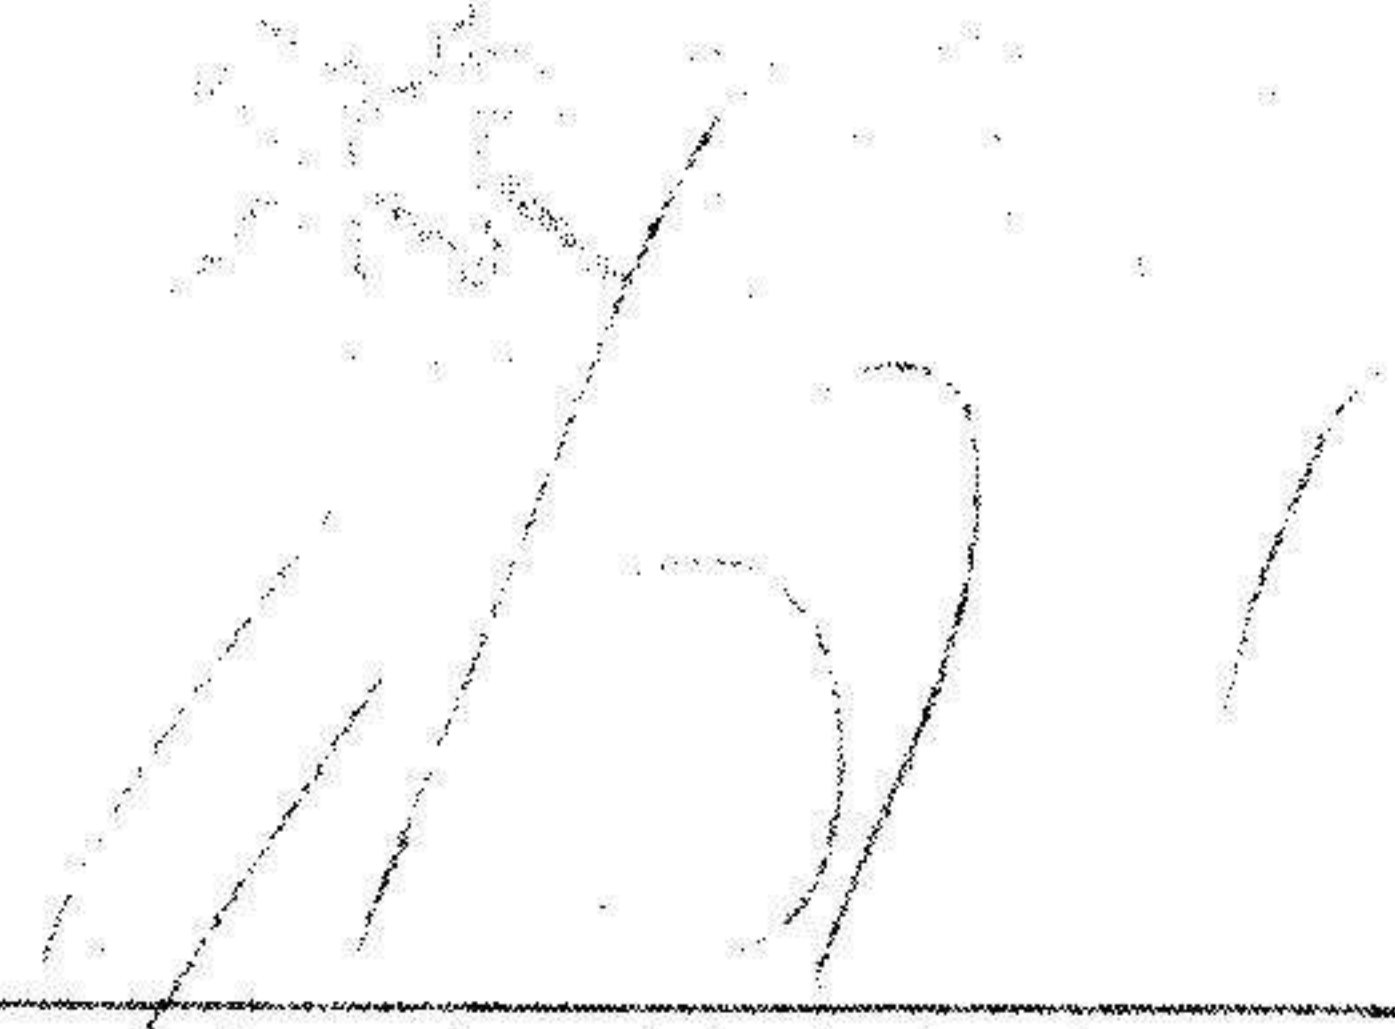  
Ing. Ivo Skřivánek  
jednatel společnosti



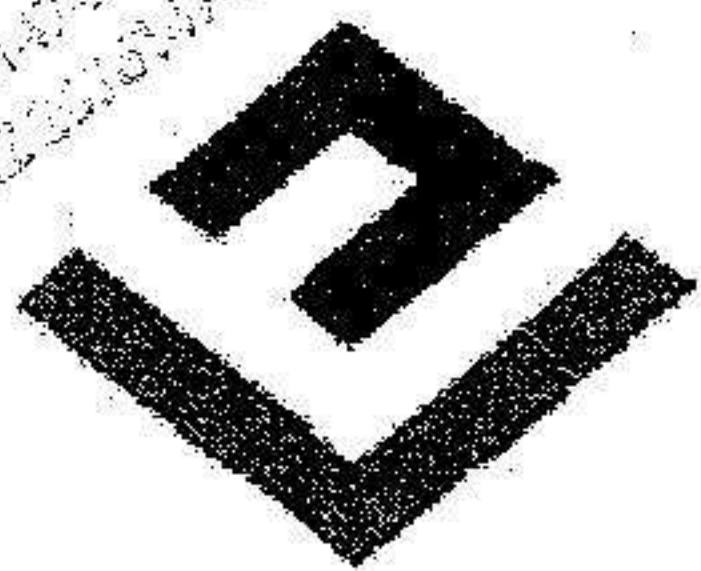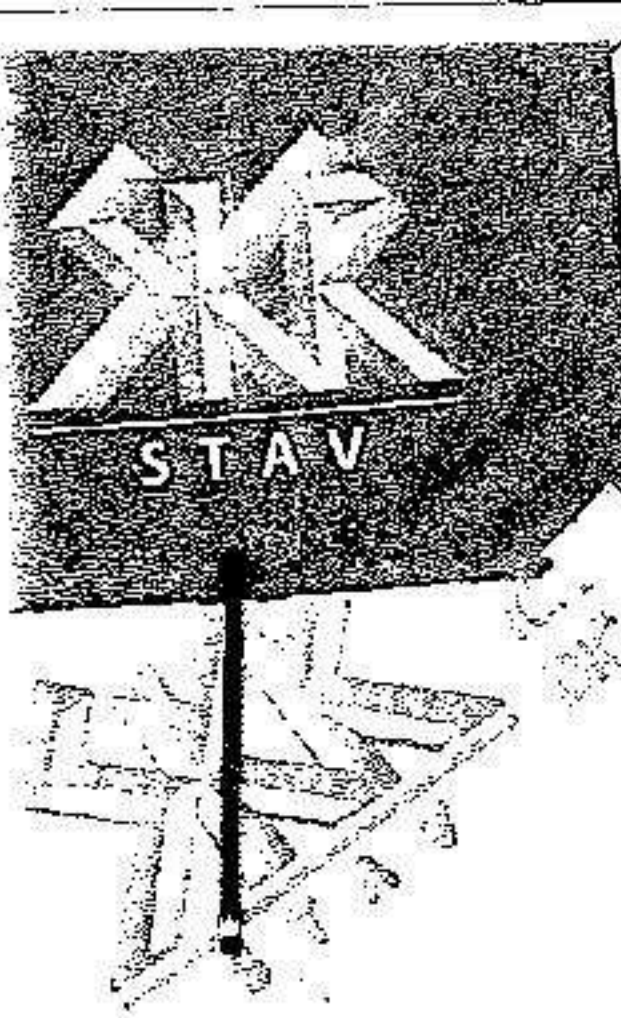

OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

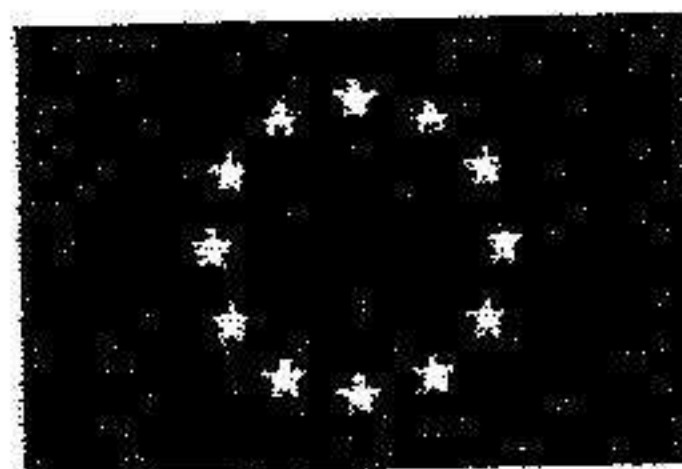

EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,  
vzduch a přírodu



---

## DODATEK č.3 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 11/130

---

**Střední odborná škola, Strážnice, Skácelova 890**  
sídlem: Skácelova 890, 696 62 Strážnice  
IČ: 61742830  
bankovní spojení: č.ú.: 1911250267/0100  
jednající Mgr. Josefem Gazdíkem, ředitelem

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

**SKR stav, s.r.o.**

se sídlem: Nováčkova 18, PSC: 614 00  
IČ: 269 61 474

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložce 48480

bankovní spojení: č.ú.: 35-4361980217/0100

jednající ve věcech smluvních: Ing. Ivo Skřivánek, jednatel společnosti

jednající ve věcech technických: Ing. Marian Pala, hlavní stavbyvedoucí

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

**Obě smluvní strany se z důvodů na straně objednatele dohodly na následující změně smlouvy o dílo č.11/130 ze dne 25.10.2011.**



## I. Předmět smlouvy

### čl.I Předmět smlouvy – doplňuje se o bod 1.3.

- 1.3. Zhotovitel se tímto dodatkem zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku II. tohoto dodatku a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v tomto dodatku č.3 ke smlouvě o dílo č.11/130,

## II. Specifikace díla

### čl.II. Specifikace díla – doplňuje se o bod 2.10.

- 2.10. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v nabídce vč. výkazu výměr, které tvoří nedílnou součást změnového listu č.3 který je přílohou č.1 a změnového listu č.4 který je přílohou č.2 tohoto dodatku.

## III. Doba plnění

### Čl. III.Doba plnění - se mění následovně:

#### **Původní text bodu 3.1. dle SOD č.11/130:**

- 3.1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

zahájení prací: říjen 2011

ukončení prací: květen 2012

protokolární předání řádně provedeného díla: nejpozději 1.6.2012

#### **Nový text bodu 3.1 dle dodatku č.3:**

- 3.1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

zahájení prací: říjen 2011

ukončení prací: červen 2012

protokolární předání řádně provedeného díla: nejpozději 25.6.2012



#### IV. Cena za dílo, platební podmínky

čl. IV. Cena za dílo, platební podmínky – se doplňuje v bodě 5.1. následovně:

##### Původní text bodu 5.1. dle SoD č.11/130:

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo :  
Cena bez DPH 16 757 545 Kč (slovy: šestnáct milionů sedmsetpadesát sedm tisíc pětsetčtyřicetpět korun českých)  
DPH ve výši 3 651 509 Kč (slovy: tři miliony šestsetpadesát jeden tisíc pětsetdevět korun českých)  
Cena včetně DPH ve výši 20 409 054 Kč ( slovy : dvacet milionů čtyřistadevět tisíc padesátčtyři korun českých)  
(dále též „Cena za provedení díla“)  
Tato cena, vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení, tak, jak je sjednáno v době uzavření smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů, ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou.

##### Nový text bodu 5.1. dle dodatku č.1 k SoD č.11/130:

- 5.1. **Původní cena dle SoD č.11/130** 16.757.545,- Kč bez DPH  
(slovy: šestnáct milionů sedmsetpadesát sedm tisíc pětsetčtyřicetpět korun českých)  
**Původní cena dle dodatku č.2:** 900.209,16 Kč bez DPH  
(slovy: devětset tisíc dvě stě devět set osmdesát čtyři korun českých a šestnáct haléřů)  
**Navýšení ceny dle dodatku č.3:** 715.230,12 Kč bez DPH  
(slovy: sedm set patnáct tisíc dvě stě třicet korun a dvanáct haléřů)  
**Nová cena celkem dle dodatku č.3:** 18.372.984,28 Kč bez DPH  
(slovy: osmnáct milionů tři stá sedmdesát dva tisíc devět set osmdesát čtyři koruny a dvacet osm haléřů)  
**DPH 20% ve výši:** 3.674.596,8 Kč  
(slovy: tři milióny šestset sedmdesát čtyři tisíc pět set devadesát šest korun a osmdesát haléřů )  
**Nová cena celkem dle dodatku č.1 včetně DPH:** 22.047.581,- Kč včetně DPH  
(slovy: dvacet dva miliónů čtyřicet sedm tisíc pět set osmdesát jedna korun)

Tato cena, vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení, tak, jak je sjednáno v době uzavření smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů, ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou.





Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č.11/130 ze dne 25.10.2011 nedotčené tímto dodatkem zůstávají v plném znění.

Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo č.11/130 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

Přílohy:


Př.č.1: Protokol o změně díla – změnový list č.3


Př.č.1: Protokol o změně díla – změnový list č.4

Ve Strážnici dne

**Střední odborná škola,  
Strážnice, Skácelova 890**  
IČO: 61742830 DIČ: CZ61742830  
2

  
\_\_\_\_\_  
Mgr. Josef Gazdík  
ředitel školy

  
SKŘ Stav, s.r.o.  
Nováčkova 222/13, 61400 Brno  
IČ: 26961479  
DIČ: CZ26961479

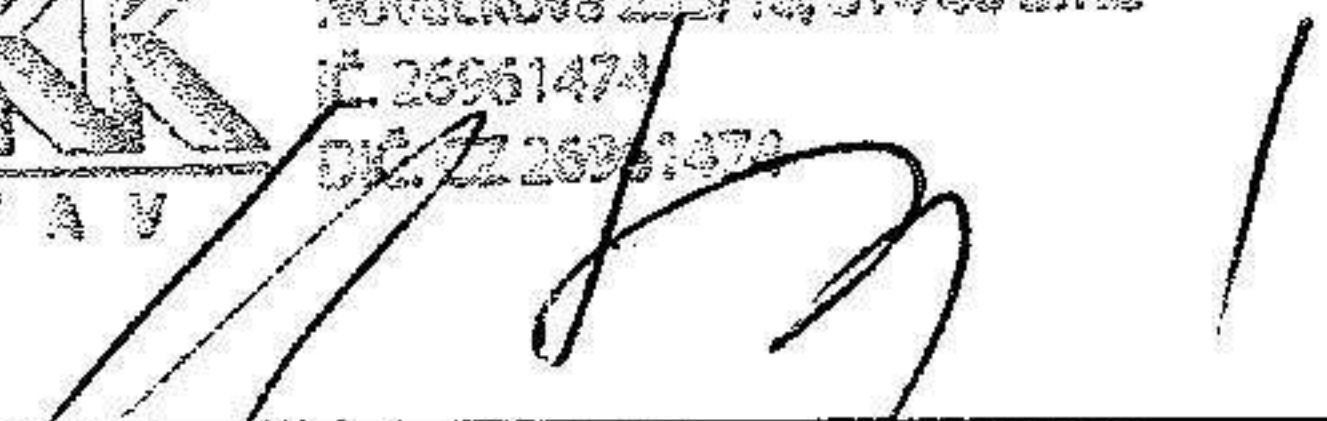  
\_\_\_\_\_  
Ing. Ivo Skřivánek  
jednatel společnosti
