

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2021/519
 Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2022/17
 Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele
 MIOS21802110

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO II/385 ČEBÍN OBCHVAT

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
 zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
 zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
 sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Metrostav Infrastructure a.s.

sídlem Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8
 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
 zastoupený [REDACTED]

IČO: 242 04 005
 sp. zn. B 17819

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XVI. odst. 7. smlouvy o dílo ze dne 06. 01. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění: V zadávacím řízení, na základě kterého byla uzavřena smlouva, došlo k nepředpokládaným průtahům. Byl podán návrh dle §250 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a uzavření smlouvy se oproti předpokladům posunulo o 6 měsíců. Termín pro zahájení stavebních prací se pak dostal do nevhodných klimatických podmínek v zimním období, které nedovolovaly provádět většinu stavebních prací. Z uvedeného důvodu je v souladu s definicí nepředvídatelných okolností dle čl. VI odst. 10 smlouvy o dílo změněn termín pro předání staveniště a v souvislosti s tím i termín dokončení a předání stavby.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Termín předání staveniště	11. 04. 2022
Termín zahájení stavebních prací	do 15 dnů od předání staveniště
Dokončení a předání stavby	do 10. 09. 2023
Předání díla vyjma geometrického plánu	do 60 dnů od předání dokončené stavby
Předání a převzetí geometrických plánů	do 90 dnů od předání dokončené stavby

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohody na změně přílohy č. 2 – Harmonogram věcný a finanční, nové znění je přílohou tohoto dodatku.

III.

Zhotovitel ve smyslu svého dopisu ze dne 9. 3. 2022, zn. MI-OVJM-B/8/22/CEB/SA, upozorňuje, že v době uzavření tohoto dodatku č. 1 probíhá válka na Ukrajině a její důsledky, včetně změny právních předpisů, které se mimo jiné projevují ve výrazném zdražování a nedostupnosti vstupních surovin (např. pohonných hmot, energií nebo oceli), v ekonomické, měnové, společenské, legislativní a bezpečnostní nestabilitě a v nestabilitě na trhu práce včetně částečné nedostupnosti personálu (dále jen „Událost“), představují nepředvídatelnou a neodvratitelnou událost, která má výrazné negativní finanční a časové dopady na provádění díla k tíži objednatel. Zhotovitel se uzavřením tohoto dodatku č. 1 nezříká oznámených či budoucích nároků vyplývajících z Události a nevylučuje nutnost úpravy harmonogramu, smluvních lhůt či smluvní ceny díla v závislosti na dopadech Události. Zhotovitel též upozorňuje, že v tuto chvíli s ohledem na dynamický vývoj Události nelze vyloučit jakékoli dopady Události na provádění díla k tíži objednatel včetně eventuální nutnosti nezahájení či přerušení provádění díla. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 s vědomím výše uvedených skutečností a skutečnosti, že v dodatku č. 1 nejsou zahrnuty a řešeny jakékoli dopady Události a nároky zhotovitele s nimi spojené, jelikož je v době uzavření tohoto dodatku č. 1 nelze jednoznačně vyčíslit, a budou předmětem dalších dodatků k této smlouvě.

Skutečnosti uvedené v odstavci výše a v příloze tohoto dodatku však neznamenají, že při řešení dopadů Události a případných změnách závazku ze smlouvy nebude vždy zhotovitel i objednatel postupovat v souladu s textem smlouvy, zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (zejména §222 a §223 zákona o zadávání veřejných zakázek) a dále pravidly dotace, ze které je stavba hrazena, a také s přihlédnutím k pravidlům efektivity, účelnosti a hospodárnosti, kterými je povinen se objednatel řídit.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.



Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv.

V Praze, dne 15-06-2022

V Brně, dne 20-06-2022



Metrostav Infrastructure a.s.



Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

ID	Kód WBS	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Poznámky
1	II/385	Cebín obchvat				
1.1		Smluvní podmínky stavby	564 dny	06.01.22	09.12.23	
1.1.1		Datum podpisu smlouvy o dílo (úřadnost smlouvy o dílo)		06.01.22	06.01.22	
1.1.2		Zahájení přípravy na staveništi vč. přejezdu jeho užívání a přechodu staveništi		11.04.22	11.04.22	
1.1.3		Zahájení stavebních prací		25.04.22	25.04.22	
1.1.4		Dokončení a předání stavby (uvedení stavby do provozu)		10.08.23	10.08.23	
1.1.5		Přechodní plán význa geometrického plánu		09.11.23	09.11.23	
1.1.6		Přechodní a přezvední geometrických plánů		08.12.23	08.12.23	
1.2		Harmonogram postupů prací	584 dny	25.04.22	10.09.23	
1.2.1		Archeologický průzkum	166 dny	25.04.22	08.10.22	
1.2.2		SO 020 Vozovka a oděvní nártky	267 dny	25.04.22	16.09.23	
1.2.3		SO 001 Příprava území - kácení stromů	56 dny	25.04.22	19.06.22	
1.2.4		SO 010 Demolice božatnice	56 dny	25.04.22	19.06.22	
1.2.5		SO 051 Rekonstrukce skládkových ploch	84 dny	19.06.23	10.09.23	
1.2.6		SO 052 Rekonstrukce stávajících komunikací	84 dny	19.06.23	10.09.23	
1.2.7		SO 101 Přeložka sil. III/385	497 dny	02.05.22	10.09.23	
1.2.8		SO 101.1 Přezvedná cesta v Hradčanech	112 dny	22.05.23	10.09.23	
1.2.9		SO 102 Provizorní napojení stávajících a nové silnice III/385	294 dny	21.11.22	10.09.23	
1.2.10		SO 111 Okružní křižovatka v km 0,428 SO 101	497 dny	02.05.22	10.09.23	
1.2.10.1		přípravné práce	30 dny	02.05.22	31.05.22	
1.2.10.2		práce na stavbě	464 dny	04.06.22	10.09.23	
1.2.11		SO 112 Přeložka sil. III/38529 na Chrástě	434 dny	04.07.22	10.09.23	stavební práce na SO 112 budou probíhat tak, aby byla vždy zachována objízdná trasa dle ZOV, popř. dle projednání s příslušnými správními orgány
1.2.12		SO 113 Přeložka MK na Senboce	434 dny	04.07.22	10.09.23	
1.2.13		SO 114 Přeložka sil. III/3852E na Čebín	434 dny	04.07.22	10.09.23	stavební práce na SO 114 budou probíhat tak, aby byla vždy zachována objízdná trasa dle ZOV, popř. dle projednání s příslušnými správními orgány
1.2.14		SO 116 Přeložka MK v Hradčanech	434 dny	04.07.22	10.09.23	
1.2.15		SO 121 Polní cesta v km 1,410	266 dny	19.12.22	10.09.23	
1.2.16		SO 122 Polní cesta v km 2,780	266 dny	19.12.22	10.09.23	
1.2.17		SO 123 Polní cesta v km 4,100	266 dny	19.12.22	10.09.23	
1.2.18		SO 151 Objízdná na ZÚ	594 dny	25.04.22	10.09.23	
1.2.18.1		Zřízení objízdné na ZÚ	70 dny	25.04.22	03.07.22	
1.2.18.2		Odstavení objízdné na ZÚ	56 dny	17.07.23	10.09.23	
1.2.19		SO 152 Objízdná na KÚ	375 dny	01.08.22	10.09.23	stavební práce na SO 152 na pozemku parc. č. 1137 budou zahájeny po odstranění stávajících objektů jeřábové dráhy a skladu, v předpokládaném termínu 10/2021 po výzvě k odstranění
1.2.19.1		Zřízení objízdné na KÚ	70 dny	01.08.22	09.11.22	
1.2.19.2		Odstavení objízdné na KÚ	56 dny	17.07.23	10.09.23	
1.2.20		SO 161.1 Dopravní značení II. a III. třídy	266 dny	19.12.22	10.09.23	
1.2.21		SO 161.2 Dopravní značení ostatních komunikací	266 dny	19.12.22	10.09.23	
1.2.22		SO 161.3 Přechodní dopravní značení	497 dny	02.05.22	10.09.23	
1.2.23		SO 202 Měsí přezvednutí polok	497 dny	02.05.22	10.09.23	


Poznámka:
 Zhotovitel ve smyslu svého dopisu ze dne 9. 3. 2022, zn. MI-OVJM-B/R/22/CER/SA, upozorňuje, že válka na Ukrajině a její důsledky včetně změny právních předpisů (Událost) má výrazné negativní finanční a časové dopady na provádění díla k tíži objednatel. Tento harmonogram nezahrnuje časové dopady Události, jelikož je v době zpracování tohoto harmonogramu nebylo jednoznačně vyčíslit. Zhotovitel se zpracováním a předáním tohoto harmonogramu nezřídka oznamuje či budoucích nároků vyplývajících z Události a nevytučuje nutnost úpravy harmonogramu a smluvních lhůt v závislosti na podání Události. Zhotovitel též upozorňuje, že v tuto chvíli s ohledem na dynamický vývoj Události nelze vyloučit jakékoli dopady Události na provádění díla k tíži objednatel včetně eventuelní nutnosti nezahájení či přerušení provádění díla.

Legenda:

Úkol	Sohranný	Vnější mlínk	Ruční úkol	Vnější úkoly	Kritické rozdělení	Časová rezervy
Rozdělení	Stavba projektu	Neaktivní mlínk	Pouze s dobou trvání	Vnější mlínk	Příběh	
Mlínk	Vnější úkoly	Neaktivní sohranný	Ruční úkoly zahrnuté v sohranném úkolu	Pouze zahájení	Úkol	
				Pouze s datem dokončení		

Stránka 1

Aktualizovaný harmonogram postupu prací ze dne 29.3.2022 vč. vyznačení kritické cesty (kritická cesta je vyznačena červenou barvou)

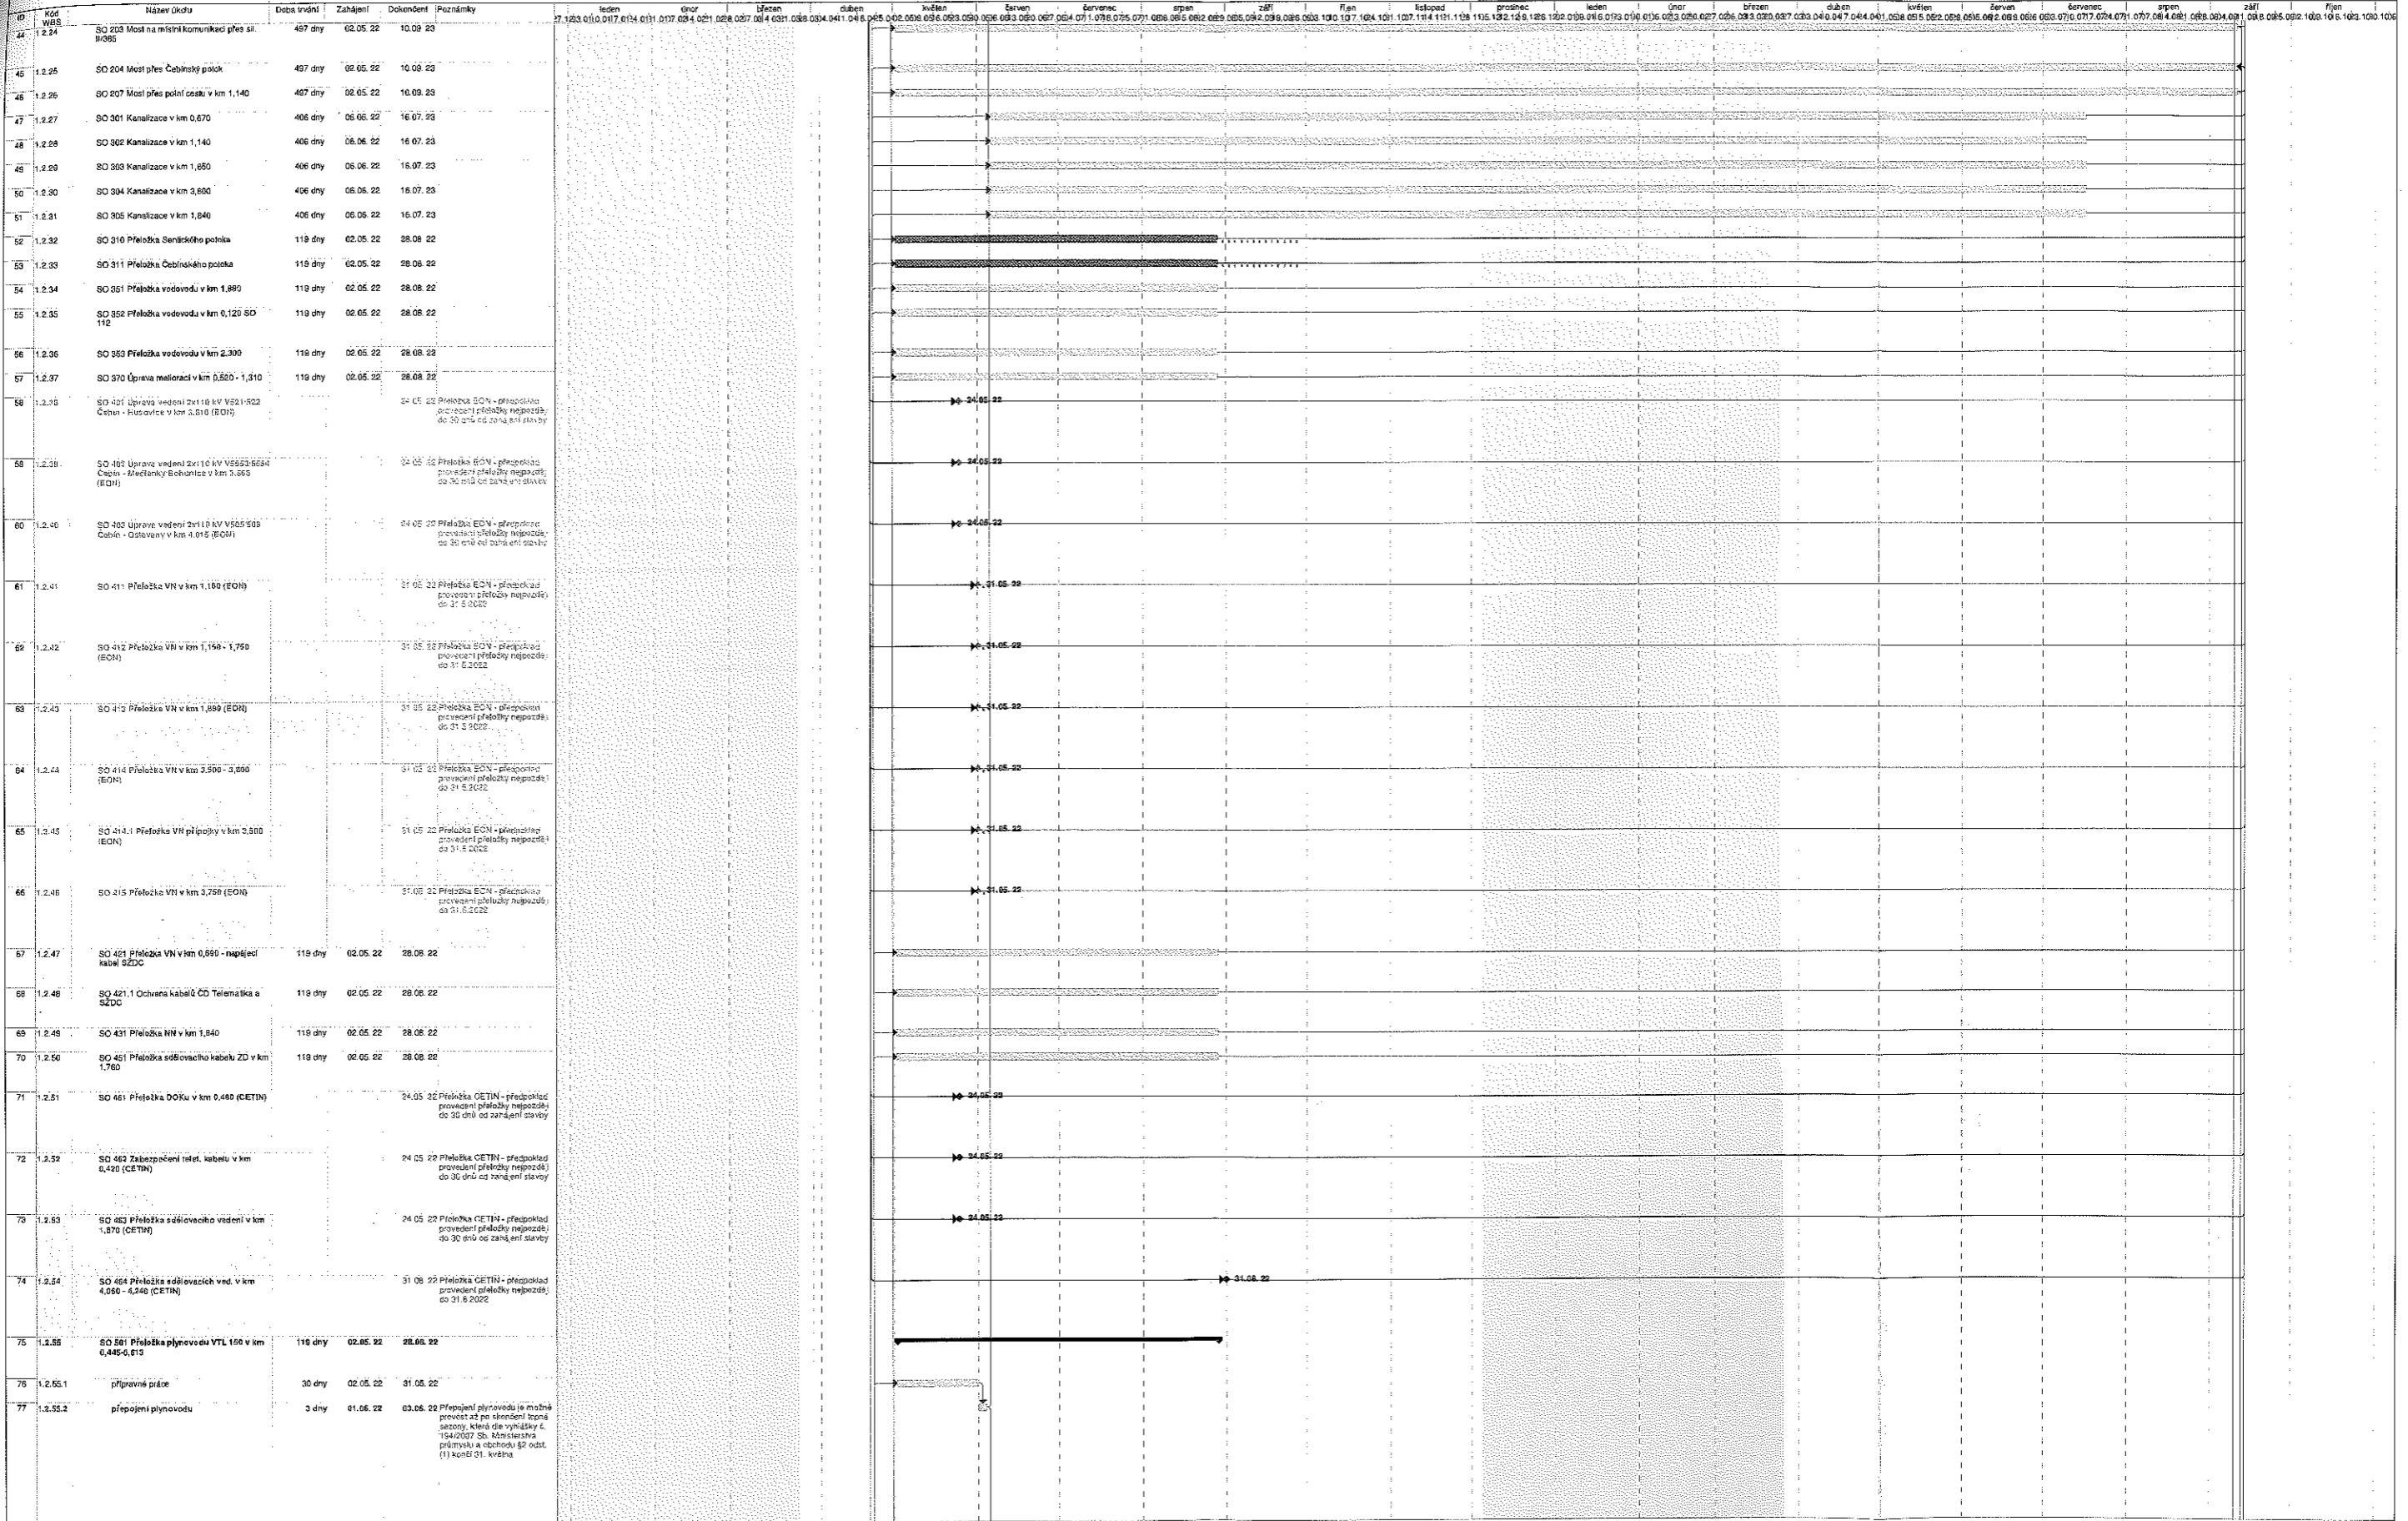


Legenda:

- Úkol
- Rozřazení
- Mílník
- Souhrnný
- Souhrn projektů
- Vnější úkoly
- Vnější mílník
- Nesklápnutí souhrn
- Vnější mílník
- Pauze s dobou trvání
- Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu
- Ruční úkol
- Pauze s dobou trvání
- Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu
- Ruční souhrn
- Pauze zahájení
- Pauze s datem dokončení
- Vnější úkoly
- Vnější mílník
- Kritický
- Kritické rozřazení
- Úkol
- Časová rezerva
- Přůběh

Stránka: II/985 Čebín obchvat Stránka 2 Datum: 28.3.2022

Aktualizovaný harmonogram postupu prací ze dne 29.3.2022 vč. vyznačení kritické cesty (kritická cesta je vyznačena červenou barvou)

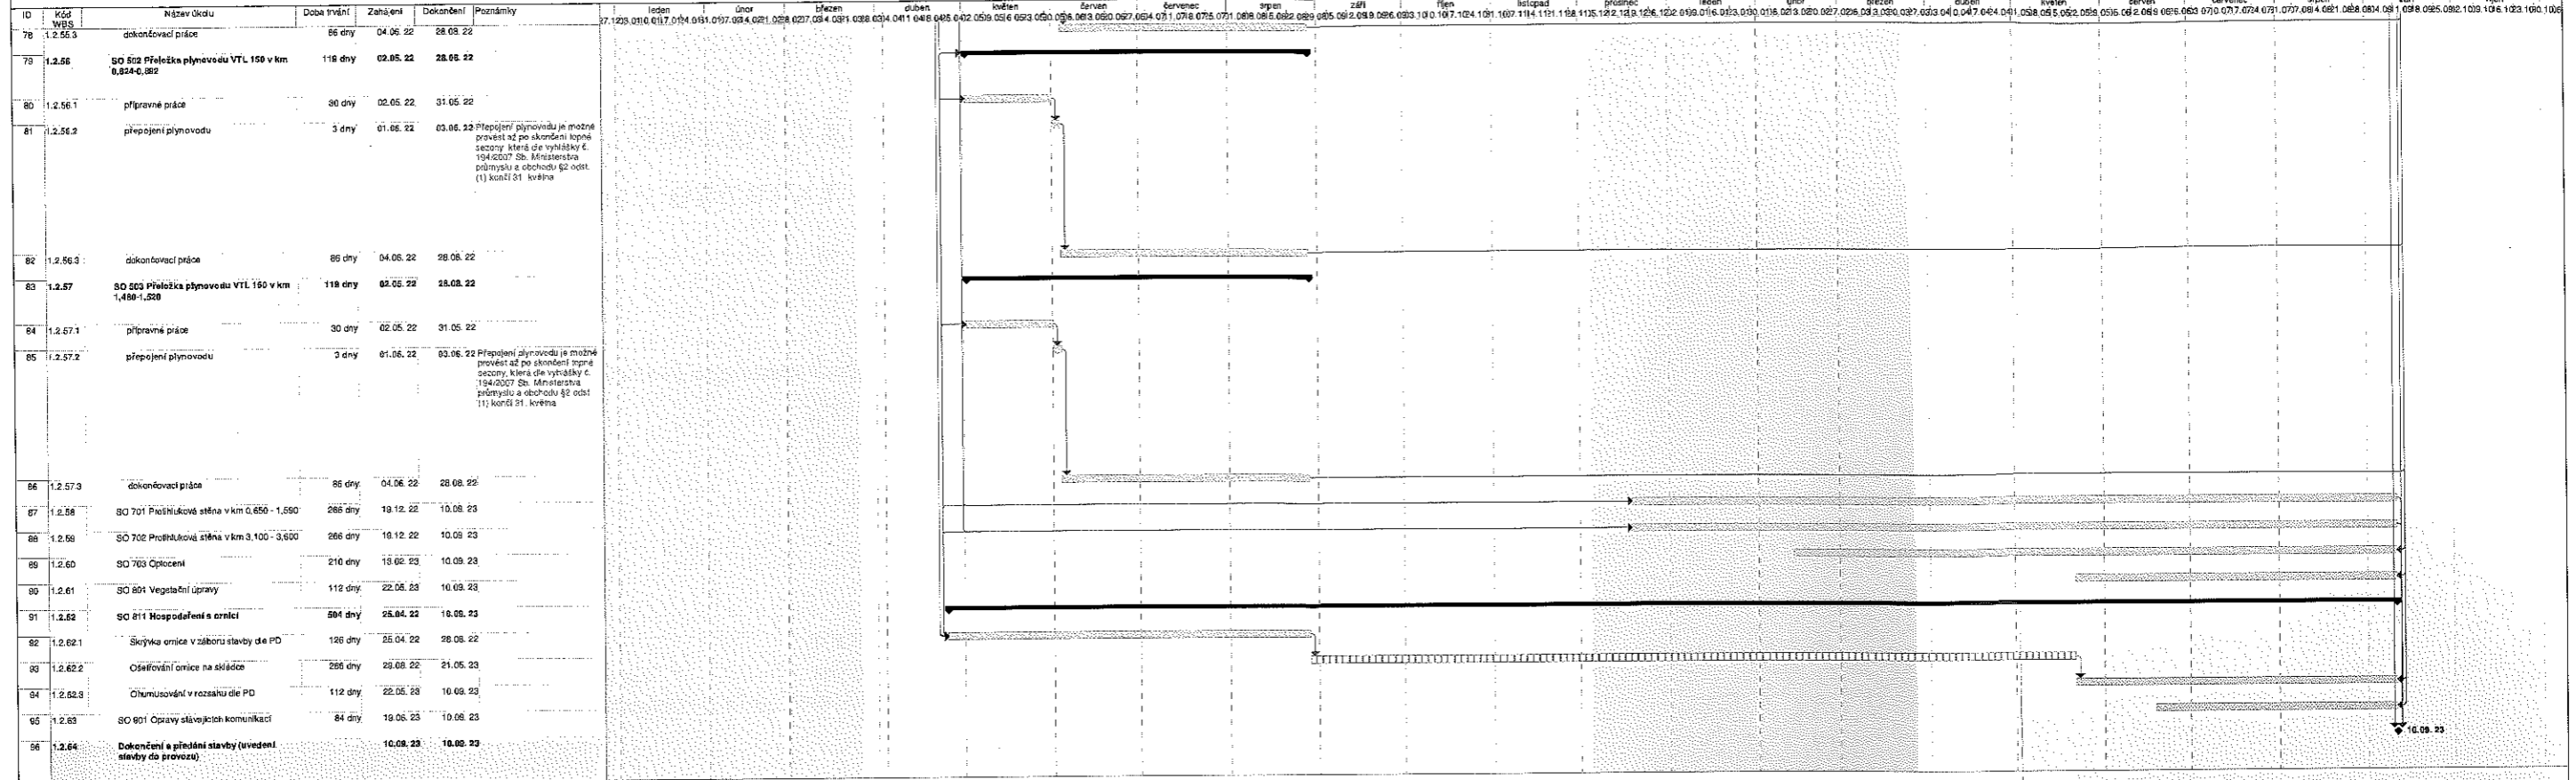

Legenda:

Úkol	Rezdění	Mínk	Stavbný	Stavbný projekt	Vnější díly	Vnější mínk	Neaktivní mínk	Neaktivní stavbn	Ruční díly	Pouze doba trvání	Ruční díly zahrnuté v souhrnném úkolu	Ruční stavbn	Pouze zahájení	Pouze s datem dokončení	Vnější díly	Vnější mínk	Kritický	Kritické rozuzlení	Příběh	Úkol	Časová rezerva
------	---------	------	---------	-----------------	-------------	-------------	----------------	------------------	------------	-------------------	---------------------------------------	--------------	----------------	-------------------------	-------------	-------------	----------	--------------------	--------	------	----------------

Stránka 3

Datum: 29.3.2022

101
