

SMLOUVA O DÍLO

II/394 IVANČICE UL. NA BRNĚNCE

OBJEDNATEL

Město Ivančice

sídlem Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
zastoupen MUDr. Vojtěchem Adamem, starostou

IČO 00281859

a

ZHOTOVITEL

COLAS CZ, A.S.- DIVIZE SILNIČNÍ STAVITELSTVÍ, OBLAST JIH, KOSOVSÁ 10 , JIHLAVA 586 37
REGION JIŽNÍ MORAVA

sídlem **Ke Klíčovu 9, Praha 9 190 00**

zapsaná u Městského soudu v Praze

jednající : **Éric Biguet**, předseda představenstva

Patrick Pujalte, místopředseda představenstva

Benoit Phillipe Marie Clement de Givry, člen představenstva

IČO 26177005

oddíl **B** , vložka **6556**

Zastoupena: Ing. Pavel Armutidis, manažer regionu Jižní Morava, na základě plné moci

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

1. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu.
2. **Dílem je** zhotovení takto definovaných částí díla:
 - i. stavby II/394 Ivančice ul. Na Brněnce (dále jen stavba),
 - ii. dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS),
 - iii. geodetického zaměření stavby,
 - iv. geometrického plánu.
3. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
4. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplně a bezvadné a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných předány objednateli.
5. Místo plnění je určeno projektovou dokumentací jako prostor staveniště. Tam, kde to povaha plnění umožňuje, může být místem plnění i pracoviště objednatele: Městský úřad Ivančice, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice.

II. STAVBA

1. Stavbou je rekonstrukce silnice II/394 v obci Ivančice, ul. Na Brněnce:

Silnice II/394 (ulice Na Brněnce) je vedena v intravilánu města Ivančice, kde na její trasu navazuje síť místních komunikací. Výstavbou nové jednotné kanalizace a vodovodu bude konstrukce vozovky prakticky zničena.

Předmětem zakázky jsou následující objekty :

SO 103 – CHODNÍKY A VJEZDY

SO 104 – PARKOVACÍ STÁNÍ

a dále objekty financované Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje:

SO 101 – SILNICE ULICE NA BRNĚNCE

SO 102 – AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA.

2. Stavba bude provedena tak, aby byla způsobilá k obvyklému užívání, a v souladu se **zadáním stavby**, čímž je v řazení dle závaznosti:
 - i. soupis prací;
 - ii. dokumentace pro provádění stavby zpracovaná v září 2013 Ing. Lubošem Kašpárkem IČ: 45605459 (dále jen projektová dokumentace);
 - iii. akty státní správy:
 - o souhlas dle §15 odst. 2 stavebního zákona čj. MI 4447/2014-SÚ-Co vydané dne 7.4.2014 Městským úřadem Ivančice;
 - iv. písemné pokyny objednatele;
 - v. technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy,
 - vi. technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, vydané Ministerstvem dopravy ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.
3. Objednatel poskytnul zhotoviteli projektovou dokumentaci jako součást zadávacích podmínek při zadávání příslušné veřejné zakázky. Objednatel poskytuje zhotoviteli právo projektovou dokumentaci jako dílo užít, a to výhradně k účelu provádění díla dle této smlouvy.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s technickými normami a technickými podmínkami vztahujícími se k předmětu díla.

III. DSPS

1. DSPS zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy.
2. DSPS bude předána 4 x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena osobou autorizovanou pro obor dopravní stavby; takovou osobou může být zejména osoba vykonávající na stavbě autorský dozor.
3. DSPS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude DSPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu.
4. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

IV. GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ STAVBY A GEOMETRICKÝ PLÁN

1. Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě. Výsledek geodetického zaměření bude ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb.
2. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán při předání stavby, a to 3 x v listinné podobě a 1 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD.
3. Zhotovitel je povinen vyhotovit geometrický plán stavby, který bude určen jak pro účely rozdělení pozemků, tak i pro vymezení rozsahu věcných břemen.
4. Geometrický plán bude předán v listinné podobě v počtu vyhotovení potřebném k tomu, aby do katastru nemovitostí mohly být zapsány veškeré nové skutečnosti na plánu uvedené plus 5 plánů. Geometrický plán bude zároveň předán 1 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD. Předávaný geometrický plán bude v souladu s příslušnými předpisy potvrzen katastrálním úřadem.
5. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému výsledku geodetického zaměření stavby a ke geometrickým plánům. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

V. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

- | | |
|---|---|
| 1. Předání staveniště a zahájení stavby | do 15-ti dnů ode dne podpisu smlouvy |
| 2. Dokončení a předání stavby | 29.08.2014 |
| Předání a převzetí díla | do 30 dnů od předání stavby |

Dřívější plnění je možné.

2. Objednatel předá a zhotovitel převezme prostor staveniště. O předání staveniště bude sepsán samostatný protokol. Při předání prostoru staveniště je zhotovitel povinen předat objednateli:
- Výpočet hluku ze stavební činnosti.
 - Návrh technologického postupu prací.

Předané materiály budou zhotoveny dle příslušných právních předpisů.

3. Stavební práce budou prováděny v souladu s harmonogramem prací, který je přílohou této smlouvy.
4. K předání stavby může dojít pouze tehdy, bude-li stavba bez vad nebo stavba má zjevné drobné vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání jejímu obvyklému užívání. Do dokončení stavby je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
5. Při předání a převzetí díla budou předány výhradně:
- práce a dodávky k odstranění případných vad stavby nebránících užívání stavby k jejímu účelu;
 - vyčištěné prostory staveniště,
 - geometrický plán.

Předání a převzetí díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo dle této smlouvy řádně předáno.

6. Předání a převzetí prostoru staveniště, dokončení stavby a předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby či předání a převzetí díla.
7. Objednatel vyzve zhotovitele k předání a převzetí staveniště písemně, alespoň 5 pracovních dní předem. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí dokončené stavby a předání a převzetí díla písemně, alespoň 5 pracovních dní předem.
8. Alespoň 5 pracovních dní předem předá zhotovitel objednateli veškeré pro dokončení stavby potřebné podklady s výjimkou těch podkladů, u kterých zhotovitel prokáže, že je nebylo možné nejpozději 5 pracovních dní před dokončením a předáním stavby obstarat. Podklady, které nebylo možné obstarat před dokončením a předáním stavby, předá zhotovitel objednateli bezodkladně po té, co je obstará.
9. O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby a předání a převzetí díla je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy. Soupis zjevných drobných vad stavby bude uveden v protokolu o předání a převzetí dokončené stavby.
10. Doby a lhůty podle odst. 1 tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět.

VI. CENA DÍLA

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

534 802,49 Kč

2. K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši.
3. Objednatel není pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel prohlašuje:
- že, nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“),

- ii. že, mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází,
 - iii. nezkrátí daň nebo nevyhlásí daňovou výhodu.
- 4. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací (dále jen rozpočet), který je přílohou této smlouvy.
 - 5. Objednatel budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.
 - 6. Cena díla je sjednána jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla v souladu s projektovou dokumentací a soupisem prací dle přílohy č. 1 smlouvy a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 1. Cena díla bude hrazena na základě jedné faktury s náležitostmi daňového dokladu.
- 2. Přílohou faktury je protokol o předání dokončené stavby a protokol o předání a převzetí díla.
- 3. Lhůta splatnosti faktury je 30 dní od doručení objednateli.
- 4. Zhotovitel je povinen doručit fakturu na adresu **sídla objednatele**.
- 5. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu sídla objednatele předložit fakturu novou či opravenou.
- 6. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
- 7. Zálohové platby se nesjednávají.

VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při provádění díla šetřit veřejné zdroje.
- 2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.
- 3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících s prováděním díla.
- 4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících z projektové dokumentace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.
- 5. Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele. Zástupce objednatele je oprávněn, v případě že zhotovitel provádí dílo v rozporu s dokumenty uvedenými v čl. II. odst. 2 této smlouvy, a ani přes písemné upozornění v zápise z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku nesjedná nápravu, je oprávněn zástupce objednatele zastavit práce na stavbě nebo její části. Toto zastavení stavby nemá vliv na termíny plnění sjednané v čl. VI. odst. 1 této smlouvy. V případě, že zhotovitel část stavby nebo stavbu přesto provede v rozporu s pokyny objednatele, nemá nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených na část stavby nebo stavbu provedenou v rozporu s pokyny objednatele.
- 6. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potřebnou součinnost.

IX. PROVÁDĚNÍ STAVBY

- 1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění prací ke zhotovení stavby dle této smlouvy trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce na staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách pro zadání této zakázky.
- 2. Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.

3. Kontrola

3.1 Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s kontrolním a zkušebním plánem, který je přílohou této smlouvy.

3.2 Zhotovitel je povinen prokazatelně informovat objednatele a další dotčené subjekty o prováděných zkouškách, a to u plánovaných zkoušek alespoň 3 pracovní dny předem, u zkoušek, jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění stavby bezodkladně.

3.3 Zhotovitel je povinen prokazatelně a dostatečně včas (zpravidla alespoň 3 pracovní dny předem) vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou dalším postupem prací zakryty či zneprístupněny. Zhotovitel je povinen stejným způsobem vyzvat případné další dotčené subjekty. Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele či další dotčené subjekty k provedení kontroly, je zhotovitel povinen umožnit objednateli či dalším dotčeným subjektům kontrolu provést. Náklady na takovou kontrolu nese zhotovitel.

3.4 K prověření plnění finančního a věcného plánu provádění díla bude objednatel pravidelně svolávat kontrolní dny. Zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit. O výsledku kontrolního dne bude sepsán záznam do stavebního deníku a případně i samostatný protokol, záznam podepíší všichni zúčastnění.

4. Zhotovitel je povinen pořizovat a průběžně objednateli předávat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoří originály následujících dokumentů:

- i. stavební deník, vedený samostatně po jednotlivých stavebních objektech;
- ii. protokoly o průběhu a výsledku veškerých zkoušek a revizí,
- iii. certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků,
- iv. doklady o likvidaci odpadu,
- v. fotodokumentace provádění stavby, vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitostí - elektronicky na nosiči dat CD či DVD.

Dokumentace bude odpovídat požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, které jsou dány účelem pořizování dokumentace daného druhu.

5. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zapisují se do něj veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy. Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl stavební deník na staveništi přístupný každý pracovní den v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin, v případě provádění stavebních prací v sobotu, neděli či státním svátku i v době, kdy jsou stavební práce prováděny.

6. Subdodavatelé

6.1 Subdodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout určité věci či práva. Náplň činnosti stavbyvedoucího nelze plnit pomocí subdodavatele.

6.2 Zhotovitel ve své nabídce prokazoval kvalifikaci pomocí následujících subdodavatelů.

Název	IČO	Rozsah prací
***	***	***

Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných subdodavatelů pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele.

6.3 Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných subdodavatelů pohybujících se na staveništi po té, co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci subdodavatele a práce, které má subdodavatel provést.

6.4 Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by jí prováděl sám.

7. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZ)

7.1 Zhotovitel je odpovědný za BOZ. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi.

7.2 Objednatelem není určen koordinátor BOZP na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“).

7.3 Vznikne-li v průběhu provádění díla zákonná nutnost určit koordinátora BOZP, zhotovitel to bezodkladně písemně oznámí objednateli.

8. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a není předmětem díla.

X. PROSTOR STAVENIŠTĚ

1. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru staveniště a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy. Prostor staveniště je společný s částí stavby, jejímž objednatelem je Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje.
2. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotovení stavby potřebovat prostor větší, zajistí jej na vlastní náklady.
3. Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla; k tomuto účelu je zhotovitel zejména povinen zajistit:
 - i. Přístup k nemovitostem,
 - ii. Ohlašování pohybu třetích osob na staveništi.
4. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak bezodkladně po té, co se o takové skutečnosti doví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou zaměstnanců objednatele a zhotovitele projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně dalších osob, o kterých to objednatel určí.
5. Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru staveniště pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu pozemních komunikací, památkové péče apod.

XI. ZMĚNY ZADÁNÍ STAVBY

1. Zhotovitel je povinen bezodkladně objednatele informovat o zjištění nutnosti změny zadání stavby.
2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam do stavebního deníku.
3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými.
4. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Součástí nabídky bude oceněný soupis prací, zpracovaný ve formátu *.xls.
5. Nabídková cena bude určena následovně:
 - 5.1 Zhotovitel ocení jednotkové ceny výši odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.
 - 5.2 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny následovně:

Cena prací či dodávek

Cena obdobných prací, případně cena příslušného stavebního objektu, případně cena stavby

Cena uvedená v sazebníku ÚRS PRAHA, a.s.

Cena uvedená v sazebníku ÚRS PRAHA, a.s.

5.3 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně obvyklé.

Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější.

6. K dodatečným pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad.

XII. OPRAVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

1. Oprávněnými osobami objednatele jsou: starosta a správce stavby.
2. Starosta je oprávněn činit veškeré úkony související s touto smlouvou; je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.
3. Správce stavby:
 - i. Je mu vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových zakázek.

- ii. Je mu vyhrazeno vyzvat objednatele k podání nabídky k dodatečným pracím, změnám, či novým zakázkám a dát pokyn k takovému vyzvání zhotovitele.
 - iii. Je mu vyhrazeno rozhodnout o tom, že bude jednáno se zhotovitelem o změně rozsahu díla v případě, že odpadne potřeba objednatele provést dílo ve sjednaném rozsahu.
 - iv. Je oprávněn udělit souhlas s využitím subdodavatele.
 - v. Je oprávněn udělit zhotoviteli pokyny.
 - vi. Je oprávněn vyzvat zhotovitele k převzetí prostoru staveniště a předat prostor staveniště zhotoviteli.
 - vii. Je oprávněn převzít od zhotovitele řádně provedené dílo nebo jeho část, vyčištěné staveniště a veškeré písemnosti; správce stavby je zejména oprávněn podpisem potvrdit správnost soupisu provedených prací.
 - viii. Je oprávněn kontrolovat provádění prací, zejména účastnit se veškerých zkoušek, veškerých souvisejících jednání apod.
 - ix. Je oprávněn provádět kontrolu čerpání finančních zdrojů.
 - x. Je oprávněn činit zápisy do stavebního deníku.
4. Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí Ing. Petr Jeleček, petr.jelecek@colas.cz, 733 780 411.
 5. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým úkonům dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.
 6. Stavbyvedoucí a další oprávněné osoby zhotovitele jsou uvedeny v příloze této smlouvy *Oprávněné osoby zhotovitele*; u dalších oprávněných osob zhotovitele je v příloze uveden rozsah jejich oprávnění.
 7. Seznam oprávněných osob je přílohou této smlouvy

XIII. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě.
2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající možné výši škod. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.
3. Práva objednatele z vady díla
 - 3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.
 - 3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
 - 3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.
 - 3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu po té, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.
4. Záruka za jakost
 - 4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku:

Záruka za veškerá plnění, není-li stanoveno jinak 60 měsíců
 - 4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
 - 4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.
 - 4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.
5. Smluvní pokuta

5.1 Objednatel může na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše a zhotovitel se zavazuje tyto smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit.

V případě prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy oproti lhůtám plnění 1.000,- Kč denně

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka a vad, které má dílo v době předání a převzetí. 500,- Kč denně

V případě provádění díla subdodavatelem, pro kterého objednatel neudělil souhlas, je-li souhlas v této smlouvě vyžadován, nebo subdodavatelem, který nebyl objednateli oznámen, je-li oznámení v této smlouvě vyžadováno 5.000- Kč za subdodavatele

5.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou.

5.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 21 dnů; za den uskutečnění zdanitelného plnění bude považován den vystavení faktury.

5.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.

5.5 Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.

o. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci na objednatele přechází okamžikem předání a převzetí stavby.

XIV. UKONČENÍ SMLOUVY

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se mj. považuje

- i. vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele neodstraní,
- ii. zhotovování stavby v rozporu se zadáním stavby,
- iii. provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé,
- iv. neúčast zhotovitele na kontrolním dnu,
- v. zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak,
- vi. provádění díla s pomocí subdodavatele, který nebyl uveden v seznamu subdodavatelů, ačkoliv na něm uveden být měl, anebo pomocí subdodavatele, jehož identifikace a rozsah prací nebyla objednateli písemně oznámena, ačkoliv písemně oznámena být měla,
- vii. skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
- viii. porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření,
- ix. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
- x. zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje.

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:

- i. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka,
- ii. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů,
- iii. prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 90 dní.

4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.

5. Odstoupením od smlouvy nezanikají již vzniklé sankční povinnosti stran.

XV. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění probíhají v jazyce českém.

2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.
5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Za doručení se rovněž považuje i
 - 5.1 v případě záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku a
 - 5.2 v případě záznamu činěného zhotovitelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku zhotovitelem, který je datován a podepsán správcem stavby.
6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, nestanoví-li tato smlouva jinak.
7. Změny příloh této smlouvy nevyžadují formu dodatku s výjimkou změny rozpočtu, takové změny harmonogramu prací, která má za následek posun lhůt plnění, a změny stavbyvedoucího. Změna přílohy, pro kterou není vyžadována forma dodatku, musí být druhé straně sdělena písemně a prokazatelně doručena.
8. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou.
9. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí ustanovení § 1921, § 1963 odst. 1, § 1976, § 1978, § 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2604, § 2605 odst. 1 věty první, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2611 § 2618, § 2620, § 2621, § 2622, § 2628 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.
10. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
11. Součástí této smlouvy je projektová dokumentace. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy:
 - i. Položkový rozpočet (oceněný soupis prací),
 - ii. Harmonogram prací finanční a věcný,
 - iii. Kontrolní a zkušební plán,
 - iv. Oprávněné osoby objednatele,
 - v. Oprávněné osoby zhotovitele,
12. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 2.

V Modřicích, dne

V Ivančicích, dne 24.6.2014

Ing. Pavel Armutidis

MUDr. Vojtěch Adam, starosta
za objednatele

Manažer regionu Jižní Morava

COLAS CZ, a.s.

COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 3, 190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177306
Tel: 286 003 511 Fax: 286 003 501



ROZPOČET

Stránka 1 / 2

HTM/XLS

Stavba: 14113056-2 - II/394 Ivančice ul. Na Brněnce

Objednatel:

Zhotovitel:

Měna: Kč

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 10.6.2014

P.č.	Kód položky	Popis	M.j.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celk.
1	2	3	4	5	6	7
	14113056	II/394 Ivančice ul. Na Brněnce				
	14113056-2	II/394 Ivančice ul. Na Brněnce				
	02	Město Ivančice - C 2				
	1	Chodníky v ulici Na Brněnce				
	1	Zemní práce				
002	113 105111.R00	Rozebrání a očištění dlažeb z kostek /napojení stávající zámkové dlažby/	m	16,000000	69,30	1 108,80
001	113 106121.R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	369,380000	35,00	12 928,30
003	113 107121.R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kamenivo,zemina tl.15 cm	m2	369,380000	29,20	10 785,90
008	180 402113.R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:1	m2	80,000000	39,30	3 144,00
006	182 301121.R00	Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2	m2	80,000000	37,30	2 984,00
007	182 301122.R00	Úprava terénu, tl. 10-15 cm, do 500 m2	m2	80,000000	29,10	2 328,00
005	919 735122.R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm /napojení na stávající zámekovo	m	16,000000	242,00	3 872,00
004	979 981106.R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace,12 t	t	106,673800	543,60	57 987,88
	1	Zemní práce				95 138,87
	5	Komunikace				
018	564 801112.R00	Podklad ze štěrkodrti 4-8mm po zhutnění tl. 4 cm	m2	437,310000	69,20	30 261,85
016	564 831111.R00	Podklad z kameniva po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	392,310000	109,40	42 918,71
017	564 871111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm /parkovací stání/	m2	45,000000	167,80	7 551,00
019	573 000010.RA0	Komunikace obsluhna z obalovaného kameniva /napojení ulice V Uliče/	m2	40,000000	1 258,70	50 348,00
015	59245094	Dlažba zámková pásek 20/10/6 cm reliéfní,červená	m2	16,160000	363,60	5 875,78
013	59248000	Dlažba zámková pásek 20/10/6 cm přírodní	m2	411,380000	160,00	65 820,80
014	59248002	Dlažba zámková pásek 20/10/6 II červená	m2	14,140000	206,70	2 922,74
009	596 215021.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	392,310000	172,70	67 751,94
010	596 215021.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm /znovu položení dlažby Kartágo/	m2	16,000000	241,10	3 857,60
011	596 245021.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do MC tl. 4 cm /parkovací stání/	m2	45,000000	296,30	13 333,50
012	596 245025.R00	Příplatek za kladení dlažby tl. 6 cm, MC, do100 m2	m2	45,000000	74,60	3 357,00
	5	Komunikace				293 998,92
	711	Izolace proti vodě				
026	711 132101.R00	Izolace proti vlhkosti svislá pásy na sucho fólie s nopy	m2	53,100000	164,10	8 713,71
	711	Izolace proti vodě				8 713,71
	8	Trubní vedení				
020	899 431111.R00	Výšková úprava armatury do 20 cm - malé	KUS	5,000000	1 122,36	5 611,80
	8	Trubní vedení				5 611,80
	91	Doplňující práce na komunikaci				
023	59217420	Obrubník chodníkový 1000/250/80 mm,přírodní	KUS	92,920000	74,00	6 876,08
024	59217472	Obrubník silniční 1000/150/250 mm,přírodní	KUS	25,250000	98,50	2 487,13
021	916 531111.R00	Osazení chodníkového obrubníku do lože bez opěry včetně betonového lože	m	92,000000	268,60	24 711,20
022	917 832111.R00	Osazení silničního stojat. obrub. bet. bez opěry včetně betonového lože	m	25,000000	311,90	7 797,50
	91	Doplňující práce na komunikaci				41 871,91
	99	Staveništní přesun hmot				
025	998 223011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	326,262700	160,20	52 267,28
	99	Staveništní přesun hmot				52 267,28
	1	Celkem Chodníky v ulici Na Brněnce				497 602,49
	2	Ostatní a vedlejší náklady				
	1	Ostatní náklady				25 200,00
001	1	dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS)	kpl	1,000000	6 000,00	6 000,00
002	2	geodetické zaměření stavby	kpl	1,000000	9 600,00	9 600,00
003	3	geometrické plány	kpl	1,000000	7 200,00	7 200,00
004	4	fotodokumentace provádění stavby	kpl	1,000000	2 400,00	2 400,00
	1	Ostatní náklady				25 200,00
	2	Vedlejší náklady				
001	1	zajištění přístupu a příjezdů k sousedním nemovitostem	kpl	1,000000	6 000,00	6 000,00
002	2	zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizi	kpl	1,000000	3 600,00	3 600,00
003	3	bezpečnostní opatření	kpl	1,000000	1 200,00	1 200,00
004	4	ohlašování pohybu třetích osob na staveništi	kpl	1,000000	1 200,00	1 200,00

ROZPOČET

Stránka 2 / 2

HTM/XLS

Stavba: 14113056-2 - II/394 Ivančice ul. Na Brněnce

JKSO:

Objednatel:

EČO:

Zhotovitel:


Zpracoval:

Měna: Kč

Datum:

10.6.2014

P.č.	Kód položky	Popis	M.j.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celk.
1	2	3	4	5	6	7
2		Vedlejší náklady				12 000,00
2		Celkem Ostatní a vedlejší náklady				37 200,00
02		Celkem Město Ivančice - C 2				534 802,49
14113056-2		Celkem II/394 Ivančice ul. Na Brněnce				534 802,49

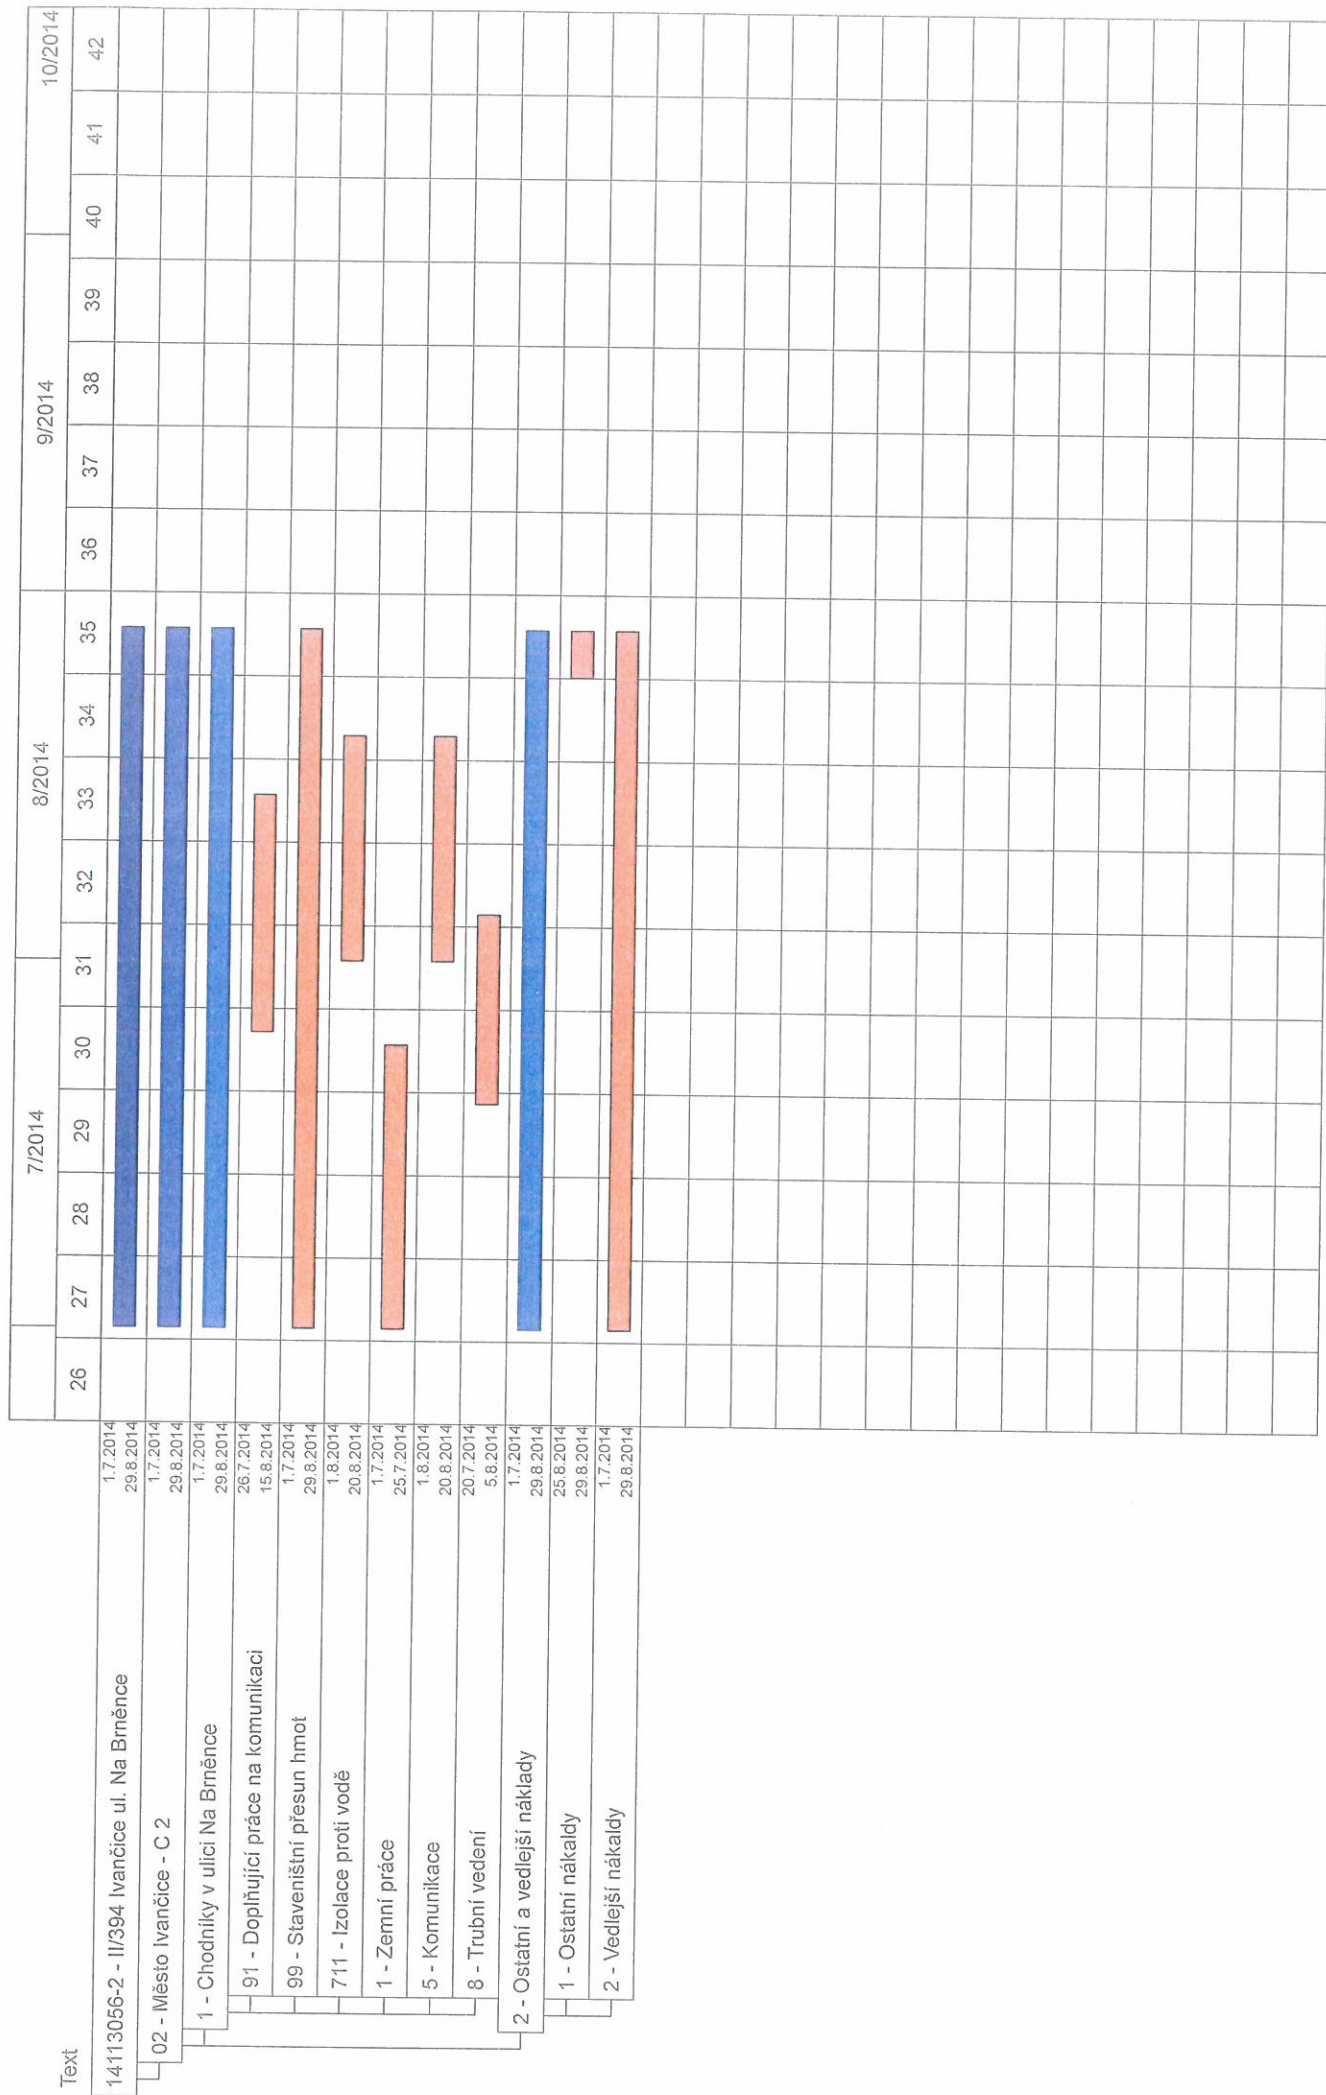

Měna: Kč

Soubor staveb: 14113056 - II/394 Ivančice ul. Na Brněnce
Stavba: 14113056-2 - II/394 Ivančice ul. Na Brněnce

Region, středisko : 113 - Region Jihomoravský

		Rok 2014										1.7.2014 - 29.8.2014	
Měsíc	Odbýt	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 268,31	390 534,18	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM Stavba: 14113056-2 - II/394 Ivančice ul. Na Brněnce												534 802,49	534 802,49

COLAS CZ, a.s.,

Kosovská 10,
586 37 Jihlava



Colas CZ

Kontrolní a zkušební plán

pro stavbu

**II/393,394 IVANČICE ULICE
NA BRNĚNCE**

Datum zpracování: 6.6.2014

Zpracoval: Ing. Pavel Pelikán
Technik kvality

SO 101 + 102 ulice Na Brněnce

Druh kontroly, zkoušky	Četnost kontroly, zkoušky	Výměra	Minimální počet zkoušek
<u>Úprava pláň se zhutněním + sanace:</u>			
zrnitost	1x		1
meze plasticity	1x		1
modul přetvárnosti $E_{def,2}$	1x na 1 000 m ²	3276 m ²	4
míra zhutnění - poměr $E_{def,2}/E_{def,1}$	1x na 1 000 m ²	3276 m ²	4
<u>Podkladní vrstva ze štěrkodrti:</u>			
modul přetvárnosti $E_{def,2}$	1x na 1 500 m ²	1008 m ²	1
míra zhutnění - poměr $E_{def,2}/E_{def,1}$	1x na 1 500 m ²	1008 m ²	1
<u>Podkladní vrstva ŠCM:</u>			
modul přetvárnosti $E_{def,2}$	1x na 1 500 m ²	896 m ²	1
míra zhutnění - poměr $E_{def,2}/E_{def,1}$	1x na 1 500 m ²	896 m ²	1
<u>Hutněné asfaltové vrstvy – ACL 16 + tl. 80 mm:</u>			
zrnitost	2 000 t	172 t	1
obsah asfaltu	2 000 t	172 t	1
mezerovitost asfaltové směsi	2 000 t	172 t	1
míra zhutnění hotové vrstvy - nedestruktivně	po 500 m ²	896 m ²	3
mezerovitost hotové vrstvy - nedestruktivně	po 500 m ²	896 m ²	3
<u>Hutněné asfaltové vrstvy – ACO 11 + tl. 40 mm:</u>			
zrnitost	1 000 t	86 t	1
obsah asfaltu	1 000 t	86 t	1
mezerovitost asfaltové směsi	1 000 t	86 t	1
míra zhutnění hotové vrstvy - nedestruktivně	po 500 m ²	896 m ²	3
mezerovitost hotové vrstvy - nedestruktivně	po 500 m ²	896 m ²	3

Poznámka:

Pro všechny použité stavební materiály budou doloženy prohlášení o shodě a certifikáty ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. a navazujících vládních nařízení.

PŘÍLOHA Č. 4 OPRÁVNĚNÉ OSOBY OBJEDNATELE

STAROSTA OBCE:

MUDr. Vojtěch Adam

546 419 411

starosta@ivancice.cz

SPRÁVCE STAVBY:

PŘÍLOHA Č. 5 OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE

Ing. Pavel Armutidis

Manažer regionu Jižní Morava

COLAS CZ, a.s.

pavel.armutidis@colas.cz

Ing. Petr Jeleček

Hlavní stavbyvedoucí, region Jižní Morava

petr.jelecek@colas.cz
