

VPI Lednice, okružní křižovatka
SRM 8000012798
Číslo smlouvy Investora: 220/2015

**Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
č. VPI/MJ/2015/00065**

uzavřená dle ustanovení § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
a v souladu s § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), v platném znění

Vlastník sítě elektronických komunikací:

O2 Czech Republic a.s.

Se sídlem: Praha 4, Za Brumlovkou 2/266, 140 22 Praha 4

IČO: 601 93 336

DIC: CZ60193336

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 2322

Zastoupená: Ing. Václavem Rozhoněm MBA, manažerem výstavby přístupové sítě dle
pověření ze dne 17.3.2015

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Centrála Praha

Číslo účtu: 27-4908440207/0100

(dále jen „O2“)

a

Investor žadající o překládku sítě elektronických komunikací:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Se sídlem : Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy a jejích dodatků

Zastoupená: Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO : 70932581

DIC : CZ 70932581

Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., pobočka Brno – venkov

Číslo účtu : č.ú. 27-8601490267/0100

(dále jen „Investor“)

uzavírají tuto smlouvu :

Preambule

A) Představenstvo společnosti O2 (pro účely této preambule dále jen „Rozdělovaná společnost“), zabezpečilo v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přeměnách“), vyhotovení projektu rozdělení Rozdělované společnosti formou odštěpení se vznikem jedné nové společnosti ve smyslu § 243 odst. 1 písm. b) bod 1 zákona o přeměnách (dále jen „Projekt rozdělení“ a uvedené rozdělení podle Projektu rozdělení dále jen „Rozdělení“). Právní účinky Rozdělení nastanou v souladu s § 59 odst. 1 zákona o přeměnách dnem zápisu Rozdělení do obchodního rejstříku (dále jen „Den Rozdělení“).

B) V důsledku Rozdělení na nově vzniklou nástupnickou společnost (dále jen „Nástupnická společnost“ nebo „Divize infrastruktura a velkoobchod“) přejde podle § 244 odst. 2 zákona o přeměnách také část jmění Rozdělované společnosti, a to rovněž majetek a dluhy, které Rozdělovaná společnost nabyla nebo nabude po 31.12.2014 na účet Nástupnické společnosti nebo Divize infrastruktura a velkoobchod.

C) Smluvní strany se dohodly a činí nezpochybnitelným, že i) předmět této Smlouvy a tato Smlouva samotná je dluhem Nástupnické společnosti - Divize infrastruktura a velkoprodej, ii) uzavření této Smlouvy je jednáním Rozdělované společnosti na účet Nástupnické společnosti - Divize infrastruktura a velkoprodej iii) a že s ohledem na ustanovení ad. B) této Preambule na Nástupnickou společnost přejdou ke Dni rozdělení veškerá práva a povinnosti z této Smlouvy.

Definice pojmů

Překládkou sítě elektronických komunikací (dále jen „SEK“) se rozumí stavba spočívající ve změně trasy vedení veřejné komunikační sítě nebo přemístění zařízení veřejné komunikační sítě.

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Společnost O2 je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě této smlouvy.
Investor ve smyslu Vyjádření o existenci SEK a Všeobecných podmínek ochrany SEK vydaného dne 31.10.2013 pod č. 689597/13 vyvolává ve smyslu § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb. překládku dotčeného úseku SEK.

Překládka SEK dle této smlouvy je vedena u společnosti O2 pod označením
„VPI Lednice, okružní křižovatka“
realizované v rámci stavby investora „Lednice okružní křižovatka II/ 422“.

Čl. 2 Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je požadavek Investora na překládku SEK ve vlastnictví společnosti O2, závazek společnosti O2 zajistit si překládku SEK a s ní související záležitosti v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a závazek Investora, jež překládku SEK vyvolal, uhradit všechny nezbytné náklady, které společnosti O2 v souvislosti se zajištěním překládky SEK vzniknou.

Čl. 3 Překládka SEK, podmínky překládky SEK

3.1 Překládka SEK dle této smlouvy bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech dle Cenového a technického návrhu překládky SEK, VPI Lednice, okružní křižovatka, který je Přílohou č. 1 této smlouvy (dále jen „Překládka“).

3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou :

- zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby (Překládky) nebo územního souhlasu,
- zajištění práv k užívání překládkou dotčených nemovitostí, tzn. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky nemovitostí dotčených překládkou SEK nebo vyvlastnění takového práva

(to vše dále jen „Předpoklady pro realizaci překládky SEK“).

3.3 Bez zajištění Předpokladů pro realizaci překládky SEK nebude Překládka realizována.

3.4 Vlastníkem přeložené SEK zůstává společnost O2.

3.5 Společnost O2 je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Při realizaci Překládky jinou osobou nese společnost O2 odpovědnost, jako by Překládku realizovala sama.

Čl. 4

Závazky spojené s překládkou SEK

4.1 V souvislosti s realizací Překládky se O2 zavazuje

- před realizací Překládky:
 - zajistit vyhotovení Projektu a ve formátu PDF zaslat kontaktní osobě Investora (viz čl. 8 – ve věcech technických).
 - uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy v souladu s § 5 zákona č. 184/2006 Sb.
- po realizaci Překládky:
 - zajistit dokumentaci skutečného provedení Překládky a elektronicky ve formátu PDF zaslat kontaktní osobě Investora (viz čl. 8 – ve věcech technických) současně s fakturou dle odst. 6.1 této smlouvy
 - zajistit nezbytné geometrické plány věcných břemen a vložení věcných břemen na příslušné pracoviště katastrálního úřadu.

4.2 V souvislosti s provedením překládky se Investor zavazuje

- před realizací Překládky:
 - oznámit společnosti O2 nejpozději do 90 dnů před realizací Překládky stavební připravenost překládky zaměstnanci určenému pro dohled investiční zakázky – viz kontakt čl. 8 věci technické této smlouvy.
 - předá zhotoviteli pravomocné územní, resp. stavební povolení překládky nebo jiný doklad, opravňující zhotovitele k provádění předmětných prací z hlediska správních orgánů, a vyjádření DOSS a správců sítí, platných v době zahájení překládky.

4.3 O2 se zavazuje, že zajistí realizaci Překládky do **8 měsíců od uzavření této smlouvy** a to za předpokladu, že nejpozději 4 měsíce před tímto datem budou zajištěny ve prospěch společnosti O2 všechny Předpoklady pro realizaci překládky SEK uvedené v Čl. 3 bodu 3.2 této smlouvy a ze strany Investora splněny povinnosti uvedené v Čl. 4 bodu 4.2 a v Čl. 6 bodu 6.1 písm. a), jinak nejpozději do 4 měsíců od jejich zajištění ve prospěch O2.

4.4 Investor bere na vědomí, že mezi společnostmi O2 a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 zákona č. 127/2005 Sb. k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti event. zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení takových služebností, které společnost O2 vlastníkům dotčených nemovitostí uhradí, bude Investor s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb. povinen uhradit společnosti O2 jako náklady vzniklé společnosti O2 v souvislosti s Překládkou, stejně tak v případě nákladů společnosti O2 za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do Katastru nemovitostí event. případně nákladů vzniklých společnosti O2 v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.

4.5 Investor se zavazuje poskytnout společnosti O2 při uzavírání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smlouvy o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.

4.6 Sjednaná lhůta realizace Překládky dle Čl. 4 bodu 4.3 této smlouvy se prodlužuje o tolik dnů, o kolik dnů byly práce k jejímu provedení přerušeny nebo nemohly být případně zahájeny z důvodu nikoliv na straně společnosti O2.

4.7 Závazky (povinnosti) společnosti O2 z této smlouvy týkající se realizace Překládky a souvisejících záležitostí, jež Překládce předcházejí, jsou rozděleny do dvou etap. První etapa je co do rozsahu stanovena položkami uvedenými v Příloze č. 3 této smlouvy (dále jen „První etapa“) a bude považována za ukončenou dnem ukončení První etapy tj. dnem, kdy bude Investorovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy nebo adresu elektronické pošty uvedenou v Čl. 8 této smlouvy oznámení o ukončení První etapy. Druhá etapa bude stanovena co do rozsahu Projektem (dále jen „Druhá etapa“) a považována za dokončenou dnem ukončení realizace Překládky tj. dnem, kdy bude Investorovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy nebo adresu elektronické pošty uvedenou v Čl. 8 této smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky.

Čl. 5 Náklady spojené s překládkou SEK

5.1 Investor je na základě zákona č. 127/2005 Sb. § 104 odst. 17 povinen nést náklady překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které mu v souvislosti s překládkou SEK vzniknou, a které by mu nevznikly, kdyby k překládce nedošlo.

5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě Cenového a technického návrhu ke dni uzavření této smlouvy činí **573.626,-Kč (bez DPH)**.

Specifikace těchto nákladů je uvedena v Příloze č. 2 této smlouvy. Investor bere na vědomí, že tato výše nákladů byla stanovena před vyhotovením projektové dokumentace Překládky (dále jen „Projekt“) na základě měrných nákladů společnosti O2 (tj. je pouze orientační).

5.3 Výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho základě (dále jen „Náklady Překládky stanovené na základě Projektu“). Společnost O2 písemně oznámí do 4 měsíců od měsíců od uzavření této smlouvy Investorovi výši Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu, včetně položkového rozpočtu dle ceníku společnosti O2 – PPD platného v období vyhotovení projektové dokumentace

5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti O2 vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v Čl. 5 bod 5.2 této smlouvy, Investor se zavazuje je společnosti O2 uhradit za předpokladu, že nebudou zahrnuty v nákladech Překládky stanovených po vyhotovení Projektu ve smyslu čl. 5 bodu 5.3 této smlouvy. Tyto náklady budou předem oznámeny investorovi.

Může se jednat například o:

- náklady na náhrady za omezení vlastnického práva zřízením služebnosti vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti, případně dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím (blíže specifikovány v Čl. 4 bodu 4.4. této smlouvy),
- náklady vzniklé v souvislosti s vyvlastňovacím řízením dle předchozího odstavce a dle čl. 4 bodu 4.4 této smlouvy,
- náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (vážnouch na nemovitostech dotčených původní, překládanou, trasou SEK) z Katastru nemovitostí,
- náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
- hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
- náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- náklady na identifikaci parcel,

- náklady na správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění, které vzniknou zhotoviteli v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí - povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
- náklady, související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací předmětného díla podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění,
- náklady, související se zvláštním užíváním komunikace ve smyslu § 25 zákona č. 13/1997 Sb.,
- náklady na peněžitě plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
- náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
- náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
- náklady, související se záchranným archeologickým dohledem.

Čl. 6

Platební podmínky

6.1 Platbu za náklady na Překládku dle Čl. 5 bodu 5.3 této smlouvy je Investor povinen uhradit takto:

- a) Fakturu č. 1 ve výši **20.566,- Kč** (bez DPH) do 30 dnů od jejího vystavení,
- b) Fakturu č. 2 ve výši doplatku nákladů za Překládku do 30 dnů od jejího vystavení.

K ceně nákladů za Překládku bude připočtena DPH v souladu s platným zněním zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v sazbě nebo sazbách podle platných právních předpisů. Investor se zavazuje DPH ve výši dle platných právních předpisů zaplatit vždy současně s platbami dle 6.1 a), b) této smlouvy.

6.2 Daňový doklad dle bodu 6.1 písm. a) tohoto článku bude vystaven do 15 dnů od ukončení První etapy, daňový doklad dle bodu 6.1 písm. b) tohoto článku bude vystaven do 15 dnů od ukončení realizace Překládky ve smyslu Čl. 4 bodu 4.7 této smlouvy a Investor je povinen uhradit je ve lhůtě splatnosti. Současně bude k faktuře č.2 přiloženo konečné vyúčtování Překládky dle skutečnosti. Faktury budou zaslány elektronicky na adresu: faktury@susjmk.cz.

6.3 Daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Daňový doklad bude Investorovi zasílán na adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy.

6.4 Náklady společnosti O2 uvedené v Čl. 5 bod 5.4, budou hrazeny Investorem odděleně na základě samostatného daňového dokladu vystaveného společností O2 a Investor je povinen je uhradit ve lhůtě jeho splatnosti. O2 daňový doklad vystaví do 12 měsíců od ukončení překládky.

6.5 Náklady dle této Smlouvy budou Investorem hrazeny na účet společnosti O2 uvedený v hlavičce této smlouvy pokud nebude daňovým dokladem vystaveným společností O2 stanoveno jinak. Dnem úhrady daňového dokladu (zaplacením fakturovaných nákladů) se rozumí den připsání účtované (fakturované) částky na účet společnosti O2.

Čl. 7

Sankce

7.1. Strany této smlouvy si sjednávají pro případ prodlení Investora s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle této smlouvy povinen, povinnost Investora zaplatit společnosti O2 smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý den prodlení.

7.2. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru druhé straně doručena.

7.3. Povinností zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v bodu 7.1 tohoto článku, není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

7.4. Povinnost zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v bodech 7.1. až 7.3. tohoto článku, trvá i po skončení trvání této smlouvy, jakož i poté, co dojde k odstoupení od ní některou ze stran či oběma stranami.

Čl. 8

Kontaktní osoby

a) Za investora:

ve věcech smluvních: Ing. Jan Zouhar funkce: ředitel SÚS JmK, p.o.k.
e-mail: jan.zouhar@susjmk.cz tel. 547120300

ve věcech technických: Ing. Blanka Stöhrová funkce: vedoucí TSÚ
e-mail: blanka.stohrova@susjmk.cz tel. 737 237 122

b) Za O2 :

ve věcech smluvních Ing. Václav Rozhoň funkce : manažer pro výstavbu přístupové sítě
e-mail vaclav.rozhon@o2.cz tel. 602 409 503

ve věcech technických Antonín Tuza funkce :specialista pro výstavbu sítě
e-mail antonin.tuza@o2.cz tel. 602 786 463

Čl.9

Odstoupení od smlouvy

9.1 Dostane-li se Investor do prodlení s úhradou některé platby dle této smlouvy a toto prodlení trvá déle než 60 dní, poruší Investor smlouvu podstatným způsobem a společnost O2 je oprávněna od této smlouvy odstoupit nejpozději do 80. dne prodlení.

9.2 Pokud výše nákladů Překládky stanovených na základě Projektu bude vyšší o více jak 10% než výše nákladů Překládky stanovených na základě Cenového a technického návrhu je Investor oprávněn odstoupit od této smlouvy do 30 dnů od doručení písemného oznámení dle Čl. 5 bodu 5.3 této smlouvy.

9.3 V případě, že dojde k odstoupení dle bodu 9.1 nebo 9.2 tohoto článku je Investor povinen uhradit společnosti O2 náklady již vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy.

Čl. 10

Rozvazovací podmínka

10.1. Realizace Překládky musí být zahájena nejpozději do dvou let od uzavření této smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou této smlouvy ve smyslu ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku, v platném znění.

10.2. Tato smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou let od uzavření této smlouvy, aniž by realizace Překládky byla zahájena. Zánikem smlouvy touto rozvazovací podmínkou není dotčeno právo společnosti O2 na zaplacení smluvní pokuty dle čl. 7.1. až 7.4. této smlouvy, a tomu odpovídající povinnost Investora tuto pokutu zaplatit. Právo na náhradu škody zůstává zachováno.

Čl. 11

Závěrečná ustanovení

11.1. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou.

11.2. Vztahy, které nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

11.3. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé strany.

11.4. Započtení na pohledávky vzniklé z této smlouvy se nepřipouští.

11.5. Tato smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

11.6. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami bude zasílána doporučeně na adresy uvedené v hlavičce této smlouvy nebo na adresy elektronické pošty uvedené v Čl. 8 této smlouvy, ustanovení § 573 občanského zákoníku se neuplatní.

11.7. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

11.8. Strany vylučují aplikaci ustanovení § 1805 odst. 2 občanského zákoníku na tuto smlouvu,

11.9. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

VPI Lednice, okružní křižovatka
SRM 8000012798
Číslo smlouvy Investora: 220/2015

11.10. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

11.11. Žádný závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.

11.12. O2 souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn.

11.13. Smluvní strany potvrzují, že uzavření této smlouvy je výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah této smlouvy

11.14. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

Přílohy :

1. Cenový a technický návrh Překládky
2. Specifikace nákladů
3. Specifikace První etapy
4. ÚR Č.j.: MUBR 46206/2014

V Praze dne 28 -05- 2015


V Brně dne 27.5.2015

O2 Czech Republic a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4
DIČ: CZ60193336
1113


*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)ř*




O2 Czech Republic a.s. :
Ing. Václav Rozhoň MBA
manažer pro výstavbu přístupové sítě



Investor :
Ing. Jan Zouhar
ředitel SÚS JMK

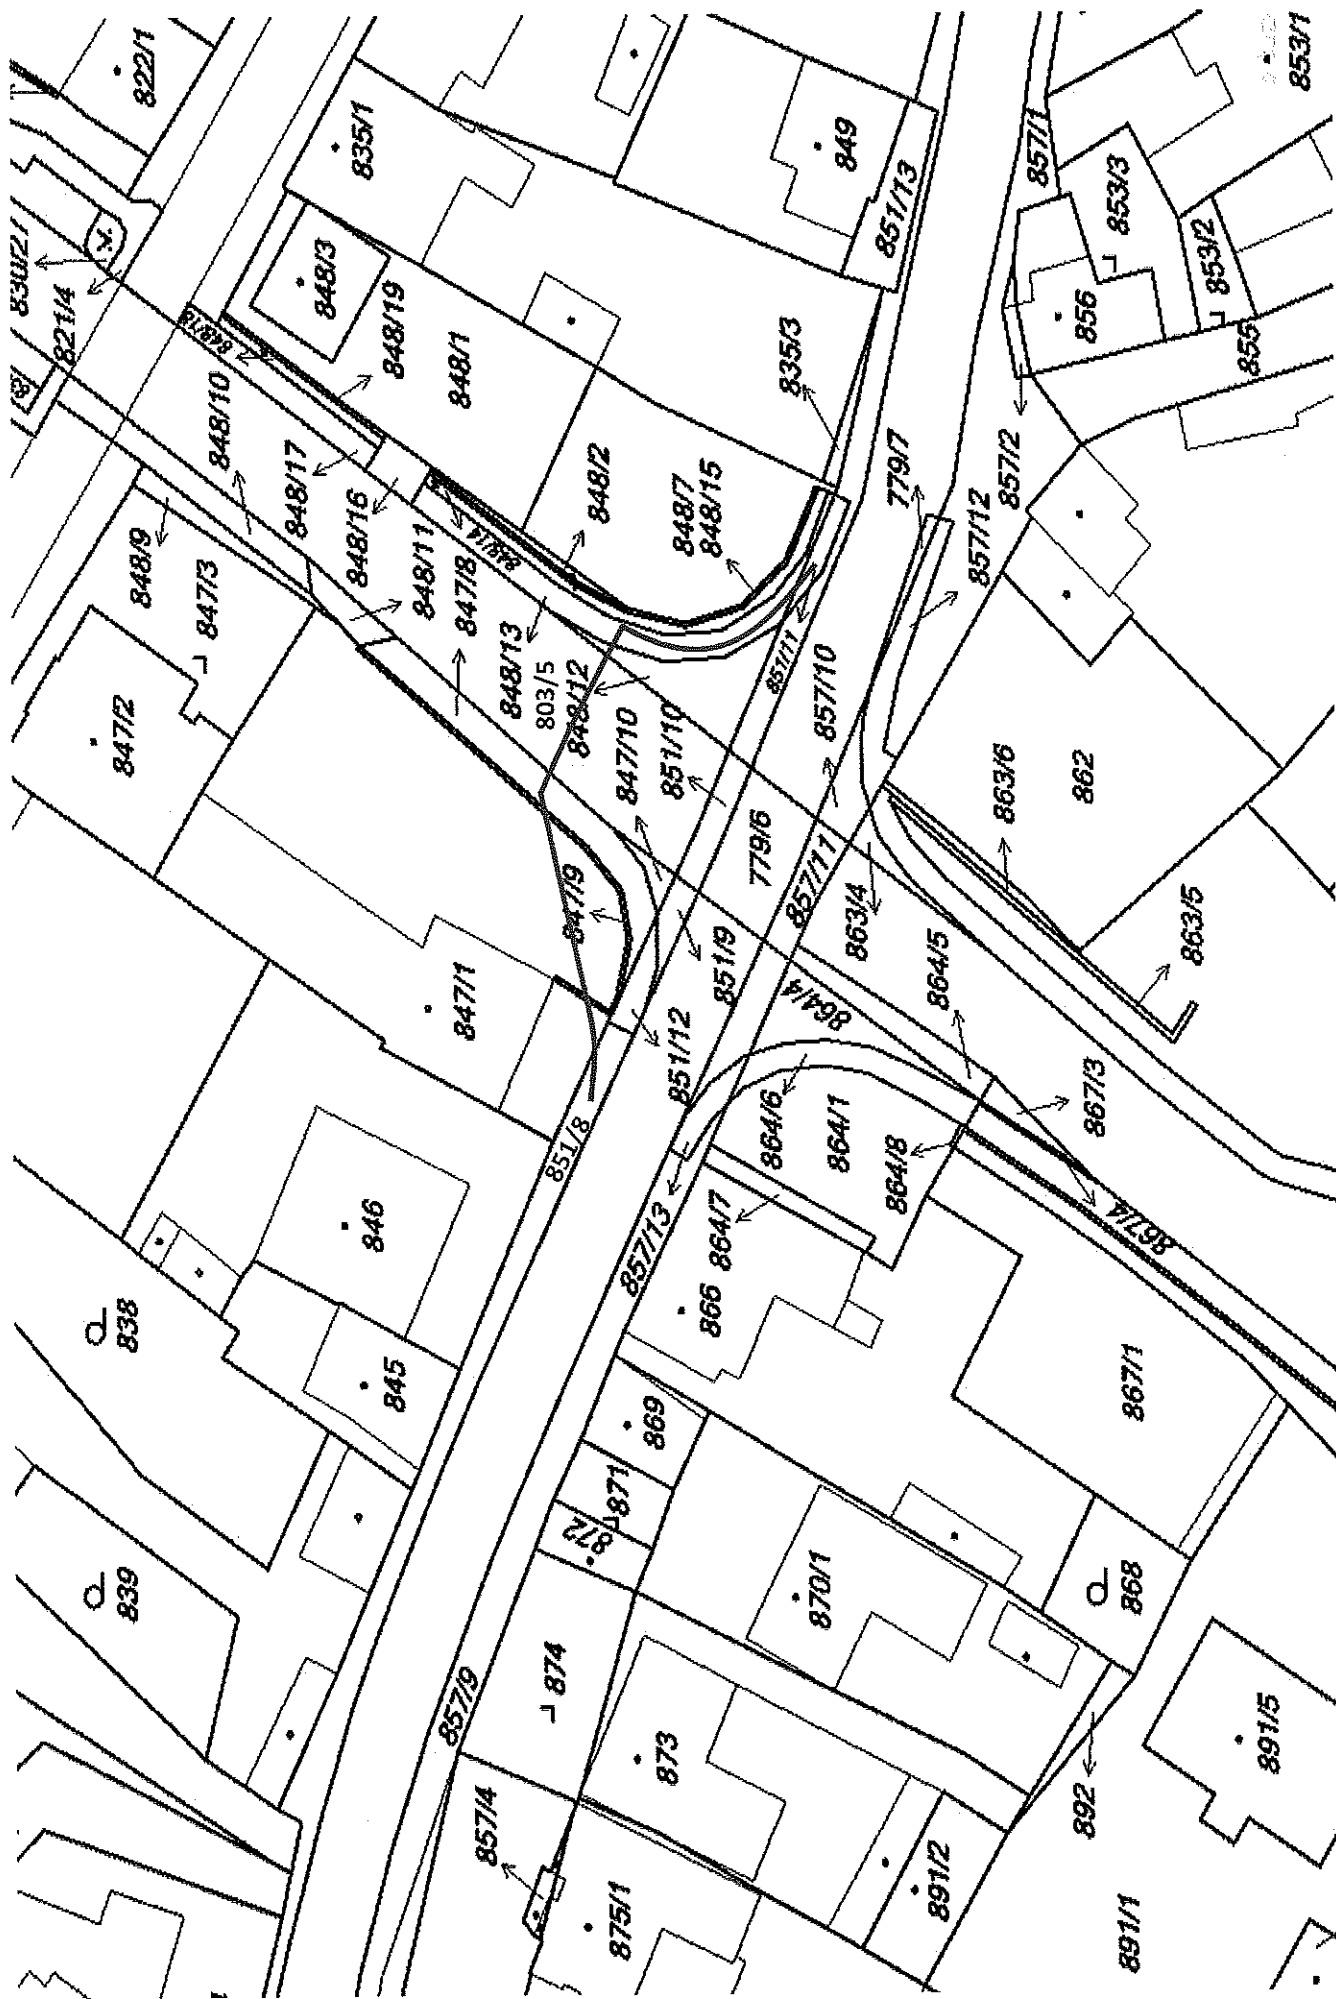



O2 Czech Republic a.s.

Startovací dokumentace

INVESTIČNÍ AKCE

Kategorie

Podkategorie

Číslo SAP

Číslo interní 20208/15/0021

Název

VPI Lednice, okružní křižovatka

Budoucí uživatel

GMO-BOZL Tuza Antonín
Manažer/KPO

Zpracoval

Vedoucí
Manažer

Michal Novotný
Michal Neumann
Michal Neumann

Schváleno

Obsah:

1 Souhrnná zpráva

1.1 Základní údaje

1.2 Účel stavby

2 Technická zpráva

2.1 Vstupní podklady

2.2 Navrhované řešení

2.3 Popis tras

2.4 Použité technologie

2.5 Použité předpisy

2.6 Koordinace

2.7 Ostatní

1. Souhrnná zpráva

1.1 Základní údaje

Identifikační údaje

Název:	VPI Lednice, okružní křižovatka
Kategorie:	
Podkategorie:	
Typ investice:	Vynucená překládka s inženýringem
Důvod I:	Bez určení
Číslo interní:	20208/15/0021
Prvek SPP:	
ABC:	C
HOST:	
ATÚ:	VÚJ Lednice-RSU

Kapacitní údaje

		Průměrný náklad na:	
100800_Délka HDPE trubek pro OK	0.134 km	kmp mk	7.924 tis. Kč
100200_Délka metalických kabelů	0.536 km	kmk mk	929.104 tis. Kč
100700_Délka nadzemní tratě	0 km	km vyk	4184.874 tis. Kč
100100_Délka párů v metalických kabelech	62.846 km	km kv	0 tis. Kč
100300_Délka výkopů vč.podvrtů a přechodů	0.119 km	kmo kv	0 tis. Kč
Páry vyvedené na hlavní rozvaděč ústř.	0 pár	b.j.	0 tis. Kč
100400_Páry zakončené v účast. rozvaděčích	0 pár		
100900_Počet bytových domů	0 BD		
101100_Počet bytových jednotek v bytových domech	0 bj		
100500_Počet rodinných domů	0 RD		
100600_Počet bytových jednotek v rodinných domech	0 bj		

Požadavky:

Název polygonu: VPI Lednice, okružní křižovatka

K akci nejsou evidovány žádné požadavky

Termíny:

Platnost ÚR od:	
Platnost ÚR do:	
Plánované zahájení přípravy:	01.05.2015
Plánované ukončení přípravy:	01.09.2015
Plánované zahájení realizace:	01.10.2015
Plánované ukončení realizace:	01.05.2016
Nabídka k přejímce (Plán):	01.04.2016

1.2 Účel stavby:

Navržené technické řešení je v souladu s TM000072.
Překládaný kabel PFLE 150XN0,8 se za překládaným místem dělí do více rozvaděčů (viz. rozpárování).
Druhý překládaný kabel PFLE 150XN0,8 bude využitý pro napájení vysunutého DSLAMu LEDN2, viz. CaTN
PVDSL5M_E05_B_LEDN2_MET.

2 Technická zpráva

2.1 Vstupní podklady:

Požadavek IPMS int.č. 20208/15/0021 na zpracování CaTN: VPI Lednice, okružní křižovatka.

2.2 Navrhované řešení:

Z důvodu budování nové okružní křižovatky v Lednici, ul. Mikulovská, Valtická a Malinovského, dojde k přeložení stávající SEK O2.

Překládkou budou dotčeny následující prvky SEK O2:

- 3 x PFLE 3XN 0,4
- PFLE 10XN 0,4
- PFLE 75XN 0,4 v překládaném úseku bude kabel nahrazen tendrovaným kabelem PFLE 100XN 0,4
- PFLE 50XN 0,8
- 2 x PFLE 150XN 0,8
- HDPE40 B v překládaném úseku bude trubka HDPE40 B nahrazena tendrovanou trubkou HDPE40 O/BB
- HDPE40 Z v překládaném úseku bude trubka HDPE40 Z nahrazena tendrovanou trubkou HDPE40 C/BB

Na začátku a konci překládky budou kabely a HDPE trubky přerušeny a pomocí spojek XAGA a TS 40mm PLASSON se naspojkují na nové prvky SEK O2. Kabely a trubky HDPE40 budou přeloženy do nové trasy - mimo budoucí kruhovou křižovatku.

Pod komunikací budou prvky SEK O2 vedeny v ochranných trubkách 3 x AROT 160mm. Vedle těchto trubek bude zatažena rezervní trubka PE 160mm. Pod komunikací bude vlivem zachování stávajícího provozu realizován 4 x řízený protlak.

Stávající zrušená vedení O2 se překládat nebudou. V případě potřeby se opatří kabelovými koncovkami SKH.

V místě křižovatky (u domu č.p. 105) dojde k předláždění stávajícího chodníku. V případě výskytu stávající SEK O2 (kabely PFLE 10 a 5XN 0,4) pod obrubou, budou tyto kabely stranově přeloženy. Vzhledem k minimálnímu posunutí kabelů nepočítá CaTN s kabelovými spojkami, ani se zřízením VBŘ.

Na této straně křižovatky musí stavebník zajistit ověření uložení SEK O2 v místech křížení se silnicí v neporušených chráničkách, které jsou vyvedeny min. 1m za obrubu silnice (viz. podmínky POS). Pokud bude stávající ochrana nedostatečná, bude v celé délce křížení SEK O2 se silnicí připojena celistvá chránička PE 110mm se zataženým lankem, na obou koncích utěsněná.

2.3 Popis tras

viz. přiložené podklady

VVN: ne

El. trakce: ne

Vodní toky: ne

2.4 Použitá technologie:

Kabel typu TCEPKPFLE 0,4 a 0,8

Kabelová spojka XAGA

Mini Markér Ball

HDPE 40

AROT 160, 110mm

2.5 Použité předpisy:

TPP 2001-1 (TP 69a) - Výstavba přístupových sítí -

Metallické kabely (část I.)

TPP 2001-2 (TP 69b) - Výstavba přístupových sítí -

Metallické kabely (část II.)

TPP 2001-3 (TP 69c) - Výstavba přístupových sítí -

Metallické kabely (část III.)

TA 10 (I.-III.) - Výstavba nadzemních sítí

ČSN 736005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 334050 - Podzemní sdělovací vedení

ČSN 341100 - Křižovatky a souběhy vedení

Výkop, položení a obsazení chráničky je v souladu s ČSN 73 6005

2.6 Koordinace:

Ing. Bezděková, MT: 737 237 132 - SÚS JMK
Ing. Zvěďělík, MT: 602 595 821 - projektant

2.7 Ostatní:

PD: ANO

ÚR: NE - zajistil stavebník

VBŘ: ANO, GP jen na trasu překládky s vložkami

GEO: ANO

SoUZ: NE

PEW: ANO

Před vlastním zahájením prací je nutno zajistit PEW (přerušení metalických kabelů) - min. 40 dnů předem.

RZ je povinný oznámit zahájení výkopových prací a pozvat ke kontrole před záhozem výkopů PC a PTD.

Kabelové chráničky a kabelové spojky budou opatřeny detekčními markery MiniBall.

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP - Morava - VEG - STAND. - 2015.04

Položková 2015.04

databáze:

Název stavby: 20208/15/0021 VPI Lednice, okružní křižovatka

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD: Vega.com a.s., Michal Novotný

KPO: JMO

HOST: Břeclav

VUJ: Lednice

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	17 259,74 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	225 666,10 Kč
MONTÁŽ	96 562,94 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	10 601,12 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	3 306,66 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	10 668,30 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. TCZ	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	207 561,20 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	2 000,00 Kč
Celkové náklady:	573 626,06 Kč
 STAVEBNÍ ČINNOST	 540 391,36 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST	33 234,70 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958210		Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	4 594,49 Kč
953634		Projekt tl km liniové metalické sítě	1.00 ks	12 665,25 Kč
PD Zóna I (0,051-0,100 km)				
ZEMNÍ PRÁCE				
952384	S	Podvrh řízený nad 150 mm	56.00 m	166 329,52 Kč
954970	S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	15.00 m	208,95 Kč
954959	S	Rýha v chodn. zám. dlaž. 35/50-70 rozš. o 10 cm	76.00 m	10 123,20 Kč
952362	S	Rýha v chodníku zámková dlažba 35/50-70	38.00 m	18 076,60 Kč
955571	S	Rýha ve vozovce l. asf. 50/100 rozš. o 10 cm	15.00 m	3 040,50 Kč
955570	S	Rýha ve vozovce litý a sfalt 50/100	15.00 m	15 184,50 Kč
954967	S	Rýha vjezd litý bet. 35/70-90 rozš. o 10 cm	20.00 m	4 376,40 Kč
954957	S	Rýha vjezd litý beton 35/70-90	10.00 m	7 611,10 Kč
955054	S	Vytyčení trasy podél silnice, železnice	77.00 m	715,33 Kč

MONTÁŽ

955029	S	Demontáž úložných kabelů do 15 XN	30.00 m	417,90 Kč
958306	S	Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba	134.00 m	420,76 Kč
952649	S	Měření stejnosměrné během stavby - první čtyřka	10.00 ks	1 206,70 Kč
952650	S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	449.00 ks	12 504,65 Kč
952644	S	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	436.00 ks	8 096,52 Kč
952643	S	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	8.00 ks	519,84 Kč
952647	S	Měření útlumu během stavby - první čtyřka	8.00 ks	965,36 Kč
955000	S	Montáž jedné čtyřky s oboustr. číslováním	888.00 ks	20 610,48 Kč
955288	S	Montáž koncovky SKH	7.00 ks	259,91 Kč
955268	S	Montáž podzemní trasy sítové metalické	1.00 ks	16 849,17 Kč
rozpočtová rezerva				
955282	S	Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek	8.00 ks	10 395,60 Kč
955281	S	Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek	8.00 ks	7 054,16 Kč
955284	S	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	4.00 ks	162,00 Kč
952602	S	Montáž trubky úložné	134.00 m	1 353,40 Kč
954990	S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	298.00 m	4 702,44 Kč
954992	S	Montáž úložných kabelů do 300 XN	201.00 m	5 597,85 Kč
954991	S	Montáž úložných kabelů do 50 XN	67.00 m	1 306,50 Kč
955630	S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	5.00 ks	4 139,70 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE				
955198	S	Plán geom. pro VBŘ do 200m vč. (kus=100m)	1.00 ks	2 424,87 Kč
955278	S	Provedení geodetického měření pro trasy sítové	1.00 ks	3 767,40 Kč
geo vytyčení				
956284	S	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	1.00 ks	4 408,85 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA				
955313		Uzavření sml. o SB o VBŘ	3.00 ks	3 306,66 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE				
955315		Uzavření sml. na zákl. SSB a přípr. vkl. VBŘ	3.00 ks	5 951,97 Kč
958085		Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	3.00 ks	4 716,33 Kč
POPLATKY				
955367		Poplatky k podzemním trasám sít. metalic.	1.00 ks	2 000,00 Kč
náklady na kolaudaci				
Limitka materiálu				

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303918	S	Deska krycí plast. 300x1000 mm	38.00 ks	1 336,84 Kč
303795	S	Fólie výstražná 220mm PE oranžová	63.00 m	219,87 Kč
303813	S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	63.00 m	252,63 Kč
303777	S	Fólie výstražná 80mm PE červenobílá	126.00 m	260,82 Kč
300110	S	Kabel plastový TCEPKPFLE 100x4x0,4	67.00 m	11 071,75 Kč
300106	S	Kabel plastový TCEPKPFLE 10x4x0,4	67.00 m	1 571,15 Kč
300132	S	Kabel plastový TCEPKPFLE 150x4x0,8	134.00 m	121 038,18 Kč
300000	S	Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,4	201.00 m	2 448,18 Kč
300130	S	Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,8	67.00 m	20 157,62 Kč
316534	S	Koncovka smršť. SKH 2 9/20 mm	5.00 ks	309,20 Kč
316547	S	Koncovka smršť. SKH 4 25/55 mm	2.00 ks	296,94 Kč

VPI Lednice, okružní křižovatka _Specifikace nákladů, Příloha č. 2

302550	S	Mini Marker 1401 3M Ball	4.00 ks	890,44 Kč
312425	S	Modul konektor. 9700-10P	178.00 ks	4 914,58 Kč
312845	S	Spojka kabelová XAGA 500 43/ 8- 150/FLE	8.00 ks	3 217,92 Kč
312889	S	Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 400/FLE	4.00 ks	2 808,92 Kč
303501	S	Spojka plastová 110/94 mm	2.00 ks	62,98 Kč
303607	S	Spojka plastová 160/137mm	9.00 ks	575,64 Kč
320294	S	Spojka smršťovací XAGA 500-100/25-460	4.00 ks	3 097,00 Kč
303003	S	Spojka trubky HDPE 40mm Plasson	4.00 ks	782,20 Kč
300027	S	Trubka HDPE 40/33 černá -2x bílé pruhy	67.00 m	1 664,95 Kč
300036	S	Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x bílé pruhy	67.00 m	1 664,95 Kč
302655	S	Trubka PE 110/3,5/6000mm	3.00 ks	1 394,64 Kč
316139	S	Trubka PE 160/14,6/6000mm	10.00 ks	27 523,80 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný				
304267	S	Páska lepicí iz. 19mmx20mx0,15mm černá	16.00 ks	0,00 Kč
403175	S	Pěna montážní Soudal 300ml	2.00 ks	0,00 Kč

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP - Morava - VEG - STAND. - 2015.04

Položkov 2015.04

á

databáze:

Název stavby: 20208/15/0021 VPI Lednice, okružní křižovatka

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD: Vegacom a.s., Michal Novotný

KPO: JMO

HOST: Břeclav

VUJ: Lednice

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAV 17 259,74 Kč

A

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA 3 306,66 Kč

Celkové náklady: 20 566,40 Kč

Seznam položek				
Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAV				
A				
958210		Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	4 594,49 Kč
953634		Projekt tlkm liniové metalické sítě	1.00 ks	12 665,25 Kč
PD Zóna I (0,051-0,100 km)				
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA				
955313		Uzavření sml. o SB o VBŘ	3.00 ks	3 306,66 Kč



S00RX00OFTUK

Městský úřad Břeclav
odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu

oddělení stavební úřad

Sp. zn. MUBR-S 24504/2014 OSŘOŽÚ/VI-328
Č.j.: MUBR 46206/2014
Oprávněná Alena Vlachová
úřední osoba: tel.: 519 311 325

Břeclav, dne 22.07.2014



Obec Lednice
Zámecké náměstí 70
691 44 Lednice

Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dne 17.7.2014

Městský úřad Břeclav
odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu

ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

podpis

④

Výroková část:

Městský úřad Břeclav, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 17.04.2014 podala

Obec Lednice, IČO 283339, Zámecké náměstí 70, 691 44 Lednice,
kteřou zastupuje Viadesigne s.r.o., IČO 27696880, Na zahradách 1151/16, 690 02
Břeclav

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby

Silnice II/422 Lednice - okružní křižovatka

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 779/1, 779/5, 779/6, 779/7, 803/5, 847/1, 847/8, 847/9, 847/10, 848/12, 848/13, 851/1, 851/8, 851/9, 851/10, 851/11, 851/12, 857/9, 857/10, 857/11, 857/12, 857/13, 863/4, 864/4, 864/5, 864/6, 901/7, 901/9 v katastrálním území Lednice na Moravě.

Druh a účel umísťované stavby:

- Okružní křižovatka silnic II/422 (ul. 21. dubna) a III/42417 (ul. Mikulovská).

Umístění stavby na pozemku a prostorové řešení stavby:

- **SO 101 - Komunikace** - stávající průsečná křižovatka bude rozšířena směrem ke stavbě na pozemku p. č. 847/1 tak, aby mohla vzniknout okružní křižovatka o průměru 25 m s jízdním pásem šířky 6,0 m, dlážděným prstencem šířky 3,0 m a středovým ostrovem

průměru 7,0 m. Na větvích tvořených silnicí II/422 budou zkráceny stávající ochranné ostrůvky, na větvích tvořených silnicí III/42417 budou postaveny směrovací ostrůvky. V místě rozšíření bude umístěna nová typová uliční vpust s protizápchovým opatřením a bude zrušen sjezd na pozemek p. č. 847/1.

- **SO 102 - Chodník** - v místě rozšíření vozovky je navržen nový chodník šířky 2,50 m tvarem kopírující tvar křižovatky.
- **SO 103 - Dopravní značení** - nepodléhá povolení ze strany stavebního úřadu
- **SO 104 - Přejížděcí dopravní značení** - dtto
- **SO 401 - Veřejné osvětlení** - v severní části okružní křižovatky bude přeložen stávající sloup o 8,0 m severním směrem. Současně budou u nových přechodů pro chodce postaveny nové sloupy veřejného osvětlení s výložníky tak, že u dělených přechodů směr Podivín a Valtice po dvou a u nedělených přechodů směr Břeclav a Mikulov po jednom. Sloupy budou napojeny podzemním kabelem na stávající vedení VO. Sloupy nacházející se v severní části okružní křižovatky (přeložený sloup VO a sloup osvětlující přechod pro chodce na severovýchodní větví) budou napojeny pomocí kabelu o délce 27,5 m vedeným pod chodníkem podél severního okraje okružní křižovatky, kabel je napojen u sloupu VO osvětlující přechod pro chodce v severozápadní větví, který je zde napojen na stávající podzemní vedení.
- **SO 402 - Přeložka kabelu O2** - v místě stávajícího spojkoviště u jihovýchodní větve okružní křižovatky bude stávající vedení O2 (celkem 9 kabelů ve stejné trase) přerušeno. Přeložka bude vedena pod chodníkem severozápadním směrem v délce 11,0 m, poté bude vedena pod jízdním pruhem okružní křižovatky severně od dlážděného prstence (pod kterým částečně prochází). Poslední úsek přeložky je veden pod chodníkem západním směrem v délce 9,5 m. Severozápadní konec přeložky bude v místě navrženého přechodu pro chodce. Křížení silnice II/422 bude provedeno protlakem uložením dvou chráničků 2 x PVC chránička DN 160 dl. 27,0 m. Přeložka má celkovou délku nově položených kabelů 9 x 47,5 m.
- **SO 701 - Zděný plot** - stávající zděný plot na pozemku p. č. 847/1 bude odstraněn. Nové zděné oplocení bude lemovat nový chodník v severní části křižovatky, délka oplocení bude 30,0 m a výška oplocení bude 2,0 m. Na betonovém základu bude provedena podezdívka a postaveny zděné sloupky 0,5 x 0,5 m. Výplň mezi sloupky bude tvořit kovové plotové pole se svislou výplní.
- **SO 801 - Zatrávněné plochy** - nepodléhají povolení ze strany stavebního úřadu

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- Stavbou budou dotčeny výše uvedené stavební pozemky.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic sousedních pozemků a staveb.
2. O vytyčení podzemních vedení a inženýrských sítí a následně o kontrolu před záhozem požádá stavebník jednotlivé správce sítí v termínech určených v jejich vyjádření. S vytyčenými trasami budou prokazatelně seznámeni pracovníci provádějící stavební práce.
3. V ochranném pásmu plynovodu nebude používáno pneumatické, motorové, elektrické a bateriové nářadí, výkopové práce budou prováděny ručně.
4. Započetí činnosti je stavebník povinen elektronicky nebo telefonicky oznámit provozovateli sítě - společnosti O2.
5. Stavebník je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami.

6. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník povinen zabezpečit proti prověšení, poškození nebo odcizení.
7. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v PD a skutečností je stavebník povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit provozovateli sítě a v přerušovaných pracích pokračovat po obdržení souhlasu provozovatele k pokračování v přerušovaných pracích.
8. Stavebník není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti O2.
9. Stavebník není oprávněn přejíždět trasu PVSEK mimo vozovku vozidly ani stavební mechanizací do doby řádného zabezpečení PVSEK proti mechanickému poškození. Způsob zabezpečení bude projednán s provozovatelem sítě - společností O2.
10. Na trase PVSEK nebudou vysazovány jakékoliv trvalé porosty, nebude měněna niveleta terénu a měněn rozsah zpevněných konstrukcí.
11. Stavebník není oprávněn manipulovat s případně odkrytými prvky SEL.
12. Každé poškození nebo krádež SEK bude oznámeno nejpozději do 24 hodin od zjištění na poruchovou službu společnosti O2.
13. Pracovníci, kteří budou provádět zemní práce na staveništi, budou upozorněni, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Budou upozorněni také na možnou odchylku ± 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále budou upozorněni, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádné mechanizační prostředky nebo nevhodné nářadí a aby při provádění prací dbali nejvyšší opatrnosti. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK bude postupováno tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté vedení bude zabezpečeno proti poškození, odcizení a prověšení. Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, bude vyzván pracovník provozovatele sítě ke kontrole vedení před zakrytím. Teprve potom bude proveden zához. Každé zjištěné nebo způsobené poškození nebo odcizení SEK bude neprodleně oznámeno Poruchové službě O2 Czech Republic, a.s.
14. Uvedené podmínky platí i pro stavebníkem pověřenou třetí osobu.
15. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození el. zařízení. Při křížení nebo souběhu el. zařízení s přípojkami inženýrských sítí bude postupováno v souladu s ČSN 73 6005. Před zahájením prací bude kabelové vedení na základě objednávky vytýčeno v terénu pracovníkem E.ON ČR, s.r.o. Brno. Investor prokazatelně seznámí pracovníky dodavatele provádějících zemní práce s obsahem vyjádření E.ON ČR, s.r.o. Brno a s vytýčenou trasou kabelového vedení. Vytýčení E.ON ČR, s.r.o. nepožaduje v případě, že na kabelové trase budou provedeny sondy ručním odkopáním až na kabelové krytí a tím bude známa její přesná poloha. Investor nebo dodavatel stavby osobně oznámí na E.ON ČR, s.r.o. technikovi údržby sítě termín zahájení výkopových prací s cca 10 denním předstihem a dohodne s ním způsob dohlídek a kontrol nepoškozeného stavu kabelového vedení a správného uložení, event. vypnutí kabelů. Zpětné zapravení bude provedeno dle ČSN 33 2000-5-52.
16. Výkopové práce lze provádět v min. vzdálenosti 1 m od sloupů tak, aby nedošlo k narušení jejich stability a uzemňovací soustavy nebo nebyl jinak ohrožen provoz el. zařízení a bezpečnost osob. Budou dodržena platná ustanovení ČSN En 50 110-1 a ČSN 333301. Jakékoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování E.ON ČR je nutno ohlásit provozovateli.
17. Zemní práce v ochranném pásmu kabelů budou prováděny výhradně klasickým ručním nářadím, bez použití jakýchkoliv mechanismů. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu, aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou, a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno dle pokynů pracovníka E.ON ČR. Zástupce E.ON ČR bude pozván ke kontrole křížení a souběhů před záhozem. Jakékoliv poškození distribučního zařízení bude neprodleně oznámeno provozovateli. Vytýčení trasy kabelu NN v terénu bude objednáno nejméně 14 dní před zahájením prací v blízkosti kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor povinen

provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců E.ON ČR. Vytýčení kabelů zajistí pověřený pracovník.

18. V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky § 46 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP je zakázáno provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení, nebo mohly ohrozit život, zdraví či majetek osob, je zakázáno provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením. Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou sítě NN a VN, která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN. Veškeré výkopové práce budou prováděny ručně.
19. Po dokončení stavby požádá stavebník stavební úřad podle § 122 stavebního zákona o vydání kolaudačního souhlasu, stavba může být užívána až na základě kolaudačního souhlasu (SO 401 – Veřejné osvětlení a SO 402 – Přeložka kabelu O2).
20. Budou dodrženy povinnosti původců odpadů stanovené v ustanovení § 16 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Odpady budou odstraňovány nebo využívány pouze na zařízeních k tomu určených.
21. Před vydáním stavebního povolení je nutné dorešit smlouvu o budoucí smlouvě darovací mezi investorem stavby – Obcí Lednice a vlastníkem silnice II/422.
22. Před zahájením zemních prací ohlásí stavebník termín jejich zahájení Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno a umožní provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) s přihlédnutím k § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona:

Obec Lednice, Zámecké náměstí 70, 691 44 Lednice

Odůvodnění:

Dne 17.04.2014 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel opatřením ze dne 28.04.2014 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 02.06.2014.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 15.07.2014, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Umístění stavby je v souladu s územním plánem obce Lednice schváleným dne 15.02.1996, č.j. 1/96, včetně následných změn č. 01 – 03. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Stanoviska sdělili:

- Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Územní odbor Břeclav stanovisko dne 14.06.2011 č.j. HSBM-4-81-7/4-OPR-2011
- Městský úřad Břeclav, odbor školství, kultury, mládeže a sportu stanovisko dne 23.02.2012 č.j. MUBR 12278/2012-411/HA
- Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí vyjádření dne 16.06.2011 č.j. JMK-74305/2011

- Městský úřad Břeclav, odbor životního prostředí vyjádření dne 01.06.2011 č.j. MUBR 36860/2011
- Městský úřad Břeclav, odbor správních věcí a dopravy stanovisko dne 26.05.2011 č.j. MUBR 36705/2011
- Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje vyjádření dne 02.06.2014
- E.ON Servisní, s. r. o. České Budějovice vyjádření dne 16.05.2014 zn. E7456-16011325
- E.ON ČR, s. r. o. České Budějovice souhlas dne 23.05.2014 zn. M4992-16012423, dne 15.01.2013 zn. M18522-Z061301475
- Policie ČR – DI Břeclav vyjádření dne 03.06.2011 č.j. KRPB-59015-2/ČJ-2011-060406-KAM
- VaK Břeclav, a.s. dne 08.07.2011 zn. 2376/11-Ja
- Telefónica Czech Republic, a. s. Praha vyjádření dne 31.10.2013 č.j. 689597/13
- JMP a.s. Brno stanovisko dne 09.01.2013 zn. 5000731464

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu s přihlédnutím k § 85 odst. 1 písm. b), § 85 odst. 2 stavebního zákona:

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště Brno, Jihomoravský kraj, Ing. Lenka Olivová, Miroslava Jakubáčová, Jaroslav Wunsch, Bohuslav Puchala, Alena Puchalová, Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Oblast Břeclav, Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., RWE GasNet, s.r.o., E.ON Distribuce, a.s., O2 Czech Republic a.s.

Okruh účastníků byl stanoven z:

žadatele: Obec Lednice

obce, na jejímž území se má záměr uskutečnit: Obec Lednice

vlastníků pozemků nebo staveb, na kterých má být záměr uskutečněn: Obec Lednice, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Jihomoravský kraj (SÚS Jm kraje)

osob, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být přímo dotčeno: Ing. Lenka Olivová, Miroslava Jakubáčová, Jaroslav Wunsch, Bohuslav Puchala, Alena Puchalová, Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s., RWE GasNet, s. r. o., E.ON Distribuce, a. s., O2 Czech Republic, a.s.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Rozhodnutí je vykonatelné nabytím právní moci stavebního povolení vydaného speciálním stavebním úřadem.

Ing. Milena Osičková, MPA v. r.
vedoucí odboru stavebního řádu
a obecního živnostenského úřadu

otisk úředního razítka

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši 20000 Kč byl zaplacen dne 17.07.2014 bankovním převodem.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Víadesigne s.r.o., IDDS: zrkaeex

sídlo: Na zahradách č.p. 1151/16, 690 02 Břeclav 2

zastoupení pro: Obec Lednice, Zámecké náměstí 70, 691 44 Lednice

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště Brno, IDDS: 96vaa2e

sídlo: Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 28

Jihomoravský kraj, IDDS: x2pbqzq

sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veverí, 602 00 Brno 2

Ing. Lenka Olívová, Čechova č.p. 238, 691 44 Lednice na Moravě

Miroslava Jakubáčová, Mikulovská č.p. 105, 691 44 Lednice na Moravě

Jaroslav Wunsch, Mikulovská č.p. 105, 691 44 Lednice na Moravě

Bohuslav Puchala, Mikulovská č.p. 273, 691 44 Lednice na Moravě

Alena Puchalová, Mikulovská č.p. 273, 691 44 Lednice na Moravě

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Oblast Břeclav,

IDDS: k3nk8e7

sídlo: Žerotínovo nám. č.p. 3/5, 601 82 Brno

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., IDDS: gnugxza
sídlo: Čechova č.p. 1300/23, 690 02 Břeclav 2

RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynářská č.p. 499/1, Zábrdovice, 657 02 Brno 2

zastoupení pro: RWE GasNet, s.r.o., Klášská 940/96, 401 17 Ústí nad Labem

E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz

sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1

zastoupení pro: E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České

Budějovice

O2 Czech Republic a.s., IDDS: d79ch2h

sídlo: Za Brumlovkou č.p. 266/2, 140 00 Praha 4-Michle

dotčené orgány

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Územní odbor Břeclav, IDDS: ybiaiuv

sídlo: Zubalého č.p. 685/1, Zábrdovice, 614 00 Brno 14

Městský úřad Břeclav, odbor školství, kultury, mládeže a sportu, nám. T. G. Masaryka č.p. 42/3,
690 81 Břeclav

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí č.p. 3/5, 601
82 Brno

Městský úřad Břeclav, odbor životního prostředí, nám. T. G. Masaryka č.p. 42/3, 690 81

Břeclav

Městský úřad Břeclav, odbor správních věcí a dopravy, nám. T. G. Masaryka č.p. 42/3, 690 81
Břeclav

Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem **604012_001328**, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 7 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 214516813 byla systémem přenesena dne 24.07.2014 v 08:52:57. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 05.08.2014 v 09:56:06. Datová zpráva byla opatřena zaručenou elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Údaje o zaručené elektronické značce: číslo kvalifikovaného systémového certifikátu **17 48 1F**, certifikát byl vydán **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro **Informační systém datových schránek - produkční prostředí Ministerstvo vnitra ČR-kancelář vrchního ředitele sekce pro informatiku a eGovernment [IČ 00007064]**. Elektronická značka byla označena časovým razítkem. Datum a čas **25.07.2014 07:56:17**, číslo kvalifikovaného časového razítka **16 DA A9**, časové razítko bylo vydáno **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**.

Odesílající datová schránka:

Název: Město Břeclav

Adresa: náměstí T. G. Masaryka 42/3, 69002 Břeclav, CZ

ID datové schránky: fesbhyp

Typ uživatele: Nejištěno

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 05.08.2014 v 09:56:29. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 05.08.2014 08:33:54. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **18 99 46**, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu (označující osobu) **Ing. Milena Osičková, úředník, Městský úřad, 912, Město Břeclav [IČ 00283061]**. Elektronický podpis byl označen platným časovým razítkem, založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Platnost časového razítka byla ověřena dne 05.08.2014 v 09:56:29. Údaje o časovém razítku: datum a čas **23.07.2014 13:31:24**, číslo kvalifikovaného časového razítka **16 DA 9D**, kvalifikované časové razítko bylo vydáno akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**.

Vystavil: Česká pošta


Pracoviště: Břeclav 2

Břetislavova 1945/1, Břeclav, 69002 dne 05.08.2014

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Kateřina Paulíková


Otisk úředního razítka:



63276612-105105-140805095547

Poznámka:

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.

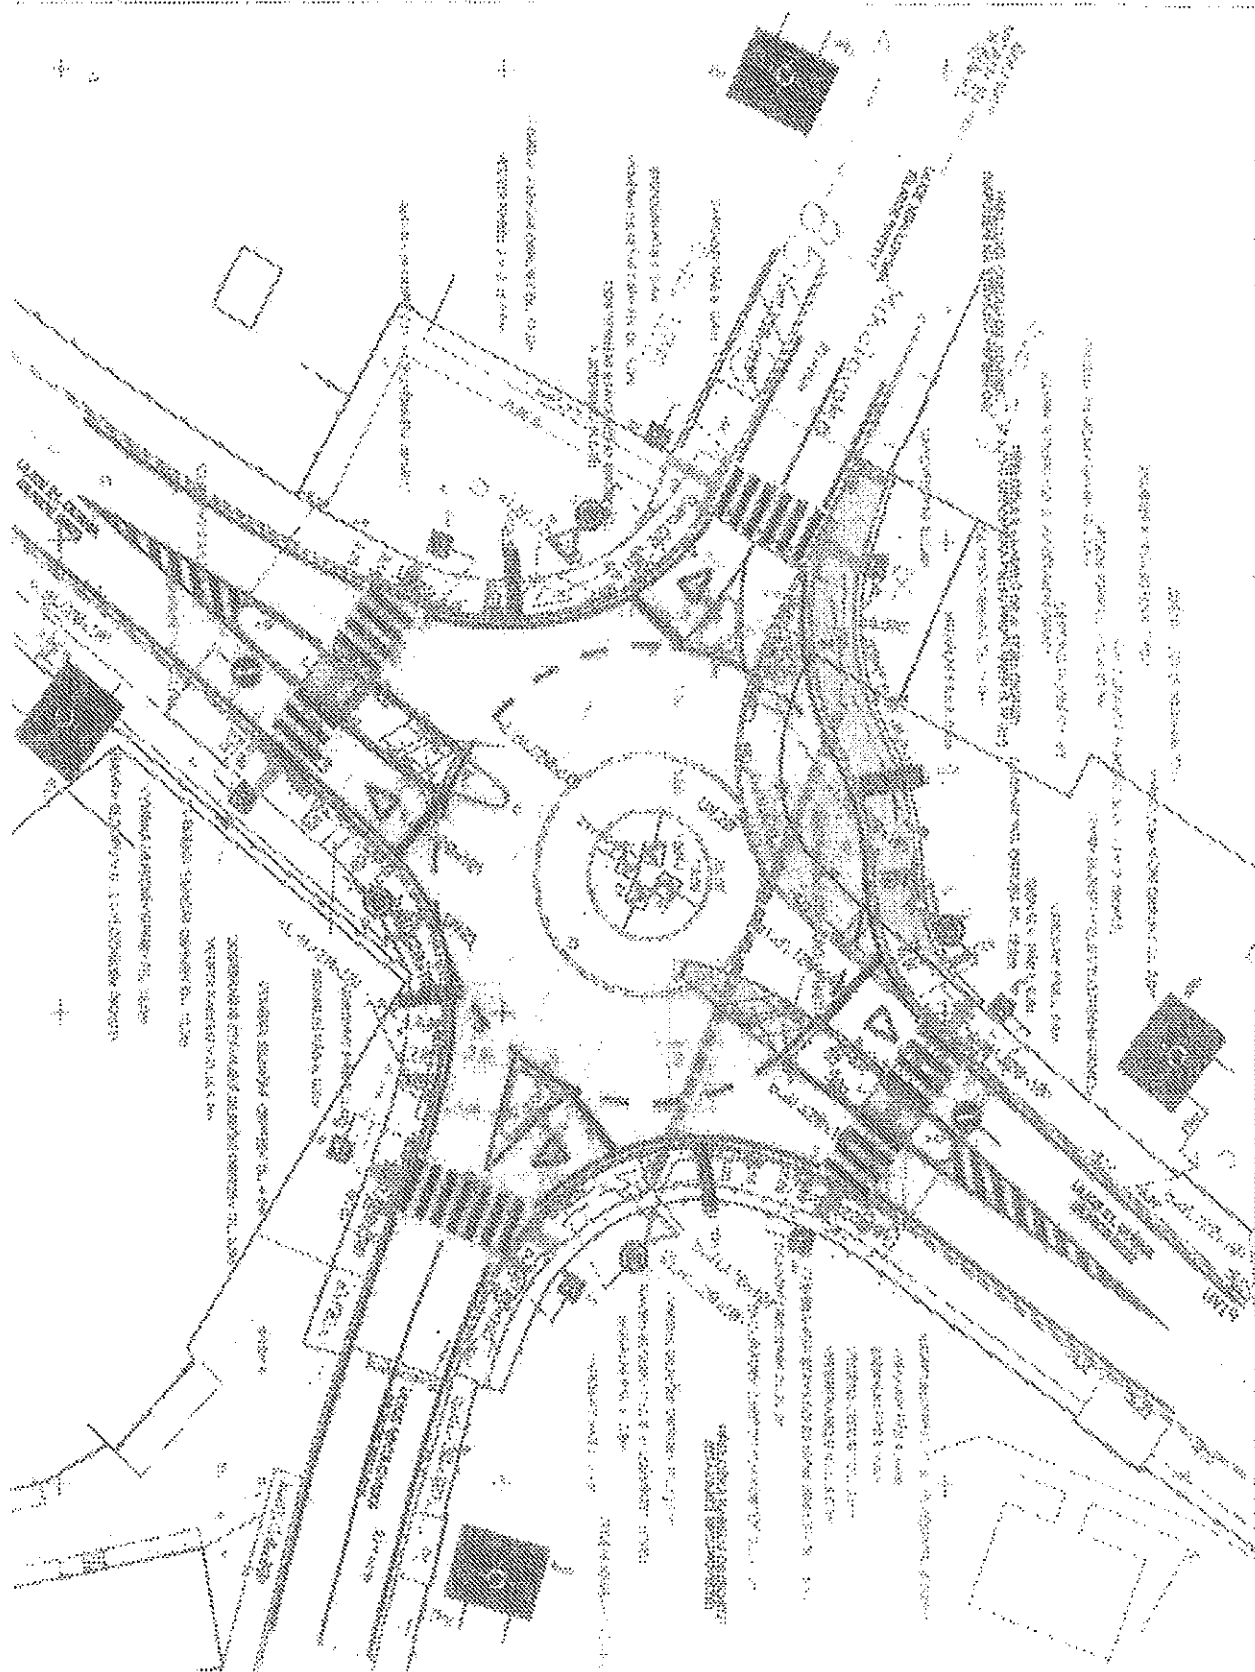

Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem **604012_001327**, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 1 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 214516813 byla systémem přenesena dne 24.07.2014 v 08:52:57. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 05.08.2014 v 09:52:48. Datová zpráva byla opatřena zaručenou elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Údaje o zaručené elektronické značce: číslo kvalifikovaného systémového certifikátu 17 48 1F, certifikát byl vydán PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983] pro Informační systém datových schránek - produkční prostředí Ministerstvo vnitra ČR-kancelář vrchního ředitele sekce pro informatiku a eGovernment [IČ 00007064]. Elektronická značka byla označena časovým razítkem. Datum a čas 25.07.2014 07:56:17, číslo kvalifikovaného časového razítka 16 DA A9, časové razítko bylo vydáno PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983].

Odesílající datová schránka:

Název: Město Břeclav

Adresa: náměstí T. G. Masaryka 42/3, 69002 Břeclav, CZ

ID datové schránky: fesbhyp

Typ uživatele: Nezjištěno

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě nebyl podepsán.

Vystavil: Česká pošta

Pracoviště: Břeclav 2

Břetislavova 1945/1, Břeclav, 69002 dne 05.08.2014

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Kateřina Paulíková

Otisk úředního razítka:



Poznámka:

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.
