

Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MJ/2015/00119

uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a v souladu s § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), v platném znění

Vlastník sítě elektronických komunikací :

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 – Žižkov

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 20623
Zastoupená Ing. Stanislavem Nevrtalem, supervizorem pro výstavbu sítě Morava dle pověření

Bankovní spojení: PPF banka

Číslo účtu: 2019160003/6000

(dále jen „CETIN“)

a

Investor žádající o překládku sítě elektronických komunikací :

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Se sídlem : Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy a jejích dodatků

zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO: 70932581

DIČ : CZ 70932581

Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., pobočka Brno – venkov

Číslo účtu : č.ú. 27-8601490267/0100

(dále jen „Investor“)

uzavírají tuto smlouvu :

Definice pojmů

Překládkou sítě elektronických komunikací (dále jen „SEK“) se rozumí stavba spočívající ve změně trasy vedení veřejné komunikační sítě nebo přemístění zařízení veřejné komunikační sítě.

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Společnost CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě této smlouvy.

Investor ve smyslu Vyjádření o existenci SEK a Všeobecných podmínek ochrany SEK vydaného dne 25.4.2014 pod č. 583940/14 vyvolává ve smyslu § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb. překládku dotčeného úseku SEK.

Překládka SEK dle této smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením
„VPIC SÚS Ochoz-Hostěnice most 383-005“
realizované v rámci stavby investora:
„II/383 Ochoz u Brna – Hostěnice, most 383-005“.

Čl. 2 Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je požadavek Investora na překládku SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, závazek společnosti CETIN zajistit si překládku SEK a s ní související záležitosti v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a závazek Investora, jež překládku SEK vyvolal, uhradit všechny nezbytné náklady, které společnosti CETIN v souvislosti se zajištěním překládky SEK vzniknou.

Čl. 3 Překládka SEK, podmínky překládky SEK

3.1 Překládka SEK dle této smlouvy bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickým) a na nemovitostech dle cenového a technického návrhu VPIC SÚS Ochoz-Hostěnice most 383-005, který je Přílohou č. 1 této smlouvy (dále jen „Překládka“).

3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou :

- zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby (Překládky) nebo územního souhlasu,
 - zajištění práv k užívání překládkou dotčených nemovitostí, tzn. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky nemovitostí dotčených překládkou SEK nebo vyvlastnění takového práva,
- (to vše dále jen „Předpoklady pro realizaci překládky SEK“).

3.3 Bez zajištění Předpokladů pro realizaci překládky SEK nebude Překládka realizována.

3.4 Vlastníkem přeložené SEK zůstává společnost CETIN.

3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Při realizaci Překládky jinou osobou nese společnost CETIN odpovědnost, jako by Překládku realizovala sama.

Čl. 4 Závazky spojené s překládkou SEK

4.1 V souvislosti s realizací Překládky se CETIN zavazuje

před realizací Překládky:

- uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy v souladu s § 5 zákona č. 184/2006 Sb.

po realizaci Překládky:

- zajistit dokumentaci skutečného provedení Překládky pro vlastní účely a Investorovi zajistit elektronicky ve formátu PDF toliko geodetické zaměření nové trasy překládaných vedení – zaslat kontaktní osobě Investora (viz čl. 8 – ve věcech technických)

4.2 V souvislosti s provedením překládky se Investor zavazuje

před realizací Překládky:

- předá zhotoviteli pravomocné územní, resp. stavební povolení překládky nebo jiný doklad, opravňující zhotovitele k provádění předmětných prací z hlediska správních orgánů,
- oznámit společnosti CETIN nejpozději do 60 dnů před realizací Překládky stavební připravenost překládky zaměstnanci určenému pro dohled investiční zakázky – viz. kontakt čl. 8 ve věcech technických.

4.3 CETIN se zavazuje, že zajistí realizaci Překládky a to tak, že k realizaci Překládky dojde **do 3 měsíců od doručení písemné výzvy Investora** dle předchozího odstavce a to za předpokladu, že nejpozději 2 měsíce před tímto datem budou zajištěny ve prospěch společnosti CETIN všechny Předpoklady pro realizaci překládky SEK uvedené v Čl. 3 bodu 3.2 této smlouvy a ze strany Investora splněny povinnosti uvedené a v Čl. 4. bodu 4.2 této smlouvy vyjma ustanovení o stavební připravenosti, jinak nejpozději do 2 měsíců od jejich zajištění ve prospěch CETIN.

4.4 Investor bere na vědomí, že mezi společnostmi CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 zákona č. 127/2005 Sb. k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti event. zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení takových služebností, které společnost CETIN vlastníkům dotčených nemovitostí uhradí, bude Investor s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb. povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou, stejně tak v případě nákladů společnosti CETIN za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do Katastru nemovitostí event. případně nákladů vzniklých společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.

4.5 Investor se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smlouvy o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.

4.6 Sjednaná lhůta realizace Překládky dle Čl. 4 bodu 4.3 této smlouvy se prodlužuje o tolik dnů, o kolik dnů byly práce k jejímu provedení přerušeny nebo nemohly být případně zahájeny z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN.

4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Investorovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy nebo adresu elektronické pošty uvedenou v Čl. 8 této smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky.

Čl. 5 Náklady spojené s překládkou SEK

5.1 Investor je na základě zákona č. 127/2005 Sb. § 104 odst. 17 povinen nést náklady překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které mu v souvislosti s překládkou SEK vzniknou, a které by mu nevznikly, kdyby k překládce nedošlo.

5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě cenového a technického návrhu ke dni uzavření této smlouvy činí **65.980-Kč**. Překládka na základě zákona č. 127/2005 Sb. je mimo předmět daně z přidané hodnoty.

5.3 Specifikace těchto nákladů je uvedena v Příloze č. 2 této smlouvy.

5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společností CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v Čl. 5 bod 5.2 této smlouvy, Investor se zavazuje je společnosti CETIN uhradit. Tyto náklady budou předem oznámeny investorovi.

Může se jednat například o:

- náklady na náhrady za omezení vlastnického práva zřízením služebnosti vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti, případně dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím (blíže specifikovány v Čl. 4 bodu 4.4. této smlouvy),
- náklady vzniklé v souvislosti s vyvlastňovacím řízením dle předchozího odstavce a dle čl. 4 bodu 4.4 této smlouvy,
- náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (vážnouce na nemovitostech dotčených původní, překládanou, trasou SEK) z Katastru nemovitostí,
- náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
- hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
- náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- náklady na identifikaci parcel,
- náklady na správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění, které vzniknou zhotoviteli v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí - povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
- náklady, související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací předmětného díla podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění,
- náklady, související se zvláštním užíváním komunikace ve smyslu § 25 zákona č. 13/1997 Sb.,
- náklady na peněžitě plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
- náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
- náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
- náklady, související se záchranným archeologickým dohledem.

Čl. 6

Platební podmínky

6.1 Náklady na Překládku ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle Čl. 5 bod 5.2 této smlouvy je Investor povinen uhradit na základě faktury po realizaci Překládky do 30 dnů ode dne jejího vystavení.

6.2 Faktura dle Čl. 6 bod 6.1 bude vystavena do 15 dnů od ukončení realizace Překládky ve smyslu čl. 4 bod. 4.7 této smlouvy a Investor je povinen uhradit ji ve lhůtě splatnosti.

Současně bude k faktuře přiloženo konečné vyúčtování Překládky dle skutečnosti. Faktura bude zaslána na elektronickou adresu: faktury@susjmk.cz.

6.3 Faktura bude Investorovi zasílána na adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy.

6.4 Náklady společnosti CETIN uvedené v Čl. 5 bod 5.4 této smlouvy budou hrazeny Investorem odděleně na základě samostatných faktur vystavených společností CETIN a Investor je povinen uhradit je ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne vystavení každé jednotlivé faktury.

6.5 Náklady dle této Smlouvy budou Investorem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce této smlouvy, pokud nebude fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak. Dnem úhrady faktury (zaplacením fakturovaných nákladů) se rozumí den připsání účtované (fakturované) částky na účet společnosti CETIN.

Čl. 7 Sankce

7.1. Strany této smlouvy si sjednávají pro případ prodlení Investora s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle této smlouvy povinen, povinnost Investora zaplatit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý den prodlení.

7.2. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru druhé straně doručena.

7.3. Povinností zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v bodu 7.1 tohoto článku, není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

7.4. Povinnost zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v bodech 7.1. až 7.3. tohoto článku, trvá i po skončení trvání této smlouvy, jakož i poté, co dojde k odstoupení od ní některou ze stran či oběma stranami.

Čl. 8 Kontaktní osoby

a) Za investora:

ve věcech smluvních: Ing. Jan Zouhar funkce: ředitel SÚS JmK, p.o.k.

e-mail: jan.zouhar@susjmk.cz tel. 547120300

ve věcech technických: Ing. Břetislav Mutl, funkce: vedoucí TSÚ oblasti Brno

e-mail: breislav.mutl@susjmk.cz tel. 547 120 420

b) Za CETIN :

ve věcech smluvních Ing. Stanislav Nevrtal funkce :supervizor pro výstavbu sítě Morava

e-mail stanislav.nevrtal@cetin.cz tel. 541132710 fax.

ve věcech technických Ing. Radek Novák funkce :senior specialista pro výstavbu sítě

e-mail radek.novak@cetin.cz

tel. 724 124 045

Čl. 9 Rozvazovací podmínka

9.1. Realizace Překládky musí být zahájena nejpozději do dvou let od uzavření této smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou této smlouvy ve smyslu ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku, v platném znění.

9.2. Tato smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou let od uzavření této smlouvy, aniž by realizace Překládky byla zahájena. Zánikem smlouvy touto rozvazovací podmínkou není dotčeno právo společnosti CETIN na zaplacení smluvní pokuty dle čl. 7 bodů 7.1. až 7.4. této smlouvy, a tomu odpovídající povinnost Investora tuto pokutu zaplatit. Právo na náhradu škody zůstává zachováno. V případě, že dojde k zániku smlouvy touto rozvazovací podmínkou je Investor povinen uhradit společnosti CETIN náklady již vzniklé v souvislosti s plněním z této smlouvy.

Čl. 10 Závěrečná ustanovení

10.1. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou.

10.2. Vztahy, které nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

10.3. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé strany.

10.4. Započtení na pohledávky vzniklé z této smlouvy se nepřipouští.

10.5. Tato smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

10.6. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami bude zasílána doporučeně na adresy uvedené v hlavičce této smlouvy nebo na adresy elektronické pošty uvedené v čl. 8 této smlouvy, ustanovení § 573 občanského zákoníku se neuplatní.

10.7. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byly jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

10.8. Strany vylučují aplikaci ustanovení § 1805 odst. 2 občanského zákoníku na tuto smlouvu,

10.9. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný

po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

10.10. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

10.11. Žádný závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.

10.12. CETIN souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a všech faktur vystavených k úhradě ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele investora.

10.13. Dále CETIN souhlasí s poskytováním údajů v této smlouvě obsažených, nebo i celé smlouvy, případně dalších údajů týkajících se závazku, touto smlouvou založeného v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v pozdějším znění.

10.14. Smluvní strany potvrzují, že uzavření této smlouvy je výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah této smlouvy

10.15. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

Přílohy :

1. Cenový a technický návrh překládky
2. Specifikace nákladů

V Brně dne 19 -04- 2016

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.:
Ing. Stanislav Nevrtal
supervizor pro výstavbu přístupové sítě

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Přílanská 206/170
602 00 Praha 2
DIČ CZ04034053
231

21-04-2016
V Brně dne

Investor :
Ing. Jan Zouhar
ředitel SÚS JMK

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínova náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO 709 32 581 (2)P*

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Startovací dokumentace

INVESTIČNÍ AKCE

Kategorie

Podkategorie

Číslo SAP

Číslo interní 45038/16/0008

Název

VPIC SÚS Ochoz-Hostěnice most 383-005

Budoucí uživatel

NO-BO Jižní Morava
Manažer/KPO

Zpracoval

Vedoucí
Manažer

Michal Novotný
Michal Neumann
Michal Neumann

Schváleno

Obsah:**1 Souhrnná zpráva**

- 1.1 Základní údaje
- 1.2 Účel stavby

2 Technická zpráva

- 2.1 Vstupní podklady
- 2.2 Navrhované řešení
- 2.3 Popis tras
- 2.4 Použitá technologie
- 2.5 Použité předpisy
- 2.6 Koordinace
- 2.7 Ostatní

1. Souhrnná zpráva

1.1 Základní údaje

Identifikační údaje

Název:	VPIC SÚS Ochoz-Hostěnice most 383-005
Kategorie:	
Podkategorie:	
Typ investice:	Vynucená překládka s inženýringem CAPEX
Důvod 1:	
Číslo interní:	45038/16/0008
Prvek SPP:	
ABC:	C
HOST:	
ATÚ:	VÚJ Ochoz u Brna-RSU

Kapacitní údaje

		Průměrný náklad na:	
100800_Délka HDPE trubek pro OK	0 km	kmp mk	468.254 tis. Kč
100200_Délka metalických kabelů	0.021 km	kmk mk	2809.524 tis. Kč
100700_Délka nadzemní tratě	0 km	km vyk	3105.263 tis. Kč
100100_Délka párů v metalických kabelech	0.126 km	km kv	0 tis. Kč
100300_Délka výkopů vč.podvrtů a přechodů	0.019 km	kmo kv	0 tis. Kč
Páry vyvedené na hlavní rozvaděč ústř.	0 pár	b.j.	0 tis. Kč
100400_Páry zakončené v účast. rozvaděčích	0 pár		
100900_Počet bytových domů	0 BD		
101100_Počet bytových jednotek v bytových domech	0 bj		
100500_Počet rodinných domů	0 RD		
100600_Počet bytových jednotek v rodinných domech	0 bj		
Délka HDPE trubek pro OK	0 km		

Požadavky:

Název polygonu: VPIC SÚS Ochoz-Hostěnice most 383-005

K akci nejsou evidovány žádné požadavky

Termíny:

Platnost ÚR od:	
Platnost ÚR do:	
Plánované zahájení přípravy:	19.02.2016
Plánované ukončení přípravy:	15.04.2016
Plánované zahájení realizace:	15.07.2016
Plánované ukončení realizace:	15.10.2016
Nabídka k přejímce (Plán):	15.09.2016

1.2 Účel stavby:

Navržené technické řešení je v souladu s TM000072

2 Technická zpráva

2.1 Vstupní podklady:

Požadavek IPMS int.č. 45038/16/0008 na zpracování CaTN: VPIC SÚS Ochoz-Hostěnice most 383-005

2.2 Navrhované řešení:

Z důvodu rekonstrukce mostu ev.č. 383-005 na silnici č. II/383 Ochoz u Brna _ Hostěnice, dojde k přeložení stávající SEK spol. CETIN (kabel PFLE 1XN0,4). Tento kabel napájí UR OCHO427. Na začátku a konci kabelové přeložky bude kabel přerušen a pomocí kabelových spojek XAGA500 43/8-150 se naspojuje na nový prvek SEK spol. CETIN (tendrovaný kabel PFLE 3XN 0,4). Kabel bude veden mírně zešíkma přes komunikaci II/383. Kabelové spojky budou umístěny v nepojízdných a nebezpečných plochách. V nové trase bude kabel veden v ochranné trubce PE 110mm s připolozí rezervní chráničky PE 110mm. Chráničky budou vyvedeny za pojezdové a zpevněné plochy. Kabelové spojky a konce chrániček budou opatřeny detekčními markery MiniBall.

2.3 Popis tras

Z důvodu původně navrženého ohybu kabelu pod vedlejší nebezpečnou komunikací, došlo po dohodě s investorem a pracovníkem ochrany sítě spol. CETIN ke změně překládané trasy _ viz. přiložené podklady.

VVN: ne

El. trakce: ne

Vodní toky: ne

2.4 Použitá technologie:

Kabel typu TCEPKPFLE 0,4

Kabelová spojka XAGA

Mini Markér Ball

PE110mm

2.5 Použité předpisy:

TPP 2001-1 (TP 69a) - Výstavba přístupových sítí -

Metalické kabely (část I.)

TPP 2001-2 (TP 69b) - Výstavba přístupových sítí -

Metalické kabely (část II.)

TPP 2001-3 (TP 69c) - Výstavba přístupových sítí -

Metalické kabely (část III.)

TA 10 (I.-III.) - Výstavba nadzemních sítí

ČSN 736005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 334050 - Podzemní sdělovací vedení

ČSN 341100 - Křižovatky a souběhy vedení

Výkop, položení a obsazení chráničky je v souladu s ČSN 73 6005

2.6 Koordinace:

Ing. Milan Pacák, MT: 739 383 851 za investora, žadatel překládky

2.7 Ostatní:

PD: NE

ÚR: NE - stavebník zajistí SP


VBŘ: ANO

GEO: ANO

SoUZ: NE


PEW: NE (v době zpracování CaTN nebyly na překládaném vedení žádné aktivní služby)

RZ je povinný oznámit zahájení výkopových prací a pozvat ke kontrole před záhozem výkopů PC a PTD.

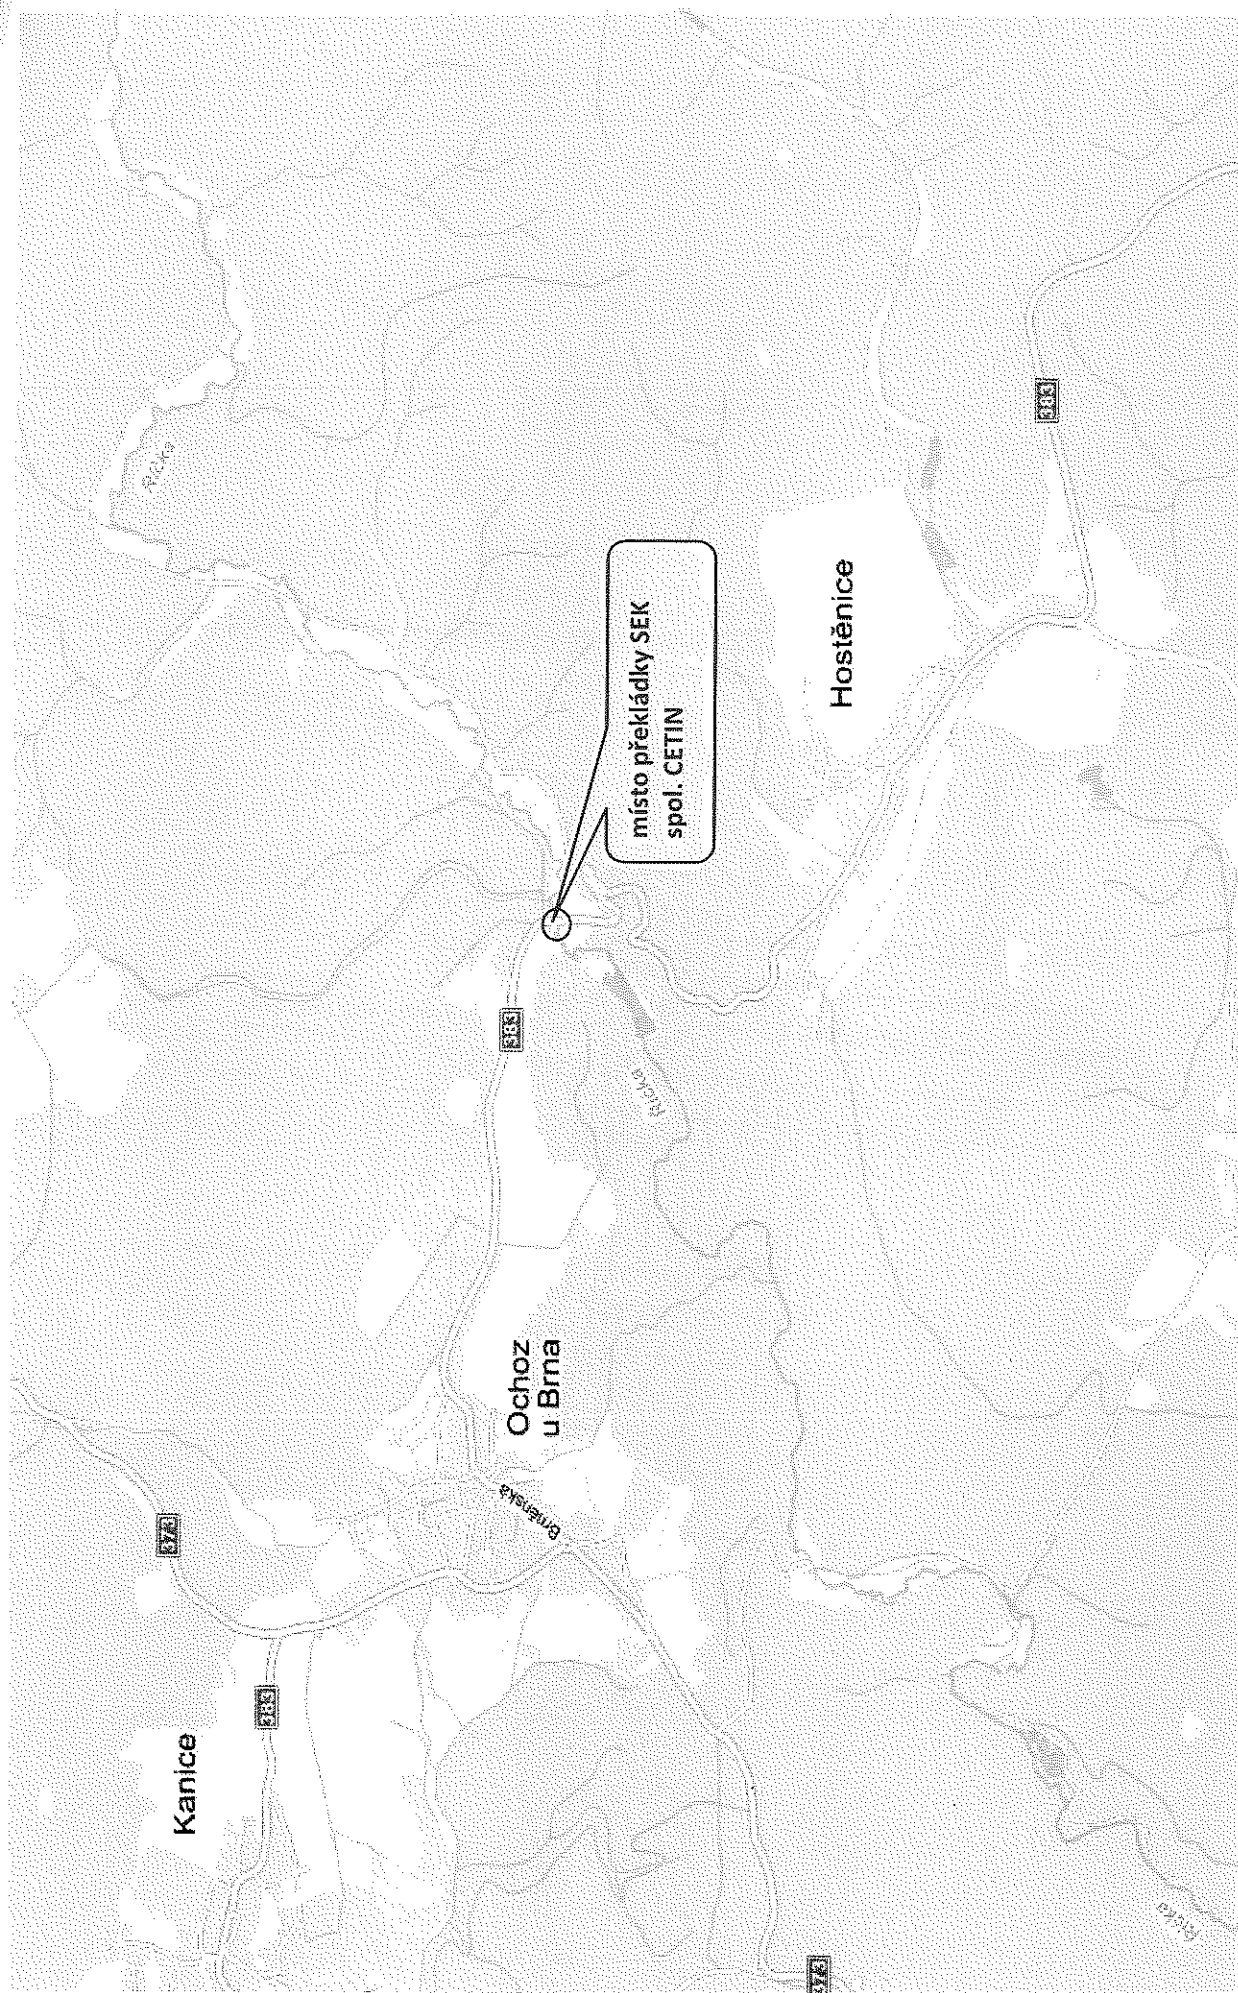


45038/16/0008 VPIC SÚS Ochoz-Hostěnice most 383-005

78 HDPE(645 011 02)
48 001997

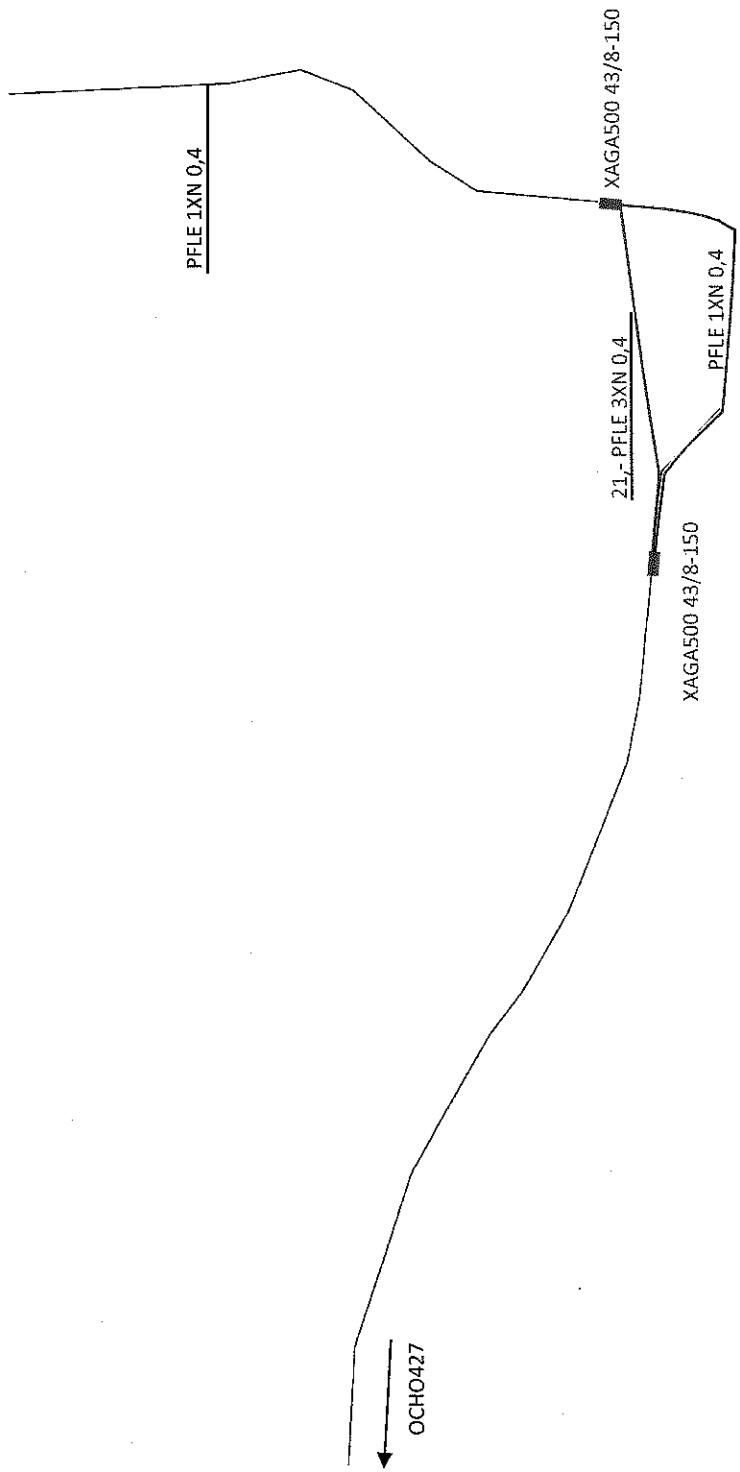

45038/16/0008 VPIC SÚS Ochoz-Hostěnice most 383-005

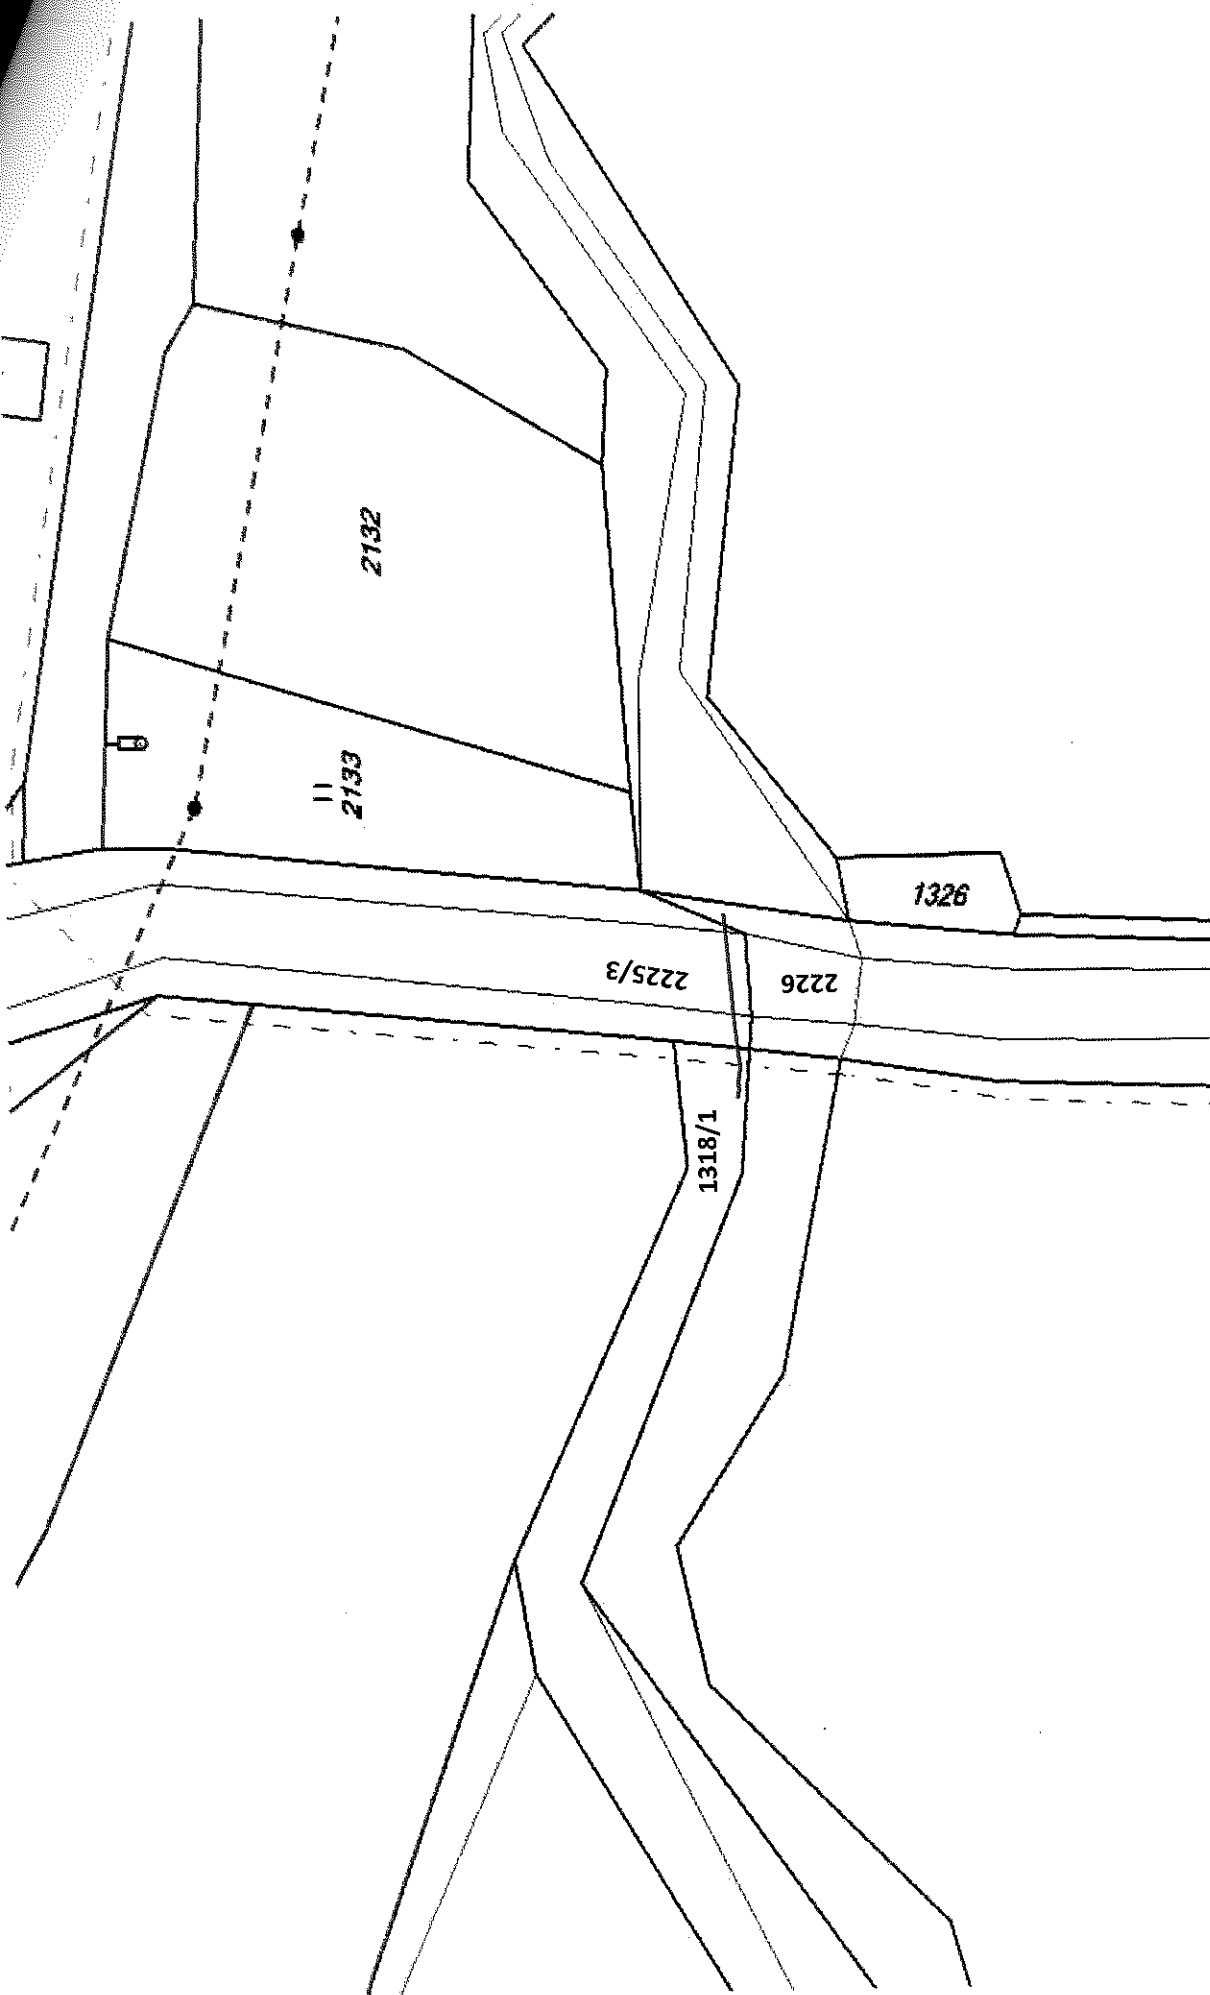

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP - Morava - VEG - STAND. - 2016.03

Položková 2016.03

databáze:

Název stavby: VPIC SÚS Ochoz-Hostěnice most 383-005

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD: Vegacom a.s., Michal Novotný

KPO: JMO

HOST: Brno - Zábrdovice

VUJ: Ochoz u Brna

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAV	4 887,83 Kč
A	
ZEMNÍ PRÁCE	13 104,20 Kč
MONTÁŽ	18 852,35 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	11 158,67 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	1 851,45 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	10 803,14 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	5 322,58 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč
Y	

Celkové náklady: 65 980,22 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 48 437,80 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 17 542,42 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAV				
A				
958210		Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	4 887,83 Kč
ZEMNÍ PRÁCE				
954970	S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	32.00 m	474,24 Kč
954948	S	Průvrt zdívkou betonovým tl. od 300 do 600 mm	1.00 ks	246,86 Kč
955577	S	Rýha v chodníku 35/50-70	8.00 m	3 452,16 Kč
952345	S	Rýha v trávě 35/70-100	4.00 m	1 105,96 Kč
955570	S	Rýha ve vozovce litý asfalt 50/100	7.00 m	7 538,51 Kč
955054	S	Vytyčení trasy podél silnice, železnice	19.00 m	187,72 Kč
951349	S	Zřízení a odstr. přech. lávky z ocel. desky	1.00 ks	98,75 Kč
MONTÁŽ				
952649	S	Měření stejnosměrné během stavby - první čtyřka	2.00 ks	256,74 Kč
952643	S	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	1.00 ks	69,13 Kč

952647	S	Měření útlumu během stavby- první čtyřka	1.00 ks	128,37 K
955000	S	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	2.00 ks	49,38 Kč
955268	S	Montáž podzemní tratě síťové metalické	1.00 ks	12 400,00 Kč
rozpočtová min. rezerva				
955281	S	Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek	2.00 ks	1 876,14 Kč
954990	S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	21.00 m	352,59 Kč
957753	S	Realizace tratě síťové dohodou	1.00 ks	3 720,00 Kč
náklady na kolaudaci				
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE				
955198	S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	1.00 ks	2 579,69 Kč
955278	S	Provedení geodetického měření pro tratě síťové	1.00 ks	3 888,64 Kč
geo vytyčení hranic pozemků				
956284	S	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	1.00 ks	4 690,34 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA				
955313		Uzavření sml. o SB o VBŘ	1.00 ks	1 851,45 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE				
954830		Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene	1.00 ks	7 020,00 Kč
náhrada za VBŘ - odhadovaná				
Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí.				
955315		Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	1.00 ks	2 110,66 Kč
958085		Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	1.00 ks	1 672,48 Kč
Limitka materiálu				
Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303918	S	Deska krycí plast. 300x1000 mm	12.00 ks	449,16 Kč
303795	S	Fólie výstražná 220mm PE oranžová	14.00 m	51,94 Kč
303813	S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	12.00 m	51,12 Kč
300000	S	Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,4	21.00 m	257,04 Kč
302550	S	Mini Marker 1401 3M Ball	2.00 ks	473,64 Kč
312425	S	Modul konektor. 9700-10P	2.00 ks	58,74 Kč
312845	S	Spojka kabelová XAGA 500 43/ 8- 150/FLE	2.00 ks	838,74 Kč
303501	S	Spojka plastová 110/94 mm	4.00 ks	134,00 Kč
302655	S	Trubka PE 110/3,5/6000mm	6.00 ks	2 967,36 Kč
303465	S	Víčko plastové trubky 110/100 mm	2.00 ks	40,84 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevkazaný				
304267	S	Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá	2.00 ks	0,00 Kč
403175	S	Pěna montážní Soudal 300ml	1.00 ks	0,00 Kč
